



***UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO***  
“per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex DPCM 10 dicembre 2010 e OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1 e s.m.i.

**RELAZIONE DI DETTAGLIO**  
**DAL 10.12.2010 AL 10.11.2013**

**Palermo, 15.11.2013**

## SOMMARIO

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>ASPETTI GENERALI ACCORDO DI PROGRAMMA.....</b>	<b>3</b>
2.1	ACCORDO DI PROGRAMMA ORIGINARIO .....	3
2.2	ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA.....	4
<b>3</b>	<b>CONVENZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE.....</b>	<b>16</b>
4.1	ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RIPARTIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE.....	16
4.2	ALBO PROFESSIONISTI.....	16
4.3	ALBO IMPRESE.....	19
4.4	Costituzione Piattaforma Informatica E-Procurement.....	22
4.5	Attività di Gara da MARZO 2011 a NOVEMBRE 2013.....	24
4.5.1	Aspetti Generali: Copertura finanziaria .....	24
4.5.2.	Delibera CIPE.....	25
4.5.4	GARE INTERVENTI LETTERA A PREVISTI NELL'ADP: .....	28
4.5.6.	GARE INTERVENTI LETTERA B .....	32
<b>5</b>	<b>STATO DELL'ARTE .....</b>	<b>37</b>
5.1	INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo) .....	37
5.2	INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo) .....	40
<b>6</b>	<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>46</b>



## 1 PREMESSA

La presente relazione illustra le attività svolte dal Commissario Straordinario Delegato, finalizzate all'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia, inseriti nell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 30 marzo 2010 (allegato 1) e del successivo atto integrativo siglato il 3 maggio 2011 (allegato 2). In particolare, le attività nel seguito descritte sono state espletate dal 10.12.2010, data di conferimento dell'incarico allo scrivente Commissario, ex D.P.C.M. del 10.12.2010 (allegato 3) successivamente integrato con D.P.C.M. del 20/07/2011 (allegato 4), al 10.11.2013.

## 2 ASPETTI GENERALI ACCORDO DI PROGRAMMA

### 2.1 ACCORDO DI PROGRAMMA ORIGINARIO

L'Accordo di Programma ed il successivo atto integrativo sono finalizzati alla programmazione, finanziamento e attuazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi nella Regione Sicilia è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, per un importo pari € **152.692.572,11**, a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera A**, e da fondi europei stanziati dalla Regione Sicilia, nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, per un importo di € **151.644.604,81**, a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera B**, per un importo complessivo pari a € **304.337.176,92**.

L'art. 8 dell'A.d.P. prevede, inoltre, la costituzione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo, organo collegiale chiamato, tra l'altro, a definire eventuali rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie accertate sugli stessi - compresi i ribassi d'asta - nonché a definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.

A tal proposito, in data 17 ottobre 2010, il suddetto Comitato, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella zona di Giampilieri (ME) e di S. Fratello (ME), ha deliberato di far transitare le risorse finanziarie, originariamente previste sui fondi regionali (elenco B), sulle risorse statali (elenco A) relativamente agli interventi ME087 Giampilieri "Opere di consolidamento località Giampilieri" di importo pari a € **24.000.000,00** e ME 107 San Fratello "Opere di consolidamento centro abitato per un importo € **18.000.000,00**.

Successivamente, a seguito dell'O.P.C.M. 3886 del 9 luglio 2010, i suddetti interventi identificati con la lettera A sono stati gestiti direttamente dal Commissario Delegato di cui all'O.P.C.M. 3815



del 10 ottobre 2009. Con la medesima O.P.C.M. il Commissario è stato nominato Soggetto Attuatore per l'attuazione degli interventi previsti in AdP avvalendosi dei poteri previsti dall'O.P.C.M. 3815/09.

## 2.2 ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

A seguito della registrazione alla Corte dei Conti dell'Accordo integrativo del 3 maggio 2011 altre risorse, a valere sui Fondi FAS, sono state destinate alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per complessivi € 21.251.185,84 di cui € 12.756.002,61 a valere sulle risorse ministeriali stanziare con Legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed € 8.495.183,23 a valere sui fondi della Regione Sicilia del Programma Operativo FESR 2007/2013, linea di intervento 2.3.1.1.

Atto integrativo all'Accordo di programma		
Interventi lettera A	€	12.756.002,61
Interventi lettera B	€	8.495.183,23
Totale	€	21.251.185,84

Le risorse complessive stanziare per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano, pertanto, ad € 325.588.362,76, ripartiti tra fondi Ministeriali e Regionali come riassunto nella tabella seguente.

Fondi Ministeriali (lettera A)		
AdP	€	152.692.572,11
AdP integrativo	€	12.756.002,61
Totale	€	165.448.574,72
Fondi Regionali (lettera B)		
AdP	€	151.644.604,81
AdP integrativo	€	8.495.183,23
Totale	€	160.139.788,04

Si rappresenta che nel transito di interventi tra le due diverse coperture finanziarie si è cercato di rispettare, per quanto possibile, gli stanziamenti del Ministero e della Regione, cosicché, a fronte di un finanziamento statale complessivo pari a € 165.448.574,72 (AdP + Atto integrativo) gli interventi identificati dalla lettera A risultano gravare per un onere complessivo pari a € 165.361.376,61, mentre gli interventi ricadenti nella lettera B risultano gravare per un importo complessivo pari a € 160.226.986,15.



### 3 CONVENZIONI

L'art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010 prevede che per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario Straordinario Delegato possa avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi e delle università, delle aziende pubbliche di servizi.

Come specificatamente previsto dal suddetto art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, potendo lo stesso Commissario avvalersi per la realizzazione degli interventi anche di società specializzate a totale capitale pubblico, in data 18 febbraio 2011 è stata sottoscritta una specifica convenzione tra il Commissario Delegato e Invitalia S.p.A.<sup>1</sup> [Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A, di seguito denominata "INVITALIA" o Agenzia], riguardante attività funzionali e/o di assistenza tecnico – amministrativa - e specialistica .

In particolare:

nell'ambito delle attività di assistenza tecnico-amministrativa, l'Agenzia garantisce la progettazione ed il supporto nelle attività di predisposizione ed affidamento delle procedure di gara (anche ricorrendo a strumenti informatici dedicati) e di progettazione, e nelle fase esecutiva dei lavori e di collaudo. L'Agenzia si impegna, inoltre, a predisporre tutta la documentazione necessaria per l'adempimento, da parte del Commissario, degli oneri informativi al medesimo spettanti nei confronti del Parlamento, del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio, della Regione Sicilia, del Comitato di gestione e di indirizzo per la gestione dell'Accordo, dell'ISPRA, del Repertorio Nazionale degli Interventi per la difesa del suolo (ReNDiS).

nell'ambito delle attività di supporto tecnico-logistico, l'Agenzia assicura tra l'altro la presenza di un Ufficio a Palermo ed uno a Roma di supporto alle attività del Commissario Delegato, mettendo a disposizione almeno 10 risorse, tra competenze di carattere senior e competenze di carattere junior. Il suddetto personale opera all'interno di uno specifico gruppo di lavoro, le cui caratteristiche esatte, nonché le modalità operative, sia tecniche che amministrative, sono previste in uno specifico Piano esecutivo annesso alla Convenzione stessa.

---

<sup>1</sup> società a totale capitale pubblico, istituita con decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 2000, n. 3, con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate del Paese, ha lo scopo di promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione e i sistemi locali d'impresa, dare supporto alle amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria, la progettualità dello sviluppo, la consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari. L'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, prevede che, con apposite convenzioni, siano disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate



Per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, Invitalia si avvale, come previsto nel citato D.lgs 1/99, della propria controllata Invitalia Attività Produttive S.p.A. (per brevità nel seguito IAP, già Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.), che è in possesso di specifiche ed adeguate competenze ed esperienze, acquisite durante la pluriennale collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e con diversi Commissari Delegati, nel settore della progettazione e gestione di interventi ambientali<sup>2</sup>.

Nel seguito viene riportata una tabella riassuntiva in cui vengono elencati gli interventi di cui IAP sta curando la progettazione:

n.	PRO V	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico	Stato
1	CT	<u>36</u>	Ramacca	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	€ 1.200.000	prot.255/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
2	EN	<u>44</u>	Gagliano Castelferrato	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga	€ 800.000	prot.252/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Intervento sospeso
3	ME	<u>49</u>	Alcara Li Fusi	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini	€ 1.200.000	prot.253/UC e 257/UC del 08.03.2011	Progettazione conclusa
4	ME	<u>81</u>	Librizzi	Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà	€ 500.000	prot. 254/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
5	PA	<u>180</u>	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi	€ 90.000	prot. n. 2711/UC del 01.12.2011	Progettazione consegnata In attesa acquisizione progetti
6	PA	<u>181</u>	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi	€ 400.000	prot. n. 2713/UC del 02.12.2011	Progettazione consegnata In attesa acquisizione progetti
7	ME	<u>71</u>	Frazzanò	Monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad elevato rischio idrogeologico (R4)	€ 300.000	prot. 10/UC del 10 gennaio 2012	Progettazione conclusa
8	ME	<u>109</u>	San Pier Niceto	Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato	€ 600.000	Progettazione: prot. 425/UC del 10 febbraio 2012	Progettazione conclusa

<sup>2</sup> Dal 1° dicembre 2011 Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. ha assunto la nuova denominazione "Invitalia Attività Produttive S.p.A.", incorporando per fusione anche la ex Invitalia Reti S.p.A.



n.	PRO V	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico	Stato
9	ME	099*	Piraino	Opere di consolidamento –San Leonardo	€ 685.305,38	prot.256/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
10	ME	099*	Piraino	Opere di San Costantino	€ 414.694,62	prot.256/UC e 257/UC del 08 marzo 2011	Progettazione conclusa
11	CT	<u>023</u>	Calatabiano	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria	€ 250.000	prot. n. 667/UC del 28 febbraio 2012	Progettazione conclusa
12	ME	<u>91</u>	Mirto	Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000	prot.294/UC del 11 marzo 2011	Progettazione conclusa
13	ME	<u>132</u>	Ucria	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – Zona via Annunziata	€ 2.500.000	prot.621/UC del 03.05.2011	Progettazione conclusa
14	SR	<u>186</u>	Porto Palo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000	prot. 533/UC del 20 febbraio 2012	Progettazione conclusa
15	SR	<u>163</u>	Pachino	Intervento in Contrada Raneddi	€ 2.000.000	prot.621/UC del 03.05.2011	In attesa acquisizione pareri
16	ME	<u>79</u>	Librizzi	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale	€ 2.150.000	prot.2514/UC del 15 novembre 2011	Progettazione conclusa
17	ME	<u>115 3</u>	Sant'Angelo di Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	€ 1.200.000	prot. 425/UC del 10 febbraio 2012	Progettazione conclusa
18	SR	<u>162</u>	Carlentini	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000	prot. n. 1343/UC del 20/04/2012	Progettazione conclusa
19	PA	<u>142</u>	Carini	Barriera paramassi zona industriale – Monte Columbrina	€ 1.000.000	Nota prot.520/UC del 18.04.2011	Progettazione conclusa




n.	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico	Stato
20	ME	<u>177 Int</u>	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000	Nota prot. n. 1336/UC del 19.04.2012	Progettazione conclusa
21	ME	<u>119</u>	Sinagra**	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò	€ 3.000.000	Nota prot.295/UC del 11.03.2011	Progettazione conclusa
22	PA	<u>143</u>	Castelbuono	opere di drenaggio e consolidamento C.da Liccia	€ 2.000.000	prot. n. 4370 del 26.10.2012	Progettazione conclusa
23	AG	<u>174</u>	Cattolica Eraclea	Crolli costone roccioso centro abitato Località Zagarella" Cod. PAI 064 1CE 001	€ 1.170.000	prot. n. 4370 del 26.10.2012	Progettazione conclusa
24	TP	190B	San Vito Lo Capo	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00	Nota del 04 giugno 2013 prot. n. 3260/UC	In fase di progettazione

Si riporta inoltre, nella tabella che segue gli interventi per i quali il Commissario ha provveduto ad affidare ad IAP incarichi differenti dalla progettazione:

n.	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico
1	CL	<u>20</u>	Serradifalco	Consolidamento centro abitato	€ 1.700.000	prot. 1829/UC del 21.09.2011: monitoraggio
2	ME	<u>92</u>	Mistretta	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta – Torrente Santa Domenica	€ 800.000	Piano di indagini: prot.1979/UC del 04 ottobre 2011 e prot. n. 2136/UC del 18 ottobre 2011

Qui di seguito, infine, gli interventi per i quali il Commissario ha provveduto a revocare l'incarico di progettazione:

PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO AdP	nota di incarico
CT	<u>21</u>	Acicatenà	Opere di Consolidamento del Centro Abitato località Vanpolieri	€ 4.500.000	prot. n. 621/UC del 03.05.2011
ME	<u>88</u>	Messina	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 3.000.000	prot.1828/UC del 21 settembre 2011





ME	<u>100</u>	Raccuja	Opere di consolidamento – Zona Centro abitato: "Progetto degli interventi di prima attuazione per la mitigazione del rischio idrogeologico"	da definire	prot. 425/UC del 10 febbraio 2012
----	------------	---------	--	-------------	-----------------------------------

Sono state, inoltre, stipulate le seguenti convenzioni con Enti pubblici:

- 1) Convenzione con il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria stipulata in data 28.10.10.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
ME	113	Santa Marina Salina	A	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro	€ 2.000.000,00
ME	124	Terme Vigliatore	B	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00
ME	130	Tusa	B	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00
TP	169	Mazara del Vallo	A	Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona Tonnarella	€ 800.000,00
TP	189	Mazara del Vallo	A	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale – I stralcio	€ 2.000.000,00

- 2) **Protocollo d'intesa** per l'accelerazione delle procedure di cui agli articoli 19 e ss. del D. Leg.vo 152/2006 e ss.mm.ii., in relazione ai progetti relativi agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia di cui all'allegato 1 dell'Accordo di Programma, stipulato con il **Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1 VIA/VAS – dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana** in data 28.10.10.

- 3) **Convenzione con il Servizio Provinciale di Palermo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 10.11.10.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
PA	136	Belmonte Mezzagno	A	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano	€ 3.000.000,00
PA	156	Termini Imerese	A	Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto	€ 800.000,00

4) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento** stipulata in data 10.11.10.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
AG	001	Agrigento	A	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	€ 2.000.000,00
AG	006	Favara	A	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis	€ 1.500.000,00

5) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Palermo** stipulata in data 11.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
PA	140	Camporeale	B	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
PA	150	Palermo	B	Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli	€ 4.300.000,00
PA	154	Polizzi Generosa	A	Opere di consolidamento – Zona via G.Borgese	€ 500.000,00

6) **Convenzione con il Servizio Provinciale di Siracusa del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 12.11.10.

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**



cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
SR	161	Avola	A	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da Cavagrande del Cassibile	€ 600.000,00

7) **Convenzione con l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa** stipulata in data 15.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

8) **Convenzione con il Comune di Valledolmo** stipulata in data 17.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, funzioni di stazione appaltante, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
PA	157	Valledolmo	A	Opere di consolidamento - C.da Renella	€ 500.000,00

9) **Convenzione con il Comune di Ficarra** stipulata in data 18.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, funzioni di stazione appaltante, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**


cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
ME	065	Ficarra	B	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Grenne	€ 1.028.981,00

10) **Convenzione Servizio Provinciale di Catania del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 18.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
CT	<u>031</u>	Misterbianco	A	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	€ 500.000,00
CT	<u>033</u>	Piedimonte Etneo	A	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa	€ 500.000,00



11) **Convenzione Servizio Provinciale di Trapani del Dipartimento Regionale della Protezione Civile** stipulata in data 18.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
TP	<u>168</u>	Erice	A	Consolidamento costone roccioso – Zona Crocifissello	€ 500.000,00
TP	<u>172</u>	San Vito Lo Capo	A	Collocazione rete paramassi – Zona Makari	€ 450.000,00

12) **Convenzione Ufficio del Genio Civile di Trapani** stipulata in data 26.11.10

**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, assistenza tecnico-amministrativa.

**Progetti assegnati:**

cod	intervento	Comune	FONDI	TITOLO	Importo AdP
TP	173	Trapani	B	Opere di regimazione idraulica – Zona Salinagrande	€ 4.000.000,00

13) **Convenzione con il Dipartimento Di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Catania** stipulata in data 12.09.11 per "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini di un tratto di mare prospiciente il Comune di Pachino (SR)" e la "realizzazione di un modello d'onda di larga scala del settore di mare della Sicilia sud orientale relativamente all'intervento SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).

14) **Convenzione con il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Messina** stipulata in data 14.09.11 "Analisi diacronica e delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra la punta Castellazzo e Punta delle Formiche" relativamente all'intervento SR 163 "Interventi in contrada Raneddi" – Comune di Pachino (SR).

15) **Convenzione con la DHI -Italia** stipulata in data 16.11.11 per "Acquisizione e processamento dei dati del modello d'onda del Mar Mediterraneo di Met – Office per tre celle situate a largo della Costa Sud – Orientale della Sicilia" e la "realizzazione di un modello d'onda di larga scala



del settore di mare della Sicilia sud orientale” relativamente all’intervento SR 163 “Interventi in contrada Raneddi” – Comune di Pachino (SR).

**16) Convenzione con Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo stipulata in data 30.11.11**

**Contenuti:**

- a. Rilievo con tecniche da terra, aeree e da satellite di dati territoriali ed ambientali. In particolare, questa attività prevede in fase di rilievo l'utilizzo di GPS, laser scanner, camere fotogrammetriche, videocamere digitali, sensori iperspettrali, sensori IR ed in fase di post-processing l'impiego dei più evoluti sistemi software di elaborazione oltre che codici di calcolo appositamente realizzati;*
- b. Post-processing di dati disponibili e/o rilevati, anche con modelli e procedure previsionali e di tipo anche statistico, al fine di pervenire alla definizione delle zone o delle situazioni di rischio per le quali provvedere, quindi, alla valutazione della vulnerabilità ambientale e territoriale legata ad eventi naturali ed antropici relativamente ad aree urbanizzate e non urbanizzate, con particolare riguardo al rischio: sismico, idrogeologico, idraulico (piene e siccità) e di incendio;*
- c. Sistema di monitoraggio del territorio per il controllo dei diversi fattori di rischio con la redazione di mappe dinamiche per la definizione della vulnerabilità delle risorse del territorio e dei possibili scenari previsionali;*
- d. Interventi di rilevamento delle condizioni di sicurezza del costruito e delle infrastrutture (strade, ferrovie e acquedotti, ecc.) con priorità per quelli di importanza strategica, con tecniche di rilievo innovative al fine di rilevarne il grado di vulnerabilità e pericolosità in relazione a possibili eventi calamitosi e prefigurarne l'eventuale intervento di adeguamento occorrente;*
- e. Progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo per le emergenze che permetta una gestione informatizzata di tutte le attività connesse con le problematiche di intervento sul territorio sia in situazioni ordinarie sia in condizioni di allerta;*
- f. Supporto all'organizzazione ed istituzione di unità di crisi e sale operative, intese come sistema composto dal personale, locali, ed attrezzature, tecnologie, metodologie, finalizzate alla gestione delle emergenze;*
- g. Man power dedicato e/o a tempo da adibire a mansioni specialistiche di acquisizione, elaborazione, restituzione dati;*
- h. Mezzi (aereo ed elicottero) per la ricognizione aerea, ove necessario equipaggiati con adeguata strumentazione per l'indagine e l'osservazione, da impiegare anche per interventi con carattere di urgenza;*
- i. Attività finalizzate al coinvolgimento in progetti e al reperimento di fondi in ambito nazionale ed internazionale."*

**Progetti assegnati:**



PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO AdP
AG	174	Cattolica Eraclea	B*	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00
ME	079	Librizzi	A	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale	€ 2.150.000,00
ME	081	Librizzi	A	Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà	€ 500.000,00
ME	091	Mirto	A	Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000,00
ME	099	Piraino	A	Opere di consolidamento – Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole	€ 1.100.000,00
ME	100	Raccuja	A	Opere di consolidamento – Zona Centro abitato	€ 5.000.000,00
ME	115_3	Sant'Angelo di Brolo	A	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	€ 2.500.000,00
ME	119	Sinagra	A	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò	€ 3.000.000,00
ME	120	Sinagra	A	Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini	€ 1.000.000,00
ME	132	Ucria	A	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – Zona via Annunziata	€ 2.500.000,00
ME	177_Int	Brolo	A	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000,00
PA	142	Carini	A	Barriere paramassi - Zona Industriale	€ 1.000.000,00
PA	149	Misilmeri	A	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa	€ 2.000.000,00
PA	179	Altofonte	A	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00
PA	181	Cefalù	A	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00
SR	162	Carlentini	A	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000,00
SR	186	Portopalo di Capo Passero	A	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00



PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO AdP
SR	187	Rosolini	A	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00
TP	190	San Vito Lo Capo	B*	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00

17) **Protocollo di intesa con il Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare dell'Università degli Studi di Palermo** stipulato in data 15.03.12 per la collaborazione nell'analisi dei dati esistenti di geologia marina nell'offshore della Sicilia Sud orientale per l'individuazione delle strategie ottimali finalizzate al reperimento di giacimenti sommersi di sabbie da utilizzare nel ripascimento di spiagge in arretramento.

18) **Convenzione con l'Istituto per l'Ambiente Marino Costiero UOS di Capo Granitola del Consiglio Nazionale Delle Ricerche** stipulata in data 18 aprile 2012 per il "Progetto di ricerca finalizzato all'individuazione di sabbie relitte sulla piattaforma Siciliana nell'area prospiciente il golfo di Gela".

19) **Convenzione con l'Azienda Regionale Foreste Demaniali** stipulata in data 06.09.12.  
**Contenuti:** supporto per le attività di RUP, responsabile lavori, progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, funzioni di stazione appaltante, direzione lavori e collaudi, assistenza tecnico-amministrativa.

Infine, in virtù del predetto art. 4 del D.P.C.M. del 10 dicembre 2010, nel corso del 2011 il Commissario Straordinario Delegato ha sottoscritto, al fine di assicurare l'efficienza e l'economicità nello svolgimento delle proprie attività, ***l'Accordo con il Soggetto Attuatore dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia*** (gennaio 2011) e ***l'Accordo con il Soggetto Attuatore per l'Emergenza Isola di Lampedusa*** (giugno 2011) "per l'interscambio di risorse tecnologiche e operative, finalizzato alla migliore esecuzione delle attività istituzionali di competenza".



## 4 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SVOLTE

### 4.1 ISTRUTTORIA PRELIMINARE E RIPARTIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE

In primo luogo, a seguito di una serie di incontri effettuati con i singoli Comuni, con tutte le Amministrazioni e gli Enti convenzionati di cui al precedente paragrafo si è proceduto ad una istruttoria preliminare della documentazione tecnico – amministrativa relativa ai singoli interventi, ed in particolare in ordine alle seguenti priorità:

- stato e livello della progettazione disponibile;
- eventuali incarichi esterni affidati;
- importo aggiornato degli interventi (suddiviso ove possibile tra lavori, somme a disposizione ed IVA);
- vincoli e livello/stato delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere;
- presenza o meno del RUP dell'intervento, ed eventuale nomina;
- disponibilità o meno delle aree di intervento (occupazione dei suoli);
- eventuali lavori già affidati;
- eventuale previsione di affidamento interno alle Amministrazioni di attività di progettazione e gestione dell'intervento (ex comma 5, art. 92 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii.);
- eventuale previsione di quota del finanziamento da destinare alla struttura commissariale per la gestione degli interventi;
- predisposizione di note in risposta dovute all'analisi di dati trasmessi.

In particolare, nell'ambito dell'attività propedeutica al finanziamento degli interventi, la struttura Commissariale ha effettuato un'azione di coordinamento tra gli Enti incaricati della progettazione esecutiva e le Amministrazioni Comunali interessate, che in sintesi sono consistite:

- Coordinare e presenziare Conferenze dei Servizi (n. 25 nel corso del 2011, n. 44 nel corso del 2012 e n. 42 alla data del 10.11.2013);
- Coordinare e presenziare tavoli tecnici (n. 18 nel corso del 2011, n. 8 nel corso del 2012 e n. 15 alla data del 10.11.2013);
- Convocare gli Enti coinvolti nella progettazione di diversi interventi al fine di porre in essere iniziative utili al superamento di tutte le problematiche tecnico-amministrative;
- Promuovere azioni necessarie ad incentivare la progettazione esecutiva degli interventi inseriti nell'AdP.

### 4.2 ALBO PROFESSIONISTI

In ottemperanza alla normativa vigente è stato predisposto l'Elenco di operatori economici a cui affidare incarichi di **progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del d.lgs. n.163/2006.**





In data 20 aprile 2011, con Decreto Commissariale n° 55, è stato emanato il Bando per la istituzione presso l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico dell'**Elenco dei professionisti** cui affidare i suddetti incarichi.

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo del Commissario Straordinario, **517 richieste** da parte di professionisti.

In data 20 luglio 2011 è stato pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) l'elenco delle richieste pervenute.

Il suddetto Elenco è stato suddiviso in ragione delle classi e categorie di cui alla tabella dell'art.14 della legge 2 marzo 1949, N. 143 e s.m.i..

**L'elenco ha validità per il triennio 2011/2013 con aggiornamento, ai sensi dell'art. 125, comma 12 del D.Lgs 163/2006, annuale a richiesta degli stessi iscritti.**

**L'aggiornamento dell'Elenco è regolamentato dal Bando nel quale viene stabilito che:**

- *“Entro il 30 maggio di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione, i Professionisti iscritti dovranno presentare, pena la cancellazione dall'Elenco dei Professionisti, una richiesta di conferma dell'iscrizione, corredata da una autocertificazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati”;*
- *“Le nuove domande pervenute entro il 30 maggio di ogni anno verranno inserite in coda all'elenco in ordine di arrivo; le conferme dell'iscrizione, da effettuarsi entro la stessa data, saranno inserite in ordine numerico progressivo secondo l'ordine di presentazione”.*

#### **AGGIORNAMENTO ANNO 2012 su piattaforma E-procurement**

Al fine di procedere con l'aggiornamento del suddetto elenco per l'anno 2012 ed in considerazione dell'entrata in funzione della piattaforma elettronica di cui al successivo punto A.3, le modalità di iscrizione sono state ampliate, consentendo ai professionisti di presentare domanda di rinnovo e/o nuova istanza anche mediante registrazione sul sito dedicato al Commissario <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor>.

Pertanto in data 17 maggio 2012 è stato pubblicato l'avviso sul sito del commissario [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) relativo alle modalità di iscrizione.



Al fine di dare maggiore pubblicità all'obbligo di conferma della propria istanza, pena la cancellazione dall'Elenco stesso, il predetto avviso è stato, altresì, trasmesso in data 18 maggio 2012 ai tutti professionisti già inseriti nell'elenco pubblicato in data 20 luglio 2011 mediante e-mail certificata e/o fax.

Nei termini previsti sono pervenute istanze pari a n. **316**, di cui 243 rinnovi di iscrizioni e 73 nuove iscrizioni. Con Decreto n. 515 del 04 ottobre 2012 è stato approvato l'Aggiornamento dell'Elenco Professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006, per l'anno 2012-2013.

I professionisti che hanno presentato istanza via cartacea sono stati comunque invitati ad effettuare la registrazione sul sito <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor> in quanto, grazie al completo funzionamento della piattaforma e-procurement, le gare di cui al successivo punto A.4, sono state espletate mediante procedura telematica.

#### **AGGIORNAMENTO ANNO 2013 su piattaforma E-procurement**

Per l'aggiornamento dell'Elenco professionisti previsto per il 2013 il Commissario, in considerazione di quanto rappresentato al punto precedente in merito alla piattaforma e-procurement, ha deliberato di limitare la modalità di iscrizione alla sola registrazione sul sito <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/vendor>, "conditio sine qua non" per la successiva partecipazione alle procedure di gara, effettuate esclusivamente per via telematica.

Con Decreto Commissariale n. 264 dell' 08 aprile 2013 si è provveduto all'approvazione dello schema di AVVISO per l'aggiornamento dell'Elenco dei professionisti cui affidare incarichi di progetta progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), con le modalità di cui all'art.91, comma2, del d.lgs. n. 163/2006.

Nei termini previsti sono pervenute istanze pari a n. **370**, il cui elenco è stato pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 17 luglio 2013 come disposto con Decreto Commissariale n.452 del 17 luglio 2013.

Dalla data di pubblicazione sono pervenute n. 5 richieste di integrazione da parte dei professionisti che a causa di un inconveniente sulla piattaforma dedicata sono stati impossibilitati alla conferma della propria istanza entro i termini previsti; l'Elenco delle istanze pervenute così come integrate dalle richieste suddette è stato approvato con Decreto Commissariale n. 848 del 11 ottobre 2013 e pubblicato sul sito del Commissario.

Al momento della stesura della presente relazione sono in corso di definizione le attività di aggiornamento dell'Elenco Professionisti **2014/2016**.

### 4.3 ALBO IMPRESE


Il Commissario Straordinario Delegato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ha istituito ***l'Elenco delle imprese per la partecipazione alle gare a procedura ristretta semplificata da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.***

#### ANNO 2011

Per l'anno 2011 il Commissario ha provveduto ad istituire l'Elenco delle imprese con Decreto Commissariale n° 54 del 20 aprile 2011, con validità annuale ed aggiornamento trimestrale limitatamente agli affidamenti per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il Bando è stato pubblicato sul sito web [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) nonché per estratto sulla G.U.R.I. – Serie speciale n.51 del 02.05.2011, sulla G.U.R.S. del 20 maggio 2011 e su il Sole 24ore del 04.05.2011, su La Repubblica del 04.05.2011, su La Sicilia del 04.04.2011 e su Il Giornale di Sicilia del 04.05.2011. Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte sono pervenute al protocollo del Commissario Straordinario c/o IAP, **492 richieste da parte di imprese** operanti nel territorio nazionale. 2011, il cui elenco è stato pubblicato sul in data 20 luglio 2011 sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

Si evidenzia che l'Elenco è stato costituito:



- per l'affidamento di lavori fino ad un importo netto a base d'asta di € 1.000.000,00 con il metodo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, previsto all'Art. 122 comma 7 bis, del D. Lgs. n. 163/06;
- per l'affidamento fino ad un importo di € 1.500.000,00 con il metodo della procedura ristretta semplificata previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 163/06.

### **ANNO 2012 su piattaforma E-procurement:**

Per l'anno 2012 il Commissario ha provveduto ad istituire l'Elenco di Fiducia Imprese con Decreto Commissariale n. 323 del 15 novembre 2011. L'elenco ha validità annuale, solo ed esclusivamente per la **procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando** e l'affidamento **con il metodo del cottimo fiduciario** si procederà trimestralmente all'integrazione dell'elenco imprese con le domande ammissibili pervenute successivamente.

Al fine di consentire la massima partecipazione e garantire nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il suddetto Bando per l'istituzione dell'Elenco delle imprese 2012 è stato pubblicato sulla GURI – 5a serie speciale n.137 del 21 novembre 2011, sulla G.U.R.S. n. 48 parte II del 02 dicembre 2011 nonché su n. 2 quotidiani a tiratura nazionale ( Corriere della Sera e La Repubblica del 19.11.2011) e su n.2 quotidiani a tiratura regionale ( Giornale di Sicilia e La Sicilia del 19.11.2011).

Avendo attivato nel corso del 2011 la piattaforma e-procurement di cui al successivo punto, i soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro le ore 24,00 del 15 dicembre 2011 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), collegandosi al link <https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/imprese/vendor> secondo le modalità di inserimento dettagliatamente riportate nel documento "Guida alla compilazione del questionario e gestione della qualifica".

Entro i termini previsti sono pervenute n. **481 istanze** di ammissione all'Elenco delle imprese 2012. Il cui elenco è stato pubblicato sul sito sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) in data 26 gennaio 2012.

In data 30 ottobre 2012 è stato aggiornato l'Elenco Imprese 2012 limitatamente ai cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, mediante l'integrazione con le domande ammissibili pervenute nel corso del terzo trimestre, entro il 26 ottobre 2012. **Si precisa tuttavia che per le procedure ristrette semplificate, l'Elenco imprese istituito non può, ai sensi della normativa vigente, essere integrato e l'elenco a cui si è fatto riferimento resta quello pubblicato il 26 gennaio 2012 con 481 imprese iscritte.**

#### **ANNO 2013 su piattaforma E-procurement:**

Per l'anno 2013 si è provveduto ad istituire, con Decreto Commissariale n. 651 del 27 novembre 2012, l'Elenco di Fiducia Imprese con validità annuale ed aggiornamento **semestrale** limitatamente agli affidamenti per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara.

I soggetti interessati hanno presentato domanda per l'inserimento nel suddetto elenco, entro le ore 24:00 del 15 dicembre 2012 secondo le modalità previste nel Bando pubblicato sul sito [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

Entro i termini previsti sono pervenute oltre **520 istanze di ammissione all'Elenco** delle imprese 2013.

In data 19 dicembre 2012 si è provveduto alla pubblicazione sul sito della Struttura Commissariale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) dell'elenco delle istanze pervenute, con l'avviso che eventuali chiarimenti dovevano pervenire entro e non oltre il 31.12.2012 ovvero i termini previsti dall'art.123 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i.

In data 9 gennaio 2013 si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco definitivo delle imprese da invitare a gare a procedura ristretta semplificata per l'anno 2013, da utilizzare anche per cottimi fiduciari e procedure negoziate senza pubblicazione di bando di gara, approvato con Decreto Commissariale n. 10/2013 del 9 gennaio 2013. Le imprese regolarmente iscritte risultano essere n. **525**.

Con Decreto Commissariale n.77/13 del 04/02/2013 è stato disposto di procedere al sorteggio pubblico dell'ordine di iscrizione, alla presenza del Notaio Dott.ssa Susanna Operamolla, tra i



soggetti aventi titolo ovvero fra le imprese da invitare a procedure ristrette semplificate per l'anno 2013 il giorno 08.02.2013.

Gli esiti del sorteggio pubblico del 08 febbraio 2013 per la formazione ordine di iscrizione imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate per l'anno 2013 sono stati pubblicati sul sito del Commissario Straordinario Delegato in data 8 marzo 2013.

A valle del sorteggio pubblico gli inviti sono stati rivolti agli operatori iscritti all'elenco Imprese 2013 nel rispetto rigoroso dell'ordine derivante dal sorteggio effettuato in data 08 febbraio 2012 sia per le procedure ristrette semplificate che per le negoziate ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs 163/2006, al fine di maggiormente garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In data 03/10/2013 si è provveduto all'approvazione dell'aggiornamento semestrale per tutte le istanze pervenute entro il 30 giugno 2013. Sono pervenute numero 106 richieste di iscrizione le quali sono state inserite nell'elenco delle Imprese esclusivamente per le procedure negoziate e per i cottimi fiduciari.

Al momento della stesura della presente relazione sono in corso di definizione le attività di aggiornamento dell'Elenco Imprese 2014.

#### **4.4 Costituzione Piattaforma Informatica E-Procurement**

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione dei contratti di appalto, secondo quanto previsto dall'art. 85 del D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., si è provveduto, all'individuazione di una soluzione tecnologica in modalità Software as a Service (SaaS)/Application Service Provider (ASP), che consenta l'esecuzione di gare telematiche, la gestione di Elenchi di Operatori Economici, la fornitura di servizi di Help Desk Tecnico e Informativo, la formazione degli utenti.

Con Decreto Commissariale n. 129 del 12.07.11, è stata disposto, a seguito di procedura di gara comunitaria esperita presso la sede del Commissario Straordinario di Roma c/o IAP l'affidamento della suddetta fornitura e la gestione del relativo servizio di e-procurement all'Impresa I-FABER S.p.A..



La piattaforma e-Procurement sviluppata da i-Faber per il Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia è composta da due moduli, perfettamente integrati tra di loro: la piattaforma per la gestione dell'Elenco Fornitori e la piattaforma per la gestione delle gare telematiche.

La finalità del suddetto servizio è quella di conseguire celermente, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, gli obiettivi previsti dall'Accordo di Programma.

I principali vantaggi della Piattaforma elettronica sono:

- E' stata sviluppata specificamente per il settore italiano P.A. conforme al D.Lgs. 163/2006, recependo immediatamente eventuali modifiche del quadro normativo;
- Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 296, comma 2, D.P.R. 207/2010 e dall'art. 70, commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006, permette una riduzione dei tempi dell'intero processo di gara: **i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di sette giorni** se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica; se le stazioni appaltanti offrono per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare, **i termini minimi per la ricezione delle offerte sono ridotti di ulteriori 5 giorni** per le procedure aperte e ristrette;
- Gestisce tutto il processo di acquisto, dalla pubblicazione del bando di gara all'aggiudicazione dell'appalto nell'ambito dei lavori, beni e servizi;
- Garantisce una totale trasparenza sul processo negoziale;
- Permette una **riduzione del contenzioso**.

La Piattaforma elettronica è pienamente funzionante dal 1 gennaio 2012 e si precisa, a tal proposito, che tutte le gare esperite a decorrere da tale data, di cui al punto successivo, sono state espletate mediante procedure telematiche.



#### 4.5 Attività di Gara da MARZO 2011 a NOVEMBRE 2013

##### 4.5.1 Aspetti Generali: Copertura finanziaria

La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi è garantita da risorse del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a valere sui fondi statali stanziati dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera A**, e da fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013 a copertura degli interventi della **Lettera B**.

Le risorse complessive stanziato per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano a € **325.588.362,76**, ripartite tra fondi Ministeriali e Regionali, dati dalla somma delle risorse disponibili nell'Accordo di Programma e di quelle risorse, a valere sui Fondi FAS, destinate alla Regione Siciliana nel successivo Atto integrativo del 3 maggio 2011.


Con l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 30 marzo 2010 sono state destinate risorse pari a € 304.337.176,92 così ripartite:

- Fondi Ministeriali per un importo pari € **152.692.572,11**, a copertura degli interventi identificati dalla **Lettera A**;
- Fondi europei stanziati per la Regione Sicilia nell'ambito del Programma Operativo FERS 2007/2013, per un importo di € **151.644.604,81**, a copertura degli interventi della **Lettera B**.

A seguito della registrazione alla Corte dei Conti dell'**Accordo integrativo** del 3 maggio 2011 altre risorse, a valere sui Fondi FAS, sono state destinate alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, per complessivi € 21.251.185,84 così ripartite:

- € **12.756.002,61** a valere sulle risorse ministeriali stanziato con Legge 23 dicembre 2009, n. 191 a copertura degli interventi ricadenti nella Lettera A;
- € **8.495.183,23** a valere sui fondi della Regione Sicilia del Programma Operativo FERS 2007/2013, linea di intervento 2.3.1.1. a copertura degli interventi ricadenti nella Lettera B.



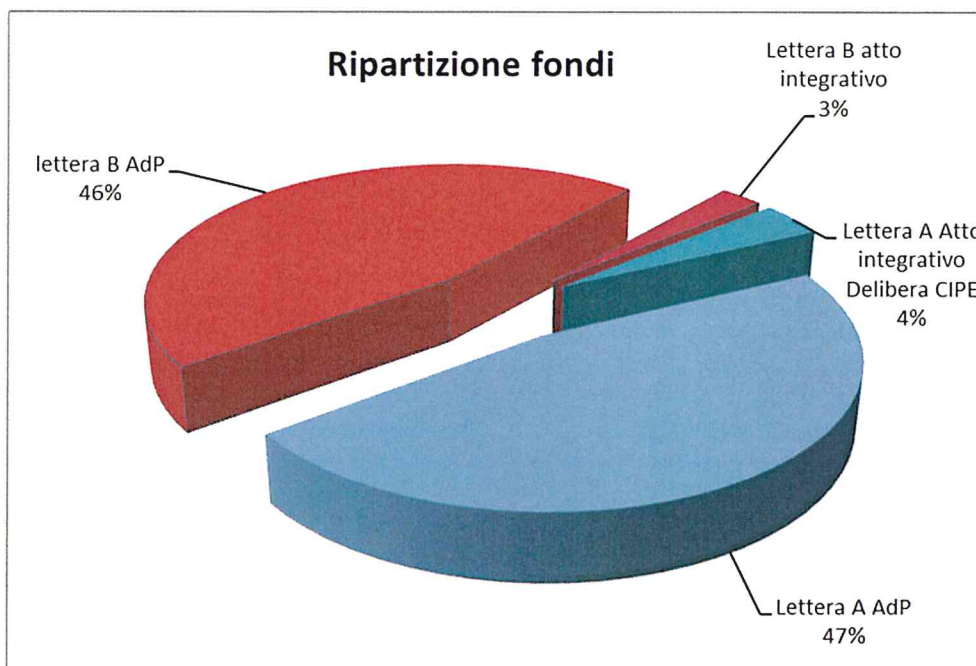

#### 4.5.2. Delibera CIPE

Nell'ambito del Piano di Azione Coesione - concordato con le regioni del Mezzogiorno - per il **rilancio dello sviluppo nelle regioni del Sud**, il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha assegnato le risorse disponibili a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 per la realizzazione di **specifici interventi di rilevanza strategica regionale**, Deliberazione n. 8 del 20 gennaio 2012 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Assegnazione di risorse a interventi di contrasto del rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale nel mezzogiorno" (pubblicata in data 25.05.2012 al n.121 della Gazzetta Ufficiale). L'attenzione è stata posta su interventi prioritari e urgenti ai fini della prevenzione e della mitigazione dei rischi da dissesto idrogeologico, al fine di limitare il rischio per l'**incolumità umana** nonché assicurare la **fruibilità dei beni** per evitare forti ricadute negative anche sull'**assetto economico e sociale del paese**. Da qui, dunque, la necessità di definire il quadro delle coperture finanziarie da assicurare per l'attivazione degli interventi in questione .

Nelle regione Siciliana sono stati individuati dalla Delibera CIPE n. 8, quali interventi di «carattere strategico regionale» quelli previsti dall'Atto integrativo ricadenti nella lettera A, pari a € 12.756.002,61. Tale individuazione è volta a migliorarne la qualità e accelerarne la




realizzazione, rafforzando i processi di collaborazione istituzionale fra le amministrazioni interessate, con particolare riguardo alle modalità attuative degli interventi.

pr	intervento	comune	titolo	importo atto integrativo
ME	177	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000,00
ME	178	Caprileone	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	€ 1.000.000,00
PA	179	Altofonte	Aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00
PA	180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita-	€ 90.000,00
PA	181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00
SR	184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	€ 2.000.000,00
SR	185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 200.000,00
SR	186	Porto Palo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00
SR	187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00
SR	188	Siracusa	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	€ 3.466.002,61
TP	189	Mazara del Vallo	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	€ 2.000.000,00

Il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli 11 interventi così individuati viene assicurato dalla predetta Delibera a valere in quota parte sulle risorse attualmente già disponibili sul bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per le restanti quote tramite la riduzione dei Programmi attuativi interregionali (PAIN) e dei Piano di azione regionali (PAR), come di seguito riportato in tabella.

Assegnazione presente delibera	Quota MATTM (L.266/2005 e L.183/2011)	Quota Riduzione PAIN	Quota PAR
12.756.002,61	1.153.004,80	5.801.498,91	5.801.498,90



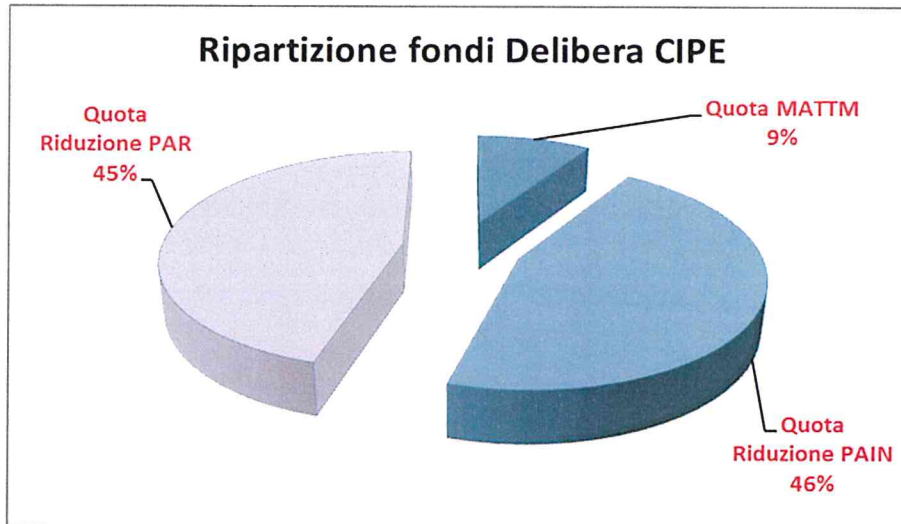

La Delibera prescrive dei tempi contenuti per la tempistica degli impegni giuridicamente rilevanti per gli interventi; stabilendo al punto 6. che:

*“Coerentemente con gli obiettivi di urgenza e di accelerazione della spesa le risorse assegnate con la presente delibera non impegnate **entro il termine del 31 dicembre 2013** attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte delle Amministrazioni destinatarie saranno revocate [...] con delibera di questo Comitato”*

Per i termini e le modalità di attuazione così stringenti, nel presente atto, gli interventi di cui alla Delibera CIPE verranno trattati separatamente rispetto a quelli inseriti nell’AdP originario.

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli interventi finanziati dal suddetto Accordo di Programma sono 202 distinti in:

- **94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali):**
  - ❖ 83 previsti dall’AdP
  - ❖ 11 previsti dall’Atto integrativo (Delibera CIPE)
- **107 nella lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d’intervento 2.3.1.A1)**
  - ❖ 101 previsti dall’AdP
  - ❖ 6 previsti dall’Atto integrativo

Stante l’approssimarsi della data di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli



interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati.

Pertanto dei 107 interventi ricadenti nella lettera B, **n. 24** sono transitati sotto la gestione commissariale e il Commissario Straordinario è stato individuato quale Soggetto Beneficiario (di seguito indentificati con **B\***).

**Gli interventi per i quali il Commissario ha la qualifica di Stazione appaltante salgono pertanto a 119.**

#### **4.5.3. GARE INTERVENTI LETTERA A**

Fino al novembre 2013 sono state attivate **112** procedure di affidamento lavori e/o servizi relativi agli interventi previsti sia nell'Accordo di Programma che nell'Atto integrativo. Per i motivi già esposti in precedenza si riportano in seguito le gare distinte in quelle espletate per la realizzazione degli interventi previsti nell'AdP originario (N. 100 gare di cui 75 di lavori per un importo complessivo pari a € **137.684.459,92**) e quelle per la realizzazione degli interventi di cui alla Delibera CIPE (N. 12 gare).


#### **4.5.4 GARE INTERVENTI LETTERA A PREVISTI NELL'ADP:**

Da marzo 2011 al novembre 2013 sono state attivate le seguenti procedure di affidamento lavori e/o servizi:

- **N. 55** procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e procedura ristretta semplificata ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **N. 10** procedure Aperte e Ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.. di cui 2 in corso di cui 9 per l'affidamento di lavori e 1 per l'affidamento del servizio di Direzione Lavori;
- **N. 28** procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito [www.clp.it](http://www.clp.it) per la realizzazione di **indagini preliminari** da espletare in situ e propedeutiche alla progettazione;
- **N. 7** procedure di **Affidamento del servizio di progettazione** definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, **Direzione lavori a**



professionisti esterni mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del d.lgs. 163/2006, di cui una in fase di avvio.

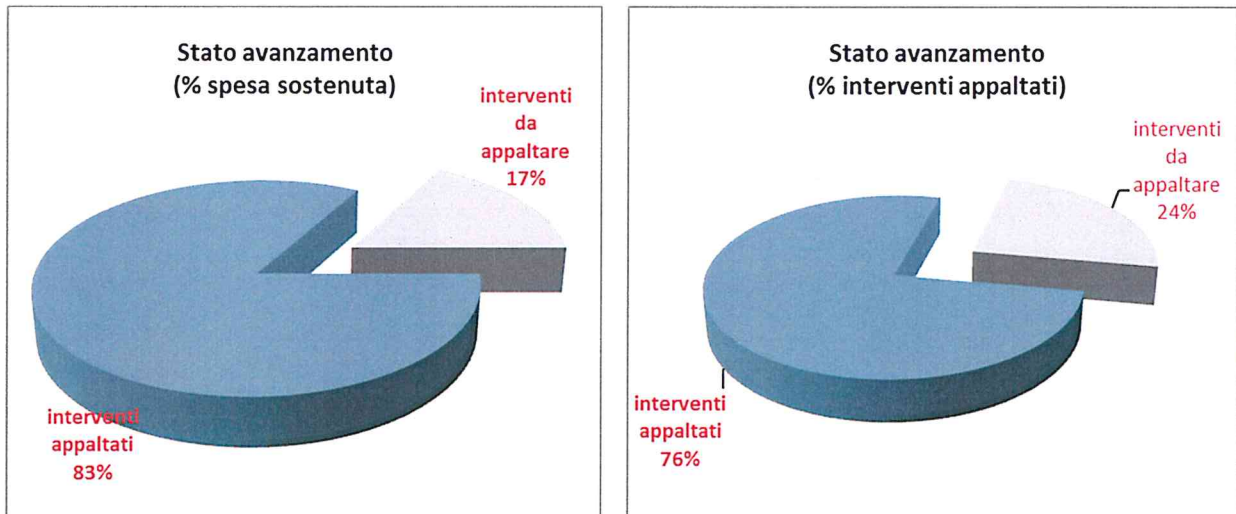



#### 4.5.5 GARE interventi previsti nell'ATTO INTEGRATIVO ed inseriti nella Delibera CIPE:

Da marzo 2011 a novembre 2013 sono state attivate **12 procedure di affidamento lavori e/o servizi**, di cui:

- **N. 6** procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara e procedura ristretta semplificata ai sensi degli artt. 122 e 123 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;
- **N. 1** procedure Aperte e Ristrette ai sensi dell'art. 55 comma 6 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. di cui 2 per l'affidamento di lavori;
- **N. 5** procedure espletate, ai sensi del comma 11 dell'art.125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., attraverso consultazione di almeno cinque operatori economici ricavabili dall'elenco dei laboratori presenti sul sito [www.clp.it](http://www.clp.it) per la realizzazione di **indagini preliminari** da espletare in situ e propedeutiche alla progettazione.

PR	intervento	comune	titolo	importo atto integrativo	Stato attuazione
ME	177	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto	€ 600.000,00	verbale inizio attività del...
ME	178	Caprileone	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	€ 1.000.000,00	verbale consegna lavori del 28/06/2013
PA	179	Altofonte	Aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00	Verbale consegna lavori 15/10/2013
PA	180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita-	€ 90.000,00	
PA	181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco	€ 400.000,00	
SR	184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	€ 2.000.000,00	
SR	185	Buscemi	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 200.000,00	Lavori ultimati
SR	186	Porto Palo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00	verbale consegna lavori del 18/11/2013
SR	187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00	aggiudicata
SR	188	Siracusa	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	€ 3.466.002,61	verbale inizio attività del 22/07/2013
TP	189	Mazara del Vallo	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	€ 2.000.000,00	

**Evidenziati in rosso gli interventi appaltati.**


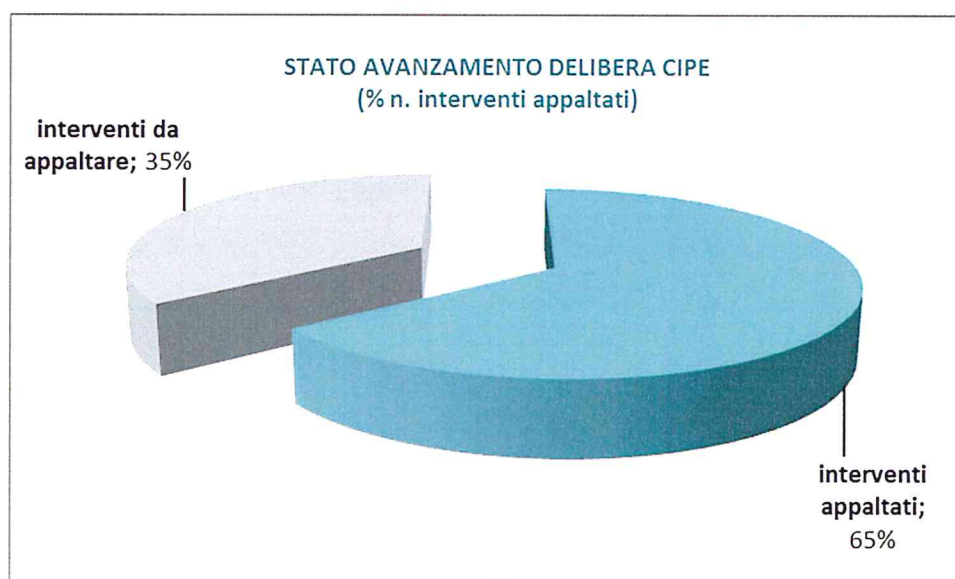



Come già riportato, per gli interventi la cui copertura finanziaria è garantita dalla Delibera CIPE n. 8 del 20 gennaio 2012, le risorse non impegnate mediante obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013 saranno revocate.

È bene sottolineare quindi che dei 4 interventi non ancora appaltati solo per l'intervento TP189 Mazara del Vallo non potrà essere rispettato il termine ultimo del 31 dicembre, con la possibilità concreta di revoca delle risorse. I restanti interventi invece sono ad un iter avanzato di approvazione dei progetti definitivi, per i quali si prevede l'emanazione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2013. In particolare:

- per gli interventi ricadenti nel territorio di Cefalù (PA180 e PA181) il 20 novembre 2013 sarà acquisito l'ultimo parere;
- per l'intervento SR184 Avola è stata convocata la conferenza di Servizi per il giorno 22 novembre 2013 al fine di acquisire i pareri necessari all'approvazione del progetto.

Pertanto la situazione al 31 dicembre 2013 degli interventi dell'Atto integrativo sarà presumibilmente la seguente:

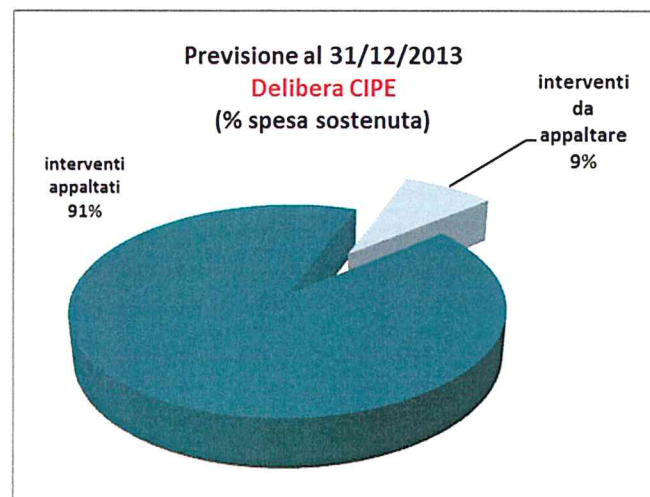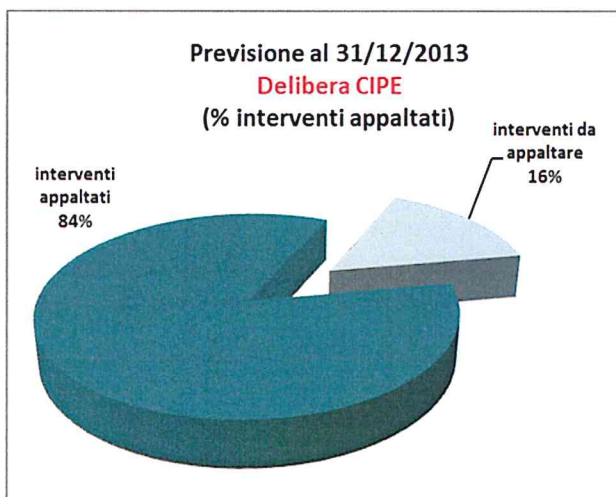

#### 4.5.6. GARE INTERVENTI LETTERA B


Le informazioni che seguono sono state elaborate sui dati forniti dall'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Fino al novembre 2013 sono state attivate **79** procedure di affidamento lavori relativi agli interventi previsti sia nell'Accordo di Programma che nell'Atto integrativo. Per omogeneità di esposizione si riportano in seguito le gare espletate per la realizzazione degli interventi B previsti nell'AdP originario (N. 75 gare) e le gare espletate per la realizzazione degli interventi ammessi nell'atto integrativo (N. 4 gare).

##### - GARE INTERVENTI LETTERA B PREVISTI NELL'ADP

Le risorse stanziare nell'Accordo di Programma per finanziare gli interventi ricadenti nella Lettera B sono pari a € 151.644.604,81 derivanti dal Programma Operativo FERS 2007/2013 per la Regione Siciliana.

Gli interventi che risultano ammessi a finanziamento sono pari a 101 dei quali n. 75 interventi risultano appaltati, per un importo complessivo pari a € **120.165.789,72**.

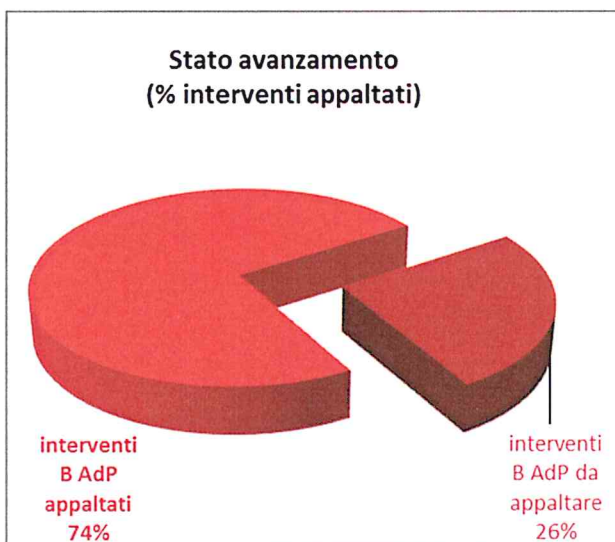



##### - GARE INTERVENTI LETTERA B PREVISTI NELL'ATTO INTEGRATIVO.

Le risorse stanziare nell'atto integrativo per finanziare gli interventi ricadenti nella Lettera B sono pari a € 8.495.183,23, per un totale di 6 interventi che risultano, sempre sulla base delle







informazioni fornite dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, appaltati per un numero di 4 interventi.

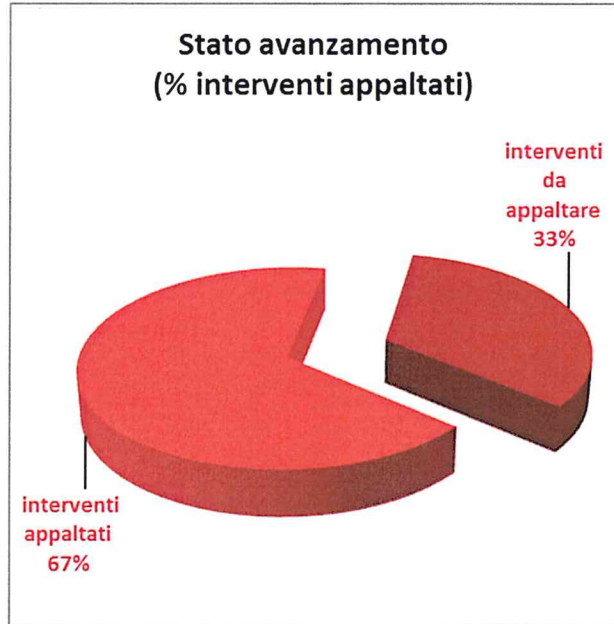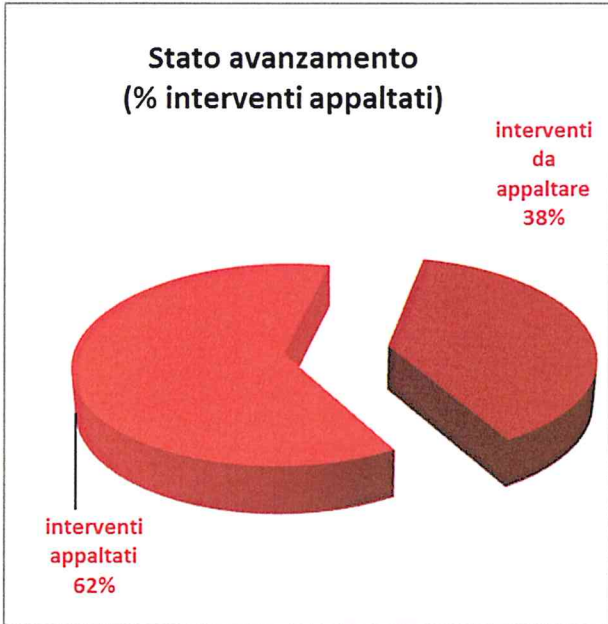

Si riporta infine il grafico relativo allo stato di avanzamento degli interventi previsti dall'AdP e atto integrativo:

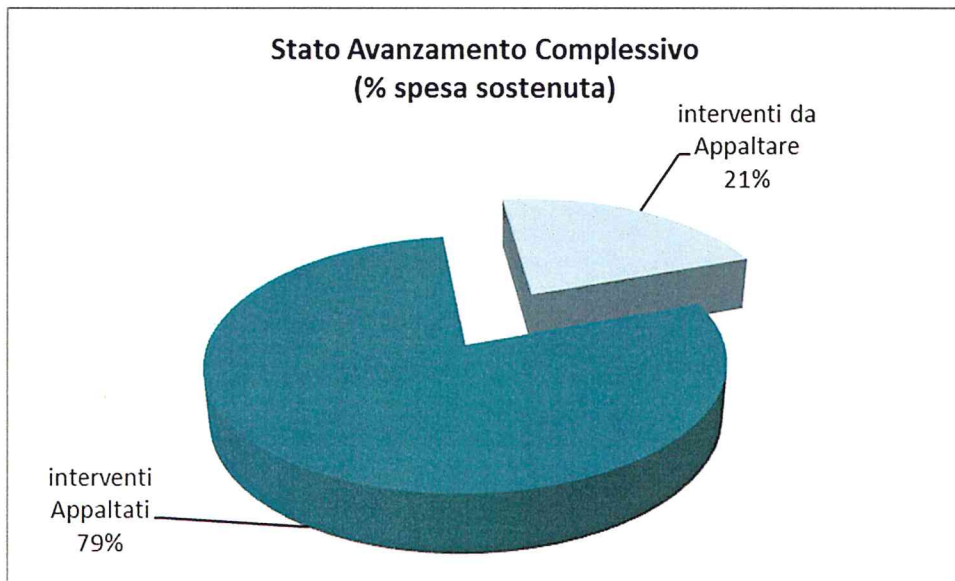


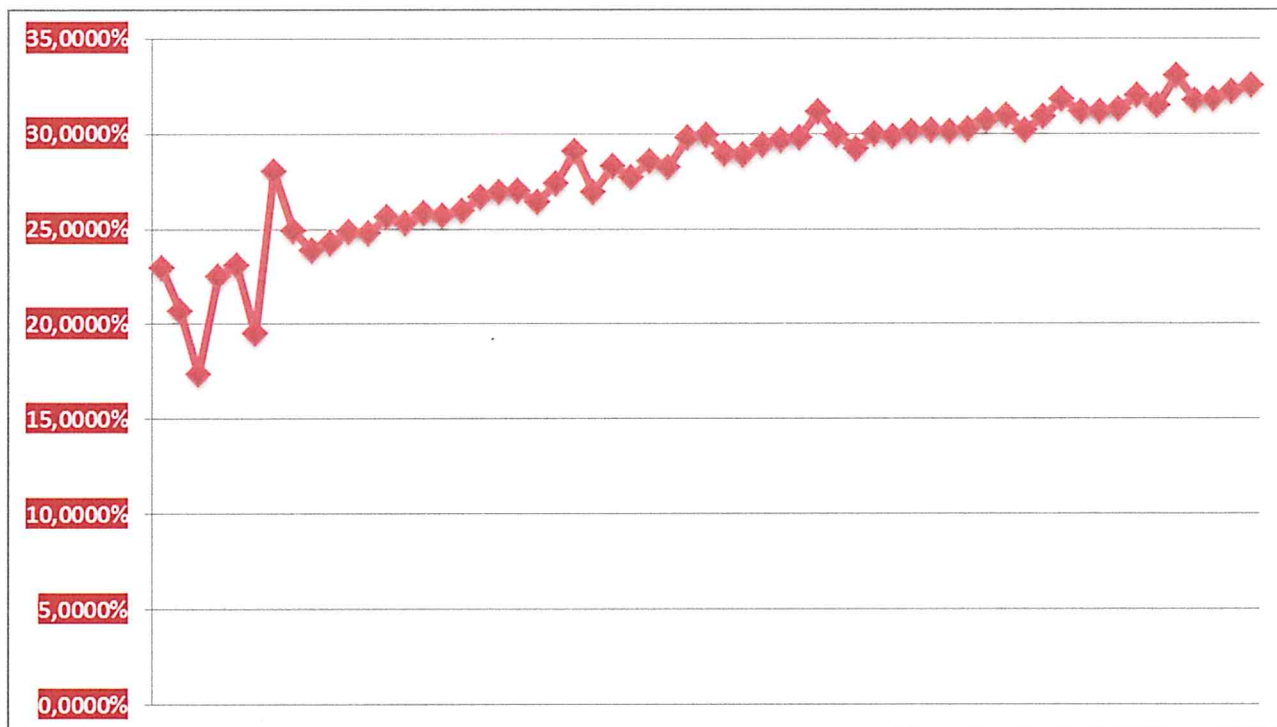
Al fine di interpretare meglio il grafico della figura precedente, si rappresenta di seguito il dettaglio delle percentuali degli interventi appaltati e da appaltare:

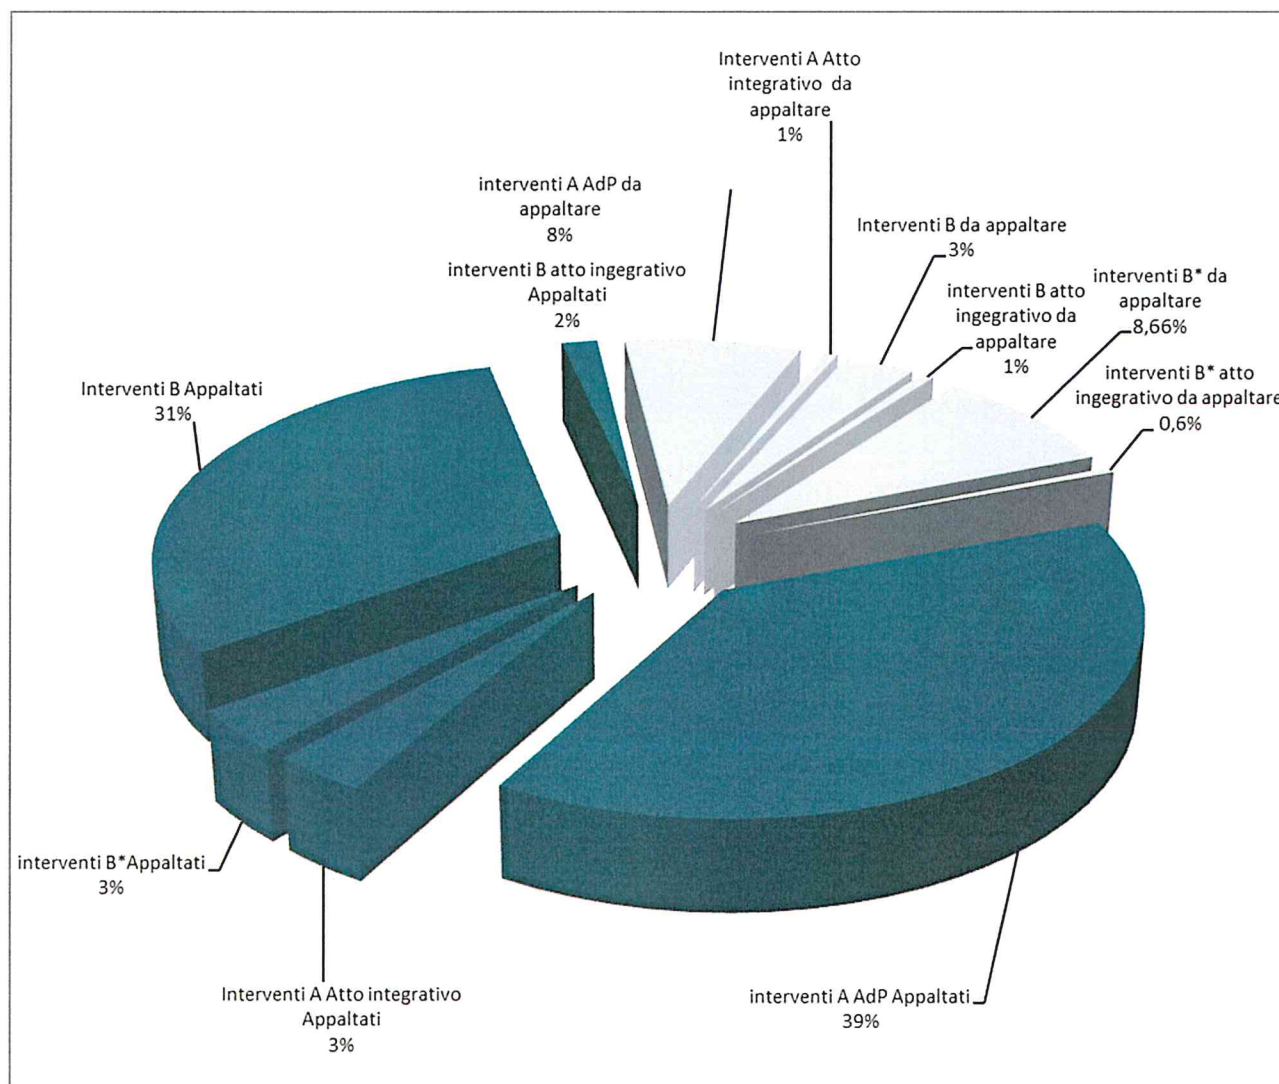

#### 4.5.4.1 Dati statistici


Si riporta qui di seguito un grafico relativo all'andamento delle percentuali di ribasso d'asta offerto dalle imprese che hanno partecipato alle relative gare d'appalto.






Come si può evidenziare, nel corso del 2013 si è confermato l'andamento già registrato nel corso dell'anno precedente rispetto ai valori del 2011, della percentuale di offerte presentate dalle Imprese per la realizzazione degli interventi inseriti nell'Accordo di Programma.

Si riporta qui di seguito il grafico relativo alla distribuzione territoriale per Regioni delle imprese Aggiudicatricie:



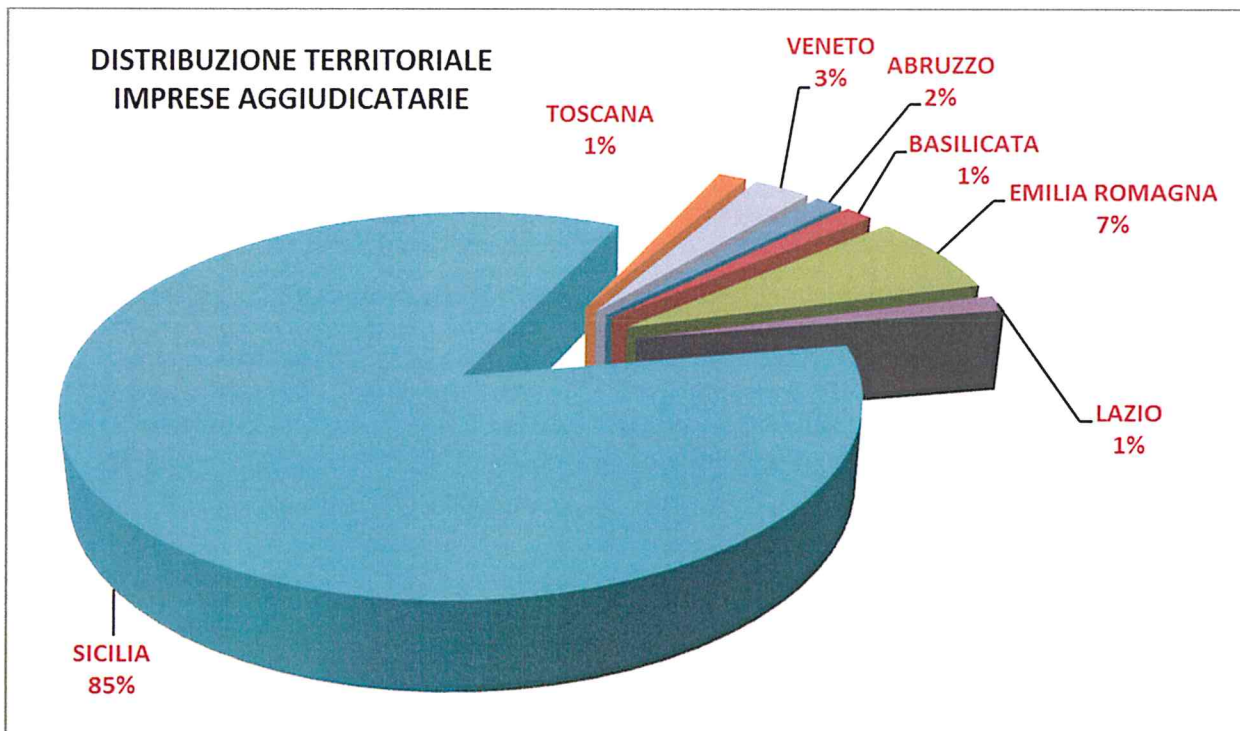

Il grafico sopra riportato mette in evidenza che l'obiettivo della mitigazione del rischio idrogeologico è stato in parte raggiunto utilizzando risorse del territorio Siciliano.

Un simile obiettivo risulta indispensabile per dare operatività alle imprese e rilancio allo sviluppo economico del territorio, mettendo a frutto le possibilità messe a disposizione dall'Europa. La strada tracciata negli ultimi anni è quella volta al miglioramento della competitività delle imprese locali, nel rispetto dei principi di economicità, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di assicurare una crescita stabile per l'intero Paese.

Particolarmente proficua risulta essere da questo punto di vista l'attività svolta da questo Commissario insieme alle Prefetture per promuovere un mercato sempre più governato dalle sole regole della libera concorrenza e per garantire il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.



## 5 STATO DELL'ARTE

Si riporta qui di seguito un esame analitico e dettagliato dello stato dell'arte degli interventi rientranti nell'accordo di Programma e nel successivo atto integrativo dettagliato come segue:

- 1) Interventi lettera A;
- 2) Interventi lettera B.

Allo stato attuale ed a seguito delle revoche e della suddivisione in più stralci di alcuni Progetti, gli interventi sono 201 divisi in 94 ricadenti nella lettera A (fondi Ministeriali) e 107 nella lettera B (fondi regionali - PO FESR 2007-2013, Linea d'intervento 2.3.1).

### 5.1 INTERVENTI LETTERA A (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)

Gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi ministeriali sono 94, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 19 interventi per i quali sono in corso le attività di progettazione esecutiva, intendendo tutte le fasi propedeutiche la realizzazione degli interventi, pertanto sono inclusi quelli per i quali sono state già affidate le attività di indagini geognostiche o si è in attesa di acquisire le necessarie autorizzazioni e pareri;
- n. 53 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o gli interventi sono in fase di realizzazione;
- n. 22 interventi, tra cui quelli di Giampileri e San Fratello, già ultimati.

<i>Interventi A</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
<i>19</i>	<i>In fase di Progettazione</i>	<i>16,42%</i>	<i>€ 27.151.010,50</i>
<i>53</i>	<i>In fase di Attuazione Intervento</i>	<i>47,38%</i>	<i>€ 78.351.585,92</i>
<i>22</i>	<i>Interventi Ultimati</i>	<i>35,88%</i>	<i>€ 59.332.874,00</i>
<i>-</i>	<i>Economie</i>	<i>0,32%</i>	<i>€ 525.906,19</i>
<b><i>94</i></b>	<b><i>TOTALE INTERVENTI</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>	<b><i>€ 165.361.376,61</i></b>

Analizzando le singole voci singolarmente si evince che:

#### Economie derivanti da revoche

<i>Economie derivanti da revoche A</i>			
	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
	<i>Economie derivanti da Revoche</i>	<i>0,32%</i>	<i>€ 525.906,19</i>
	<b><i>TOTALE Economie A</i></b>	<b><i>0,32%</i></b>	<b><i>€ 525.906,19</i></b>



In questa categoria sono state inserite le economie residue derivanti dalla revoca dell'intervento di Serradifalco (CL 020) decisa nel corso della seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 settembre 2011, pari originariamente ad € 1.600.000,00, decurtate della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Caronia (ME 058), pari ad € 653.083,40 e della quota parte delle economie utilizzate per l'incremento del finanziamento dell'intervento di Ali Terme (ME 051) pari ad € 421.050,50, così come deciso in sede di Comitato di Indirizzo e Controllo del 18 maggio 2012.

### Interventi in fase di progettazione Esecutiva


<i>Interventi in fase di Progettazione A</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
6	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	5,65%	€ 9.350.000,00
1	INDAGINI PRELIMINARI IN CORSO	1,21%	€ 2.000.000,00
1	ADEGUAMENTO DEL PROGETTO IN CORSO	1,51%	€ 2.500.000,00
6	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	5,03%	€ 8.311.010,50
5	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	3,02%	€ 4.990.000,00
<b>19</b>	<b>TOTALE in fase di Progettazione</b>	<b>16,42%</b>	<b>€ 27.151.010,50</b>

Gli interventi che risultano in fase di progettazione sono così suddivisi:

- n. 6 interventi per i quali è in corso la redazione del progetto esecutivo;
- n. 1 interventi per i quali il progetto esecutivo è già stato redatto ma, a seguito delle relative istruttorie e/o delle conferenze dei servizi, si è in attesa degli adeguamenti prescritti;
- n. 6 interventi per i quali interventi per i quali si è in attesa di pareri;
- n. 5 interventi per i quali è stata già svolta la conferenza dei servizi e sono stati acquisiti i pareri;
- n. 1 interventi per i quali le indagini preliminari sono in corso.



Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di progettazione:

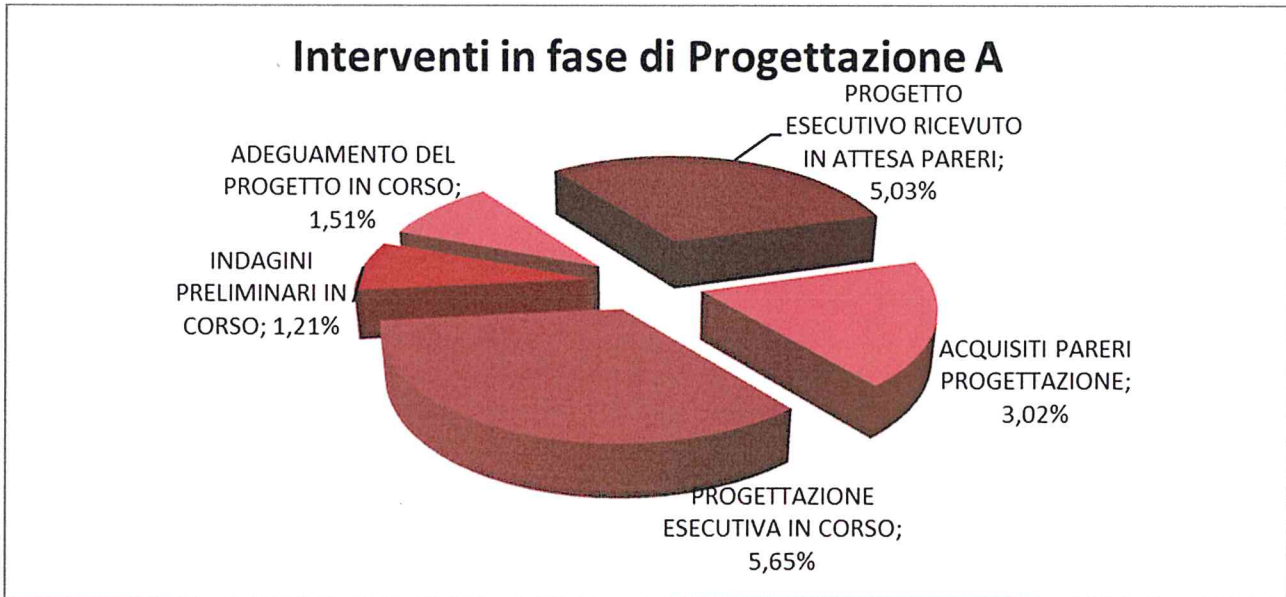

### Interventi in fase di attuazione

<i>Interventi in fase di Attuazione A</i>			
N. Interventi	Stato	%	€
5	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	5,62%	€ 9.292.500,00
13	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	10,39%	€ 17.180.000,00
32	AVVIATI LAVORI	29,38%	€ 48.579.085,92
3	SOSPENSIONE LAVORI	2,00%	€ 3.300.000,00
<b>53</b>	<b>TOTALE in fase di attuazione intervento</b>	<b>47,38%</b>	<b>€ 78.351.585,92</b>

Gli interventi che risultano in fase di attuazione sono così suddivisi:

- n. 05 interventi per i quali sono in fase di predisposizione i relativi atti di gara;
- n. 13 interventi per i quali sono state già espletate le procedure di gara per la realizzazione, è già stato stipulato il relativo contratto e si è in attesa di consegnare i lavori;
- n. 32 interventi per i quali i lavori sono in corso di realizzazione;
- n. 3 interventi per i quali i lavori sono stati sospesi.



Qui di seguito viene riportato il grafico riassuntivo degli interventi in fase di attuazione:



#### Interventi ultimati

<i>Interventi Ultimati A</i>			
N. Interventi	Stato	%	€
22	LAVORI ULTIMATI	35,88%	€ 59.332.874,00
<b>22</b>	<b>TOTALE interventi ultimati</b>	<b>35,88%</b>	<b>€ 59.332.874,00</b>

Gli interventi ultimati si riferiscono alle opere realizzate nei Comuni di Ribera ricadente nella provincia di Agrigento; alle opere realizzate nei comuni Misterbianco, Piedimonte Etneo, Ramacca e Randazzo ricadenti nella provincia di Catania; alle opere realizzate nei comuni San Fratello, Giampileri, Caprileone, Castel di Lucio, Basicò ed Alcara Li Fusi ricadenti nella provincia di Messina; alle opere ricadenti nei comuni Valledolmo, Polizzi Generosa, Termini Imerese e Blufi ricadenti nella provincia di Palermo; alle opere realizzate nei comuni di Avola e Buscemi ricadenti nella provincia di Siracusa; alle opere realizzate nel Comune di San Vito Lo Capo ricadente nella Provincia di Trapani.

#### **5.2 INTERVENTI LETTERA B (Accordo di Programma 30.03.2010 e successivo atto integrativo)**

Il complemento di Programmazione del suddetto PO FESR prevedeva che gli unici Enti beneficiari di tali risorse fossero le Amministrazioni locali che erano le uniche a fungere da stazioni appaltanti, sotto il controllo di gestione della Direzione Generale Ambiente dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente della regione Sicilia.





La rimodulazione del complemento di Programmazione del suddetto PO FESR, approvata con Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011, adottata dalla Giunta Regionale di Governo con Delibera n. 20 del 19.01.2012, prevede anche quale Ente Beneficiario l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato.

In virtù di tale rimodulazione, la Regione ha indicato 24 interventi, per un importo complessivo pari a € 39.522.214,39, corrispondenti circa al 25% degli interventi di propria competenza per i quali il Commissario Straordinario è stato individuato quale soggetto beneficiario.

Stante infatti l'approssimarsi delle date di scadenza del Programma PO FESR, la Regione ha ritenuto opportuno avvalersi degli uffici del Commissario al fine di accelerare la realizzazione degli interventi, prioritari e urgenti, ricadenti nella lettera B che presentavano ritardi e criticità di difficile risoluzione da parte Enti Beneficiari precedentemente individuati.

Si riportano di seguito gli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, che vengono pertanto individuati con la Lettera B\*.

- con nota prot. N. 13607 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	124	Terme Vigliatore	Fondi Regionali	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00

- con nota prot. N. 13611 del 02.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	130	Tusa	Fondi Regionali	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00

- con nota prot. N. 18003 del 21.03.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	106	S. Alessio Siculo	Fondi Regionali	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000


- con nota prot. N. 31329 del 29.05.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
CL	106	Caltanissetta	Fondi Regionali	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della colline Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato	€ 4.160.000

- con nota prot. N. 35347 del 15.06.2012:



PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
AG	4	Cattolica Eraclea	Regione	Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa	€ 1.480.000,00
AG	14	Santo Stefano di Quisquina	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale	€ 2.360.195,11
AG	174	Cattolica Eraclea	Regione	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00
CL	17	Butera	Regione	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00
CL	18	Butera	Regione	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	€ 800.000,00
CT	28	Licodia Eubea	Regione	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 880.000,00
CT	38	Santa Venerina	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	€ 1.000.000,00
CT	39	Sant'Agata Li Battiatì	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi	€ 1.000.000,00
ME	65	Ficarra	Regione	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne	€ 1.028.981,00
ME	68	Forza D'Agrò	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 414.163,28
ME	105	Rometta	Regione	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00
ME	127	Tortorici	Regione	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche – Zona S.Paolo	€ 2.300.000,00
PA	148	Mezzojuso	Regione	Opere di consolidamento – Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00
PA	151	Partinico	Regione	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	€ 950.000,00
RG	158_1	Modica	Regione	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	€ 2.000.000,00
SR	166	Rosolini	Regione	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
TP	190	San Vito Lo Capo	Regione	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00



- con nota prot. N. 36531 del 21.06.2012:

PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
PA	152	Petralia Sottana	Regione	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello	€ 1.200.000,00

- con nota prot. N. 40645 del 10.07.2012:


PROV	COD	COMUNE	FONDI	TITOLO	IMPORTO
ME	131	Ucria	Regione	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile-Belvedere	€ 1.261.000,00

Si precisa che per gli interventi sopra elencati alla Struttura Commissariale compete:

- l'istruttoria e l'iter autorizzativo propedeutico all'emissione del Decreto di Finanziamento che rimane a carico della Regione;
- la funzione di Stazione Appaltante.

Si evidenzia di seguito lo stato di attuazione degli interventi B\* al momento del passaggio al Commissario Straordinario.


INTERVENTI B* AL MOMENTO DEL PASSAGGIO AL COMMISSARIO				
12	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO B *	34,68%		€ 13.705.358,39
11	PROGETTAZIONE ALLA FASE PRELIMINARE B*	62,72%		€ 24.787.875,00
1	LAVORI ULTIMATI B*	2,60%		€ 1.028.981,00
24		<b>TOTALE</b>		<b>€ 39.522.214,39</b>

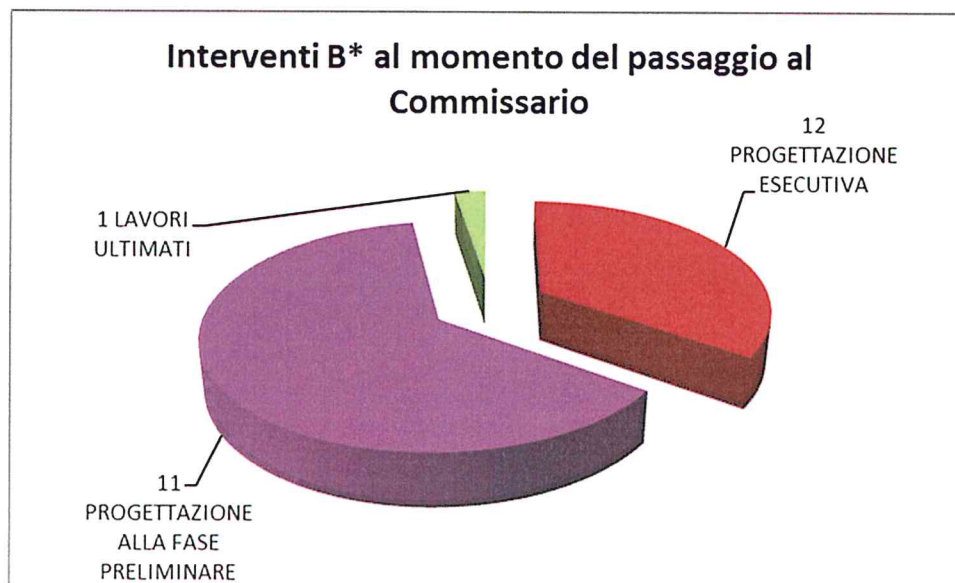


Si riporta di seguito il dettaglio dello stato attuale degli interventi ricadenti nella lettera B per i quali il Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Soggetto Beneficiario, denominati con la Lettera B\*.

<b>INTERVENTI B* COMMISSARIO (ENTE ATTUATORE)</b>			
0	PROGETTAZIONE IN FASE PRELIMINARE	0%	€ 0,00
18	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	67%	€ 27.589.358,39
5	IN FASE DI ATTUAZIONE INTERVENTO	30%	€ 12.403.875,00
1	LAVORI ULTIMATI	3%	€ 1.028.981,00
24		<b>TOTALE</b>	<b>€ 41.022.214,39</b>

- n. 18 interventi che risultano in fase di progettazione esecutiva;
- n. 5 interventi per i quali è in corso la predisposizione degli atti di gara o l'attuazione dei lavori;
- n. 1 intervento per il quale i lavori sono stati conclusi.

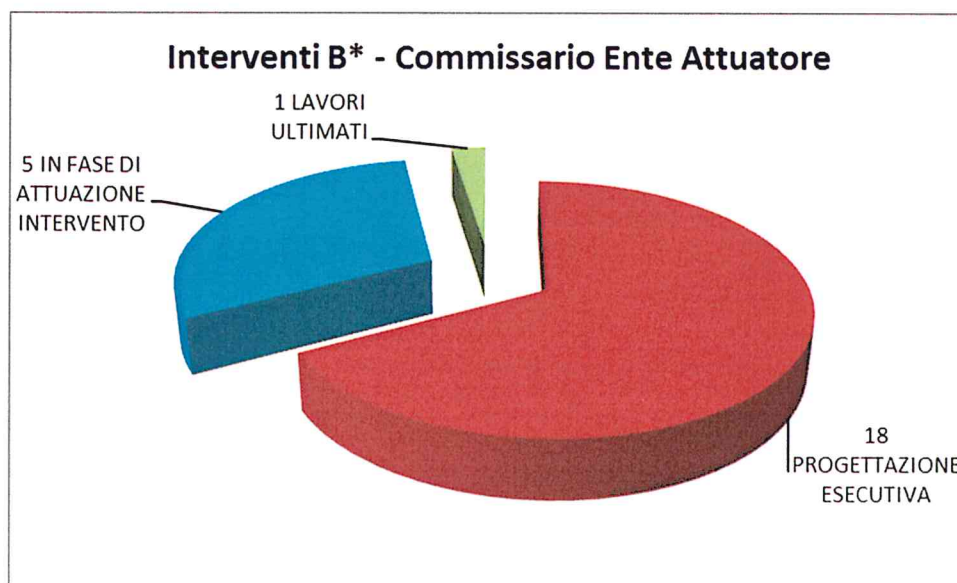



### STATO COMPLESSIVO INTERVENTI B+B\*:

Complessivamente, gli interventi che trovano copertura finanziaria con fondi messi a disposizione dalla regione Sicilia sono 107, ripartiti secondo i vari stati di avanzamento lavori, ed in particolare:

- n. 9 interventi che risultano in fase di Progettazione alla fase preliminare;
- n. 19 interventi che risultano in fase di progettazione;
- n. 73 interventi per i quali sono in corso le procedure di gara o in fase di attuazione dei lavori;
- n. 6 interventi per i quali i lavori sono stati conclusi.

<i>Interventi B</i>			
<i>N. Interventi</i>	<i>Stato</i>	<i>%</i>	<i>€</i>
9	<i>Istruttoria in Corso</i>	8,68%	€ 13.900.000,00
19	<i>In fase di Progettazione</i>	36,37%	€ 26.161.196,43
73	<i>In fase di Attuazione Intervento</i>	50,36%	€ 112.801.687,04
6	<i>Interventi Ultimati</i>	4,60%	€ 7.364.102,68
<b>107</b>	<b>TOTALE INTERVENTI</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 160.226.986,15</b>

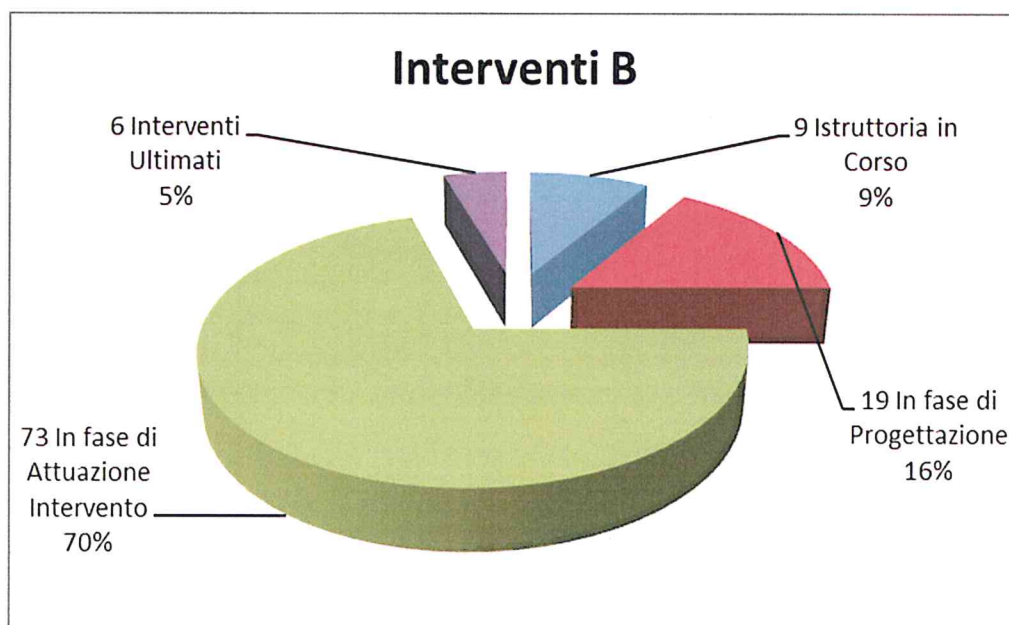


## 6 CONCLUSIONI

In questo paragrafo vengono riportate le considerazioni conclusive relative alle attività svolte dal Commissario Delegato per la prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Sicilia nel periodo dal 10.12.2010 al 20.11.2013.

Come già detto nei paragrafi precedenti l'Accordo di Programma stipulato in data 30.03.2010 ed il successivo Atto Integrativo hanno previsto la suddivisione degli interventi in due distinte lettere ("A" e "B") a seconda dell'origine dei finanziamenti. In entrambi i casi la regione Sicilia ha utilizzato come fonte di finanziamento i fondi provenienti dal *PO FESR 2007-2013*, linea d'intervento 2.3.1. Il Ministero dell'Ambiente ha utilizzato propri fondi di bilancio per la stipula dell'AdP del 30.03.2010 mentre ha messo a disposizione i propri fondi FAS per il successivo Atto integrativo.

Le risorse complessive stanziare per la realizzazione di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Siciliana ammontano pertanto ad € **325.588.362,76**, ripartiti tra fondi Ministeriale e Regionale come riassunto nella tabella seguente.

Fondi Ministeriali (lettera A)	
AdP	€ 152.692.572,11
AdP integrativo	€ 12.756.002,61
<b>Totale</b>	<b>€ 165.448.574,72</b>
Fondi Regionali (lettera B)	
AdP	€ 151.644.604,81
AdP integrativo	€ 8.495.183,23
<b>Totale</b>	<b>€ 160.139.788,04</b>


Prima dell'adozione della Decisione CE n. V(2011) 9028 del 06.12.2011 da parte della Giunta Regionale di Governo, sancita solo nel gennaio 2012, i vincoli derivanti dai fondi comunitari messi a disposizione dalla Regione Sicilia hanno, di fatto, diviso in due l'AdP in quanto gli stessi non potevano essere nella disponibilità dell'Ufficio del Commissario, né in termini di cassa né in termini di gestione ed attuazione dei relativi interventi.


Tale distinzione ha fatto sì che la fase attuativa degli interventi di cui alla lettera "B" è stata gestita direttamente dalle Amministrazioni comunali (beneficiarie del finanziamento) esclusivamente in regime ordinario e con tutti i vincoli imposti dalla normativa vigente che disciplina i contratti pubblici sia sul territorio nazionale che europeo.



Il risultato complessivo dello stato d'avanzamento della spesa dell'intero AdP e del successivo Atto integrativo viene riportato qui di seguito, sia in formato tabellare che grafico:


RIEPILOGO INTERVENTI A + B			
n. interventi	Stato	%	€
0	Istruttoria in Corso A	0,00%	€ 0,00
9	Istruttoria in Corso B	4,27%	€ 13.900.000,00
9	<b>Totale interventi istruttoria in corso</b>	<b>4,27%</b>	<b>€ 13.900.000,00</b>
19	In fase di Progettazione A	8,34%	€ 27.151.010,50
19	In fase di Progettazione B	8,04%	€ 26.161.196,43
38	<b>Totale Interventi in fase di Progettazione</b>	<b>16,37%</b>	<b>€ 53.312.206,93</b>
53	In fase di Attuazione Intervento A	24,06%	€ 78.351.585,92
73	In fase di Attuazione Intervento B	34,65%	€ 112.801.687,04
126	<b>Totale Interventi in fase di attuazione</b>	<b>58,71%</b>	<b>€ 191.153.272,96</b>
22	Interventi Ultimati A	18,22%	€ 59.332.874,00
6	Interventi Ultimati B	2,26%	€ 7.364.102,68
28	<b>totale interventi ultimati</b>	<b>20,49%</b>	<b>€ 66.696.976,68</b>
	Economie derivanti da revoche int A	0,16%	€ 525.906,19
<b>201</b>	<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 325.588.362,76</b>

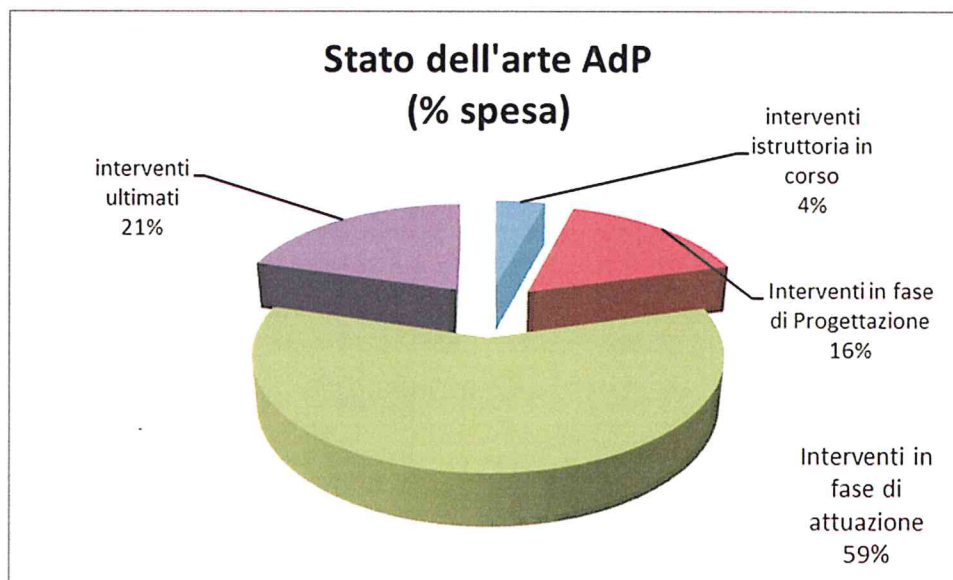


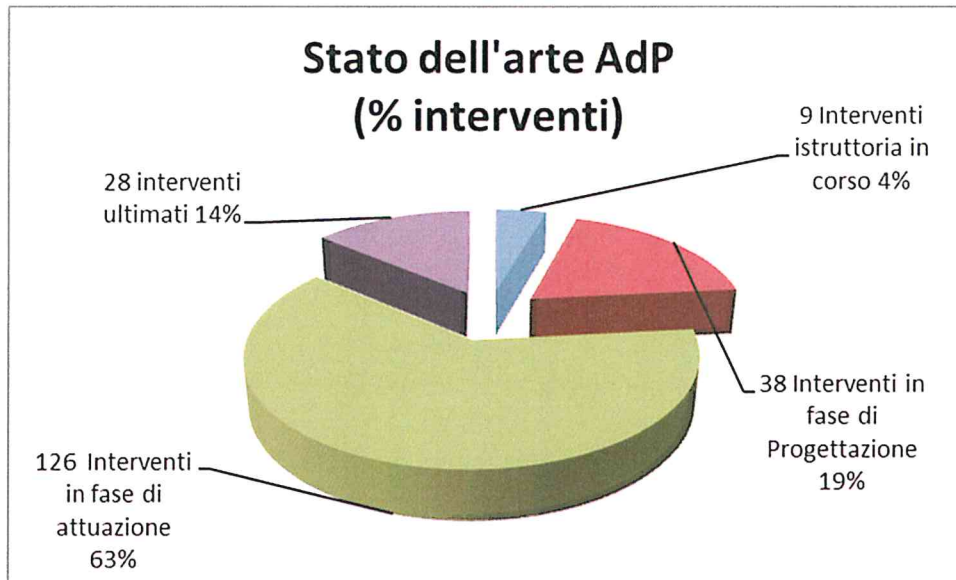



Per maggiore dettaglio, si riporta, qui di seguito, sia in formato tabellare che grafico, lo stato d'avanzamento degli interventi finanziati dalla Delibera Cipe n. 8/2012 facenti parte dell'atto integrativo all'AdP:

RIEPILOGO INTERVENTI ATTO INTEGRATIVO			
n. interventi	Stato	%	€
4	In fase di Progettazione A	21,13%	€ 4.490.000,00
2	In fase di Progettazione B	14,59%	€ 3.100.000,00
<b>6</b>	<b>Totale Interventi in fase di Progettazione</b>	<b>35,72%</b>	<b>€ 7.590.000,00</b>
6	In fase di Attuazione Intervento A	37,96%	€ 8.066.002,61
4	In fase di Attuazione Intervento B	25,39%	€ 5.395.183,23
<b>10</b>	<b>Totale Interventi in fase di attuazione</b>	<b>63,34%</b>	<b>€ 13.461.185,84</b>
1	Interventi Ultimati A	0,94%	€ 200.000,00
0	Interventi Ultimati B	0,00%	€ 0,00
<b>1</b>	<b>totale interventi ultimati</b>	<b>0,94%</b>	<b>€ 200.000,00</b>
<b>17</b>	<b>TOTALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 21.251.185,84</b>





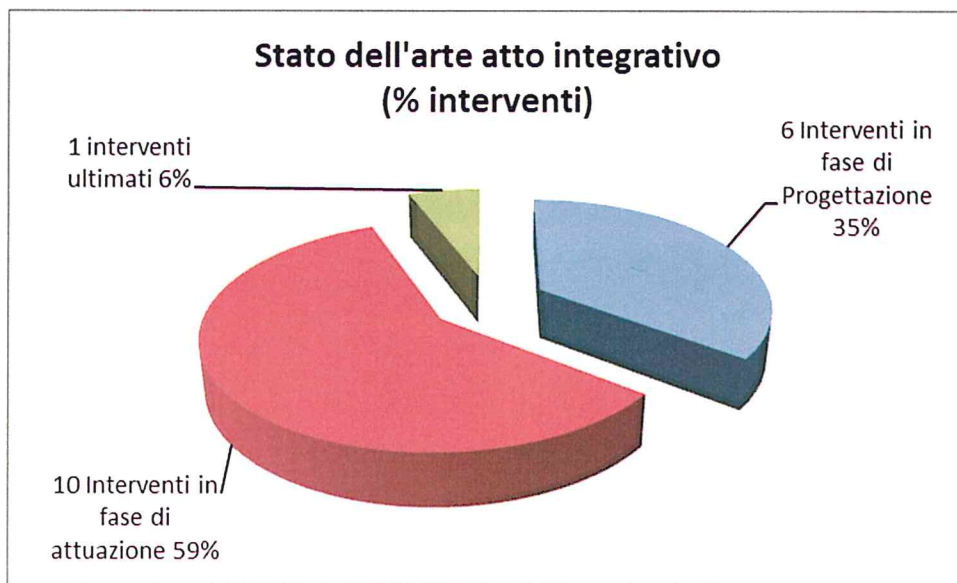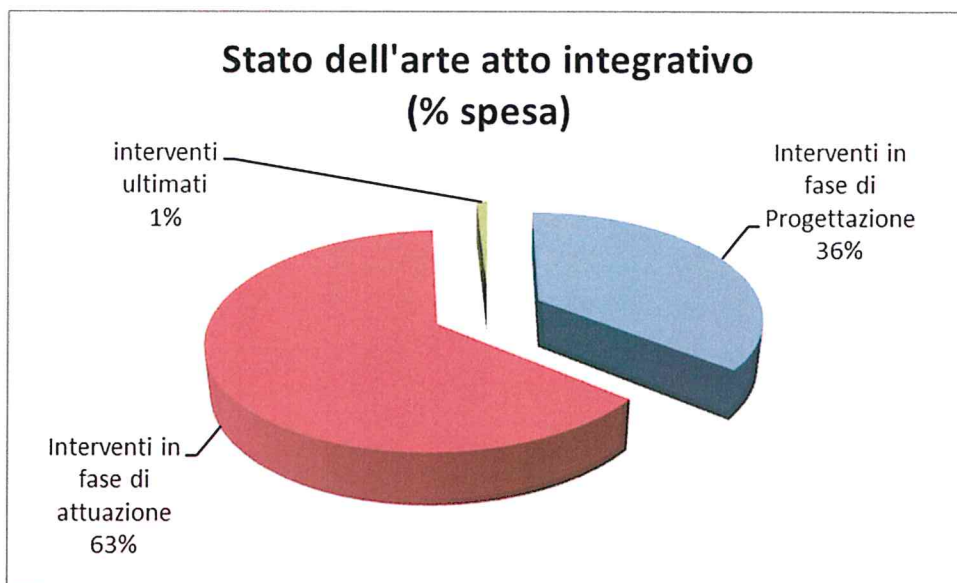

Si allegano alla presente relazione le schede riassuntive di tutti gli interventi previsti nell'accordo di programma (allegato 5).

**Il Commissario Straordinario Delegato**

(Dott. Maurizio Croce)





*Il Commissario Straordinario Delegato*



## ALLEGATO 1

---

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo

Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)



***Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare***

**e**

***Regione Siciliana  
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente***

**ACCORDO DI PROGRAMMA**

**FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL  
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E  
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO .**



## PREMESSE

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art. 15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" che all'articolo 8 disciplina i programmi comuni fra più amministrazioni;

**VISTA** la Legge 15 marzo 1997, n. 59, "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e ss.mm.ii. ;

**VISTO** il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

**VISTA** la Legge 18 maggio 1989, n. 183, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, modificato dal decreto legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 recante "Interventi urgenti in materia di protezione civile";

**VISTO** il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, "Riforma dell'organizzazione del Governo" a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

**VISTA** la Legge 31 luglio 2002, n. 179, recante "Disposizioni in campo ambientale", ed in particolare l'art. 16 relativo a "Provvidenze per le aree a rischio idrogeologico";

**VISTO** il comma 432 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2006 ;

**VISTO** il comma 321 dell' art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



**CONSIDERATO** che lo stesso articolo 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede altresì che le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che definisce altresì la quota di cofinanziamento regionale;

**VISTO** il Decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

**VISTO** Decreto Ministeriale n. GAB/DEC/2010/34 del 15 marzo 2010 di autorizzazione provvisoria all'adozione di provvedimenti di spesa emanato nelle more dell'adozione della Direttiva sull'azione amministrativa per l'anno 2010;

**CONSIDERATO** che uno studio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha evidenziato che il 9,8% del territorio nazionale è interessato da aree ad alta criticità idrogeologica e che 540 chilometri di linea di costa risulta a potenziale rischio di erosione per i beni esposti;

**RAVVISATA** la necessità di considerare in modo unitario tutte le risorse affini e contigue presenti nel bilancio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche per attivare un piano di azione che garantisca la massima efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

**RITENUTO** indispensabile utilizzare tali risorse attraverso una sequenza di singoli accordi di programma che consentano alle Regioni di operare con la massima flessibilità operativa e di far confluire nel contempo risorse proprie per addivenire ad una programmazione organica ed unitaria rispondente alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico;

**RITENUTO** necessario dare avvio a tale serie di accordi di programma intervenendo, immediatamente, per fronteggiare le situazioni di maggiore emergenza e criticità;

**CONSIDERATI** i gravi eventi calamitosi che hanno di recente colpito la Regione Siciliana con perdita di vite umane e danni economici notevolissimi che hanno comportato l'emanazione di una serie di Ordinanze di Protezione Civile;

**CONSIDERATO** che la Regione nell'ambito del Programma Operativo FESR 2007/2013 con una dotazione di Euro 151.644.604,81 per le specifiche linee d'intervento 2.3.1.1. e 2.3.1.2. prevede di attivare interventi di difesa del suolo da fenomeni di dissesto idrogeologico;

**QUANTIFICATI** in complessivi Euro di provenienza dagli esercizi finanziari 2008 e 2009, le risorse da utilizzare nel presente Accordo di Programma da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

**VISTA** la nota prot. n. 754 del 30 Marzo 2010 con la quale la Regione Siciliana ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, la proposta di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che tiene conto anche delle richieste pervenute direttamente al Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio e del mare dagli enti locali e consegnate alla Regione competente nel corso delle riunioni tecniche svoltesi presso il Ministero;

**RILEVATO** che la Regione Siciliana, con la stessa nota n. 754 del 30 Marzo 2010 ha reso noto l'importo delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento degli interventi oggetto della presente intesa;

**ACQUISITI** gli esiti dell'istruttoria tecnica condotta congiuntamente dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, dalla competente struttura regionale e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;



## TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana,  
(di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

## ACCORDO DI PROGRAMMA

### Articolo 1

(*Premesse*)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

### Articolo 2

(*Oggetto e finalità*)

Il presente Accordo è finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana.

### Articolo 3

(*Programma degli interventi*)

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana vengono elencati nell'Allegato 1 al presente Accordo che ne costituisce parte integrante.
2. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.

### Articolo 4

(*Copertura finanziaria degli interventi*)

La copertura finanziaria del fabbisogno complessivo degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 è analiticamente descritta nella seguente Tabella n.1. In particolare,

- per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, Euro 55.500.000,00 sul capitolo 8640 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2008; Euro 13.993.170,00 sul capitolo 8531 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2008; Euro 1.500.000,00 sul capitolo 8531 (PG 05) di provenienza dall'esercizio finanziario 2008; Euro 62.514.881,54 sul capitolo 8640 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2009; Euro 15.602.830,00 sul capitolo 8531 (PG 01) di provenienza dall'esercizio finanziario 2009; Euro 3.581.690,57 sul capitolo 8531 (PG 03) di provenienza dall'esercizio finanziario 2009;
- per la Regione Siciliana, Euro 151.644.604,81 sul capitolo 892057 del Bilancio regionale.

**Tabella 1 Copertura finanziaria**

	FONTI	RISORSE
MATTM	cap. 8640 (01) e.f. 2008	Euro 55.500.000,00
	cap. 8531 (01) e.f. 2008	Euro 13.993.170,00
	cap. 8531 (05) e.f. 2008	Euro 1.500.000,00



	cap. 8640 (01) e.f. 2009	Euro 62.514.881,54
	cap. 8531 (01) e.f. 2009	Euro 15.602.830,00
	cap. 8531 (03) e.f. 2009	Euro 3.581.690,57
	<b>TOTALE RISORSE MATTM</b>	<b>Euro 152.692.572,11</b>
REGIONE SICILIANA	Cap.892057	Euro 151.644.604,81
	<b>TOTALE RISORSE REGIONE</b>	<b>Euro 151.644.604,81</b>
<b>TOTALE RISORSE FINANZIARIE</b>		<b>Euro 151.644.604,81</b>

### Articolo 5

*(Modalità di attuazione - Soggetti attuatori)*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente Accordo di Programma, i soggetti sottoscrittori si avvalgono di uno o più commissari straordinari di cui all'articolo 17, comma 1 del DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
2. Le aree oggetto d'intervento, ove già non lo siano, dovranno essere comprese nei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico in corso di predisposizione, predisposti, adottati o vigenti.

### Articolo 6

*(Soggetti responsabili)*

1. I soggetti responsabili dell'Accordo sono individuati nella figura del Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche del MATTM e nella figura del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente della Regione Siciliana.
2. I soggetti responsabili dell'Accordo provvedono di concerto a promuovere, con i Responsabili dei singoli interventi, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo.
3. I soggetti di cui all'art. 5 che saranno individuati quali responsabili dell'attuazione delle opere oggetto del presente Accordo, promuoveranno le attività necessarie per ottenere i progetti esecutivi e provvedere all'acquisizione dei pareri necessari a rendere i progetti immediatamente cantierabili.

### Articolo 7


*(Attività di coordinamento)*

Le attività di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi, nonché quella di verifica si attuano secondo quanto indicato dal comma 2, art. 17 del citato DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 26.

### Articolo 8

*(Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo)*

1. E' costituito il "Comitato di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo" (di seguito Comitato) a cui è demandato, senza oneri a carico del presente Accordo, il compito di indirizzo e controllo per la gestione dell'Accordo di Programma stesso, come specificato nei successivi commi.
2. Il Comitato è coordinato dal Direttore Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche del MATTM o suo delegato che può avvalersi delle strutture di cui all'articolo 17, comma 2 del citato DL 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2010, n.



26, ed è composto da un rappresentante dell'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente e da un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Responsabile dell'Accordo può invitare i Soggetti attuatori alle sedute del Comitato in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Al "Comitato per la gestione dell'Accordo" spetta il compito di:

- a) Governare e controllare il processo complessivo di programmazione e realizzazione degli interventi ricompresi nell'Accordo;
- b) assicurare, sulla base dei risultati del monitoraggio di cui al successivo articolo 10 la ricognizione sull'attuazione degli interventi, con cadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascuna annualità, evidenziando le eventuali situazioni di criticità;
- c) garantire un flusso informativo sistematico e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente all'ambito territoriale interessato, che avverrà in coincidenza con le scadenze di cui al punto precedente;
- d) promuovere l'eventuale attivazione delle procedure sostitutive in caso di inadempienza o di non rispetto dei tempi ;
- e) indicare ai Soggetti Attuatori ed ai Responsabili dell'Accordo eventuali azioni che si rendessero necessarie per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo;
- f) definire rimodulazioni del quadro finanziario degli interventi derivanti da eventuali economie accertate sugli stessi - compresi i ribassi d'asta - nonché definire le riprogrammazioni delle risorse, sia sulla base di eventi sopravvenuti che delle modifiche apportate agli strumenti di pianificazione di settore.


5. Il Comitato ha altresì il compito di assicurare la corretta ed efficace attuazione del presente Accordo. In caso di insorgenza di conflitti in merito all'interpretazione ed attuazione dello stesso, il Comitato, su segnalazione dei Responsabili dell'Accordo, ovvero su istanza di uno dei Soggetti interessati dalla controversia, ovvero anche d'ufficio, convoca le parti in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.

#### Articolo 9

##### *(Monitoraggio degli interventi)*

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico, come individuate al presente Accordo, la Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del MATTM, di concerto con il Dipartimento Regionale dell'Ambiente della Regione Siciliana, provvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio, di cui al comma precedente, è attuato con il supporto tecnico ed operativo dell'ISPRA e mediante il sistema informativo del Repertorio Nazionale degli Interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS).
3. I Soggetti Attuatori sono tenuti a rispettare la localizzazione dell'interventi. Per ogni eventuale modifica totale o parziale della localizzazione dell'intervento per motivate e documentate esigenze sopravvenute, dovrà essere chiesta specifica autorizzazione al Comitato di cui all'art.9.
4. I Soggetti Attuatori di cui all'art. 5, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ISPRA gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli interventi stessi.





Fatte salve le eventuali diverse modalità integrative individuate nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 5, i Soggetti Attuatori adempiono a quanto previsto dal precedente comma 3 entro 15 giorni dall'adozione dei corrispondenti atti attraverso le modalità di comunicazione telematica integrate nel sistema ReNDiS- web, ed in particolare:

- comunicano la nomina del R.U.P. e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi;
  - trasmettono l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento;
  - comunicano l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, inviandone la relativa delibera ed il quadro economico risultante;
  - trasmettono la comunicazione inizio lavori;
  - forniscono, su richiesta di ISPRA, anche per le vie brevi, informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici;
  - comunicano gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga;
  - comunicano l'avvenuta conclusione dei lavori e trasmettono il certificato di collaudo delle opere (o il C.R.E.) corredato del quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie residue;
  - trasmettono copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale ovvero in modalità telematica.
6. I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti nel sistema informativo ReNDiS-web saranno accessibili e condivisi tra tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi, anche ai fini delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e controllo di cui al precedente articolo 8.

#### Articolo 10

##### *(Impegni delle parti)*

1. Gli interventi previsti nel presente Accordo devono essere realizzati assicurando il coordinamento con le azioni volte a conseguire un adeguato livello di sicurezza, anche attraverso il raccordo con la pianificazione di bacino o distretto.
2. Gli interventi strutturali e le azioni di mitigazione dovranno inoltre essere coordinati e tener conto degli sviluppi collegati ad altri atti regionali di programmazione.
3. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:
  - a) rispettare le modalità di attuazione ed i termini concordati con il presente Accordo;
  - b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, in particolare con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
  - c) rendere disponibili, nei limiti di quanto previsto dalle proprie disposizioni organizzative e funzionali, tutte le informazioni ed i mezzi disponibili per l'attuazione dell'Accordo;
  - d) attivare ed utilizzare a pieno ed in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo, per la realizzazione delle diverse tipologie di intervento;
  - e) rimuovere, in ognuna delle fasi del procedimento di realizzazione degli interventi, ogni eventuale elemento ostativo;
  - f) condividere il monitoraggio delle attività, ognuno per le proprie competenze.

#### Articolo 11



*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Accordo di Programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Accordo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.

In Roma, li 30 marzo 2010

Letto, approvato, sottoscritto.

Per il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Il Ministro On. Stefania Prestigiacomo

Per la Regione Siciliana  
L'Assessore del Territorio e dell'Ambiente  
On. Giovanni Di Mauro




Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell'Ambiente

Accordo di programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico


ALLEGATO 1

CODICE	COMUNE	RETOEO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
AG 001 B	Agrigento - Genio Civile	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 2.000.000,00
AG 002 B	Caltabelotta	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 600.000,00
AG 003 A	Cammarata	Quartiere Santa Lucia	Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia	€ 1.050.000,00
AG 004 A	Cattolica Eraclea	Eraclea minoa	Opere di consolidamento - Zona Eraclea Minoa	€ 1.480.000,00
AG 005 B	Cianciana	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante ovest del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 942.838,00
AG 006 A	Favara	Zona tra le vie De Gasperi e De Pretis	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis	€ 1.500.000,00
AG 007 A	Lucca Sicula	Centro Urbano	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.500.000,00
AG 008 B	Montallegro	Consolidamento della parete Est del Monte Lupo sovrastante il centro abitato	Comprensorio urbano	€ 2.407.326,00
AG 009 B	Ravanusa	Consolidamento zona Est Centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
AG 010 B	Ribera	Completamento consolidamento centro abitato secca grande	Comprensorio urbano	€ 2.600.000,00
AG 011 A	Ribera	Centro Urbano	Opere di consolidamento centro urbano	€ 939.021,00
AG 012 A	Sambuca di Sicilia	Quartiere "Saraceno"	Opere di consolidamento delle cavità sotterranee con sostegni metallici e in c.a. - chiodature - Quartiere "Saraceno"	€ 1.025.000,00
AG 013 B	San Giovanni Gemini	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 2.500.000,00
AG 014 A	Santo Stefano di Quisquina	Zona a valle villa comunale	Opere di consolidamento e rifacimento fregimazione idrica zona a valle villa comunale	€ 2.360.195,11
AG 015 A	Sciacca	Parete coda di Volpe	Opere di consolidamento parete Coda di Volpe	€ 800.000,00
CL 016 B	Acquaviva Platani	Consolidamento della parete rocciosa a monte della Via Marino Mistretta	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
CL 017 B	Butera	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
CL 018 A	Butera	Pendici del centro Storico	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	€ 800.000,00
CL 019 A	Caltanissetta	Zona collina S. Anna, centro storico, quartiere Saccara	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della Collina S. Anna, Centro Storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato	€ 4.160.000,00
CL 020 B	Serradifalco	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.700.000,00
CT 021 B	Acicatenà	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Vampolieri	Comprensorio urbano	€ 4.500.000,00
CT 022 A	Bronte	C.da Fontanelle	Consolidamento frana	€ 1.092.500,00
CT 023 A	Caltabiano	Lapide-Pasteria	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria	€ 250.000,00
CT 024 A	Castel di Iudica	Frazione Cinquegrana	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	€ 3.000.000,00
CT 025 A	Giarre	Fraz. S. Maria la Strada	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada	€ 1.000.000,00
CT 026 A	Giarre	Codavolpe	Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe	€ 1.000.000,00
CT 027 A	Grammichele	Scarpata sottostante la via B. Buozzi	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B. Buozzi	€ 700.000,00





PROVINCIA	CODICE	COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
CT	028 B	Licodia Eubea	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	Comprensorio urbano	€ 880.000,00
CT	029 B	Maniace	Consolidamento Sponda sinistra T. le Martello	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
CT	030 A	Maniace	Contrada Galatese-petrosino	Opere di regimazione idraulica e consolidamento delle scarpate - C/da Galatese-Petrosino	€ 1.000.000,00
CT	031 A	Misterbianco	Fraz. Poggio Lupo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	€ 500.000,00
CT	032 B	Motta Sant'Anastasia	Opere di consolidamento del centro abitato; Area Nord Est	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
CT	033 A	Piedimonte Etneo	Fraz. Presa	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa	€ 500.000,00
CT	034 A	Raddusa	C.da San Nicolò	Opere di consolidamento del versante	€ 2.000.000,00
CT	035 A	Raddusa	Centro abitato	Trincea drenante a monte del centro abitato e paratie di pali	€ 2.500.000,00
CT	036 A	Ramacca	Centro abitato	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	€ 1.200.000,00
CT	037 B	Randazzo	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 960.000,00
CT	038 B	Santa Venerina	Opere di consolidamento del centro abitato; Loc. Badia-T. Fago	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
CT	039 B	Sant'Agata Li Battiati	Opere di consolidamento del centro abitato; Loc. Laucatia - Via Einaudi	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
CT	040 B	Trecastagni	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 460.000,00
EN	041 B	Barrafranca - Genio Civile di Enna	Mitigazione del rischio zona Bivio Catena	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
EN	042 B	Centuripe	Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario	Comprensorio urbano	€ 770.000,00
EN	043 B	Gagliano C	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.560.000,00
EN	044 A	Gagliano Castelferrato	C.da Urga	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga	€ 800.000,00
EN	045 A	Leonforte	Monte Cernigliere (zona soprastante scuola Verga) Monte Cernigliere (zona soprastante la via Trieste)	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante scuola Verga e la via Trieste	€ 400.000,00
EN	046 B	Piazza Armerina	Interventi nel quartiere Itria	Comprensorio urbano	€ 1.130.000,00
EN	047 B	Regalbuto	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
ME	048 B	Alcara Li Fusi	Consolidamento costone roccioso sovrastante Centro Abitato	Comprensorio urbano	€ 1.880.000,00
ME	049 A	Alcara Li Fusi	C.da Cappuccini	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini	€ 1.200.000,00
ME	050 B	Alli	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 900.000,00
ME	051 B	Alli Terme	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 900.000,00
ME	052 A	Basico	C/da Badiazza	Drenaggi e opere di convogliamento - C/da Badiazza	€ 300.000,00
ME	053 A	Brolo	C.da Jannello	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannello	€ 3.630.000,00
ME	054 B	Capizzi	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
ME	055 B	Capo d'Orlando	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME	056 A	Capri Leone	Frazione Rocca	Opere di risagomatura e protezione versanti - Frazione Rocca	€ 550.000,00
ME	057 A	Capri Leone	Capri Leone Centro	Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali - Capri Leone Centro	€ 600.000,00
ME	058 A	Caronia	Centro abitato	Consolidamento centro abitato	€ 3.000.000,00
ME	059 B	Casalvecchio Siculo	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.363.853,00
ME	060 B	Castel di Lucio	Completamento degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Calvario per la S.P. 176 e per il Centro Abitato - Via S. D'Acquisto	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME	061 A	Castel di Lucio	Via Durante e Via S. Lucia	Consolidamento via Durante e Via S. Lucia	€ 1.500.000,00






CODICE	COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
ME 062 A	Castell'Umberto	Contrada Sfaranda Inferiore	Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore	€ 300.000,00
ME 063 B	Castorocale	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato - Completamento	Comprensorio urbano	€ 1.650.000,00
ME 064 B	Cesarò	Consolidamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del Centro Abitato in zona Castello Colonna-Rocca a Sud dell'Abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 065 A	Ficarra	Contrada grene	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grene	€ 1.028.981,00
ME 066 A	Ficarra	Contrada Rinella - San Noto	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto	€ 1.450.000,00
ME 067 B	Fondachelli Fantina	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 068 B	Forza D'Agro	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.250.000,00
ME 069 A	Frazzanò	Centro abitato - Via San Filippo di Fragala' - Zona Piazzale S. Lorenzo	Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Fragala' - Zona Piazzale S. Lorenzo	€ 1.165.000,00
ME 070 A	Frazzanò	Centro abitato	Opere di consolidamento ad est del centro abitato	€ 2.500.000,00
ME 071 A	Frazzanò	Centro abitato	Monitoraggio delle arce in frana del centro abitato e delle aree ad elevato rischio idrogeologico (R4)	€ 300.000,00
ME 072 A	Galati Mamertino	C.da Galini	Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante - C.da Galini	€ 500.000,00
ME 073 A	Galati Mamertino	Pilieri	Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pilieri	€ 1.100.000,00
ME 074 A	Giardini Naxos	Orto Grande	Consolidamento versante Località Orto Grande	€ 2.200.000,00
ME 075 B	Gualtieri Sicaminò	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.651.000,00
ME 076 A	Itala	Frazione Borgo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Frazione Borgo	€ 1.500.000,00
ME 077 A	Leni	Rinella	Opere di difesa costiera a difesa del centro abitato	€ 1.500.000,00
ME 078 B	Letojanni	Opere di difesa costiera	Comprensorio urbano	€ 2.000.000,00
ME 079 A	Librizzi	Librizzi centro - C.da Nasidi e Via Fraiale	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Librizzi centro e Contada Nasidi e Via Fraiale	€ 2.150.000,00
ME 080 A	Librizzi	Librizzi centro	Opere di contenimento Librizzi centro	€ 150.000,00
ME 081 A	Librizzi	Ronco Marurà	Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona Ronco Marurà	€ 500.000,00
ME 082 B	Limina	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.666.000,00
ME 083 B	Longi	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.303.100,00
ME 084 B	Malfa	Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Torricella della Frazione Capo	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 085 B	Malvagna	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 086 B	Mandanici	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.770.000,00
ME 087 B	Messina	Opere di consolidamento località Giampilieri	Comprensorio urbano	€ 24.000.000,00
ME 088 B	Messina	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 3.000.000,00
ME 089 A	Messina	Ponte Schiavo, Mili, Santo Stefano, Santa Margherita, Galati Marina	Opere di consolidamento località Ponte Schiavo, Mili, Santo Stefano, Santa Margherita, Galati Marina	€ 4.000.000,00
ME 090 B	Miltello Rosmarino	Consolidamento all'interno del centro abitato in c/da Ramisi	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
ME 091 A	Mirto	Centro abitato	Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000,00



COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
ME 092 A Mistretta	Centro abitato di Mistretta - Torrente Santa Domenica	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta - Torrente Santa Domenica	€ 800.000,00
ME 093 B Monforte San Giorgio	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
ME 094 B Morta Camastra	Completamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Mancusa	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 095 A Naso	Gattina	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina	€ 600.000,00
ME 096 B Novara di Sicilia	Consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 400.000,00
ME 097 B Pagliara	Interventi di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.000.000,00
ME 098 B Patti	Consolidamento frazione Sorrentino	Comprensorio urbano	€ 1.300.000,00
ME 099 A Piraino	Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole	Opere di consolidamento - Zona Roda - S. Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole	€ 1.100.000,00
ME 100 A Raccuja	Centro abitato - C. da Zappa	Opere di consolidamento - Zona Centro abitato	€ 5.000.000,00
ME 101 B Reitano	Opere di consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 980.000,00
ME 102 B Roccalumera	Consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 850.000,00
ME 103 B Roccavaldina	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.885.000,00
ME 104 B Roccella Valdemone	Opere di salvaguardia centro abitato	Comprensorio urbano	€ 875.000,00
ME 105 A Rometta	Lungomare centro abitato	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00
ME 106 A S. Alessio Siculo	Centro abitato	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000,00
ME 107 B San Fratello	Opere di consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 18.000.000,00
ME 108 B San Pier Niceto	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.550.000,00
ME 109 A San Pier Niceto	Centro abitato	Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'arca a protezione del serbatoio del centro abitato	€ 600.000,00
ME 110 A San Piero Patti	Centro abitato - Via L. Da Vinci, Via Catania, Via Umbria, Via Roma, SP. 122 San Piero Patti - Favoscuro	Opere di consolidamento e regimentazione idraulica del centro abitato	€ 1.850.000,00
ME 111 B Santa Lucia del Mela	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.300.000,00
ME 112 B Santa Lucia del Mela	Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologico perimetro urbano in Contrada Grazie in prossimità del Viale dei Pini	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
ME 113 A Santa Marina Salina	Fraz. Lingua e zona del Faro	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro	€ 2.000.000,00
ME 114 B Sant'Agata di Militello	Intervento di difesa idraulica del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.710.000,00
ME 115 A Sant'Angelo di Brolo	Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona Via Vallonello e Via Trento e centro urbano	Opere di consolidamento e regimentazione idraulica - Contrada Barba, Contrada Cartelli, Zona Via Vallonello e Via Trento e centro urbano	€ 8.000.000,00
ME 116 B Savoca	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
ME 117 B Scaletta Zanclea	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guidomandri Superiore	Comprensorio urbano	€ 5.000.000,00
ME 118 A Scaletta Zanclea	Centro abitato - T. Divieto	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torrente Divieto	€ 1.400.000,00
ME 119 A Sinagra	Contrada Farano	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Farano	€ 3.000.000,00
ME 120 A Sinagra	Martini	Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini	€ 1.000.000,00
ME 121 A Sinagra	Contrada Mulinazzo	Drenaggi e gabbioni - C/da Mulinazzo	€ 2.500.000,00
ME 122 B Spadafora	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.330.000,00

	COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
ME 123 A	Spadafora	Fraz S. Martino	Consolidamento dell'area - Fraz. S. Martino	€ 1.500.000,00
ME 124 A	Terme Vigliatore	Terme Marchesana	Ripascimento scogliere - Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00
ME 125 A	Tortorici	Lembo - Pellizza	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona Lembo-Pellizza	€ 1.500.000,00
ME 126 A	Tortorici	S. Antonio Sciortino	Muri su pali e raccolta acque - Zona S. Antonio-Sciortino	€ 500.000,00
ME 127 A	Tortorici	S. Paolo	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona S. Paolo	€ 2.300.000,00
ME 128 A	Tortorici	Batana - Pagliara - S. Leone	Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliara-S. Leone	€ 500.000,00
ME 129 A	Tortorici	Via Zappulla	Opere di consolidamento, regimazione idraulica e drenaggi - Zona via Zappulla	€ 4.000.000,00
ME 130 A	Tusa	Castel di Tusa (Viale Europa Unita)	Proseccuzione della barriera sovranta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00
ME 131 B	Ucria	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile Belvedere	Comprensorio urbano	€ 1.261.000,00
ME 132 A	Ucria	Via Annunziata	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio - Zona via Annunziata	€ 2.500.000,00
ME 133 B	Valdina	Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	Comprensorio urbano	€ 2.000.000,00
ME 134 B	Venetico	Consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.554.100,81
PA 135 B	Altofonte	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 800.000,00
PA 136 A	Belmonte Mezzagno	Centro urbano	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano	€ 3.000.000,00
PA 137 A	Blufi	Centro urbano	Opere di consolidamento del centro urbano	€ 2.000.000,00
PA 138 B	Caltavuturo	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 811.000,00
PA 139 A	Campofelice di Roccella	C/da Belvedere	Opere di consolidamento - C/da Belvedere	€ 1.500.000,00
PA 140 A	Camporeale	Centro abitato	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00
PA 141 B	Capaci	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.200.000,00
PA 142 A	Carini	Zona industriale	Barriere paramassi - Zona Industriale	€ 1.000.000,00
PA 143 A	Castelbuono	C/da Liccia	Opere di drenaggio consolidamento - C/da Liccia	€ 2.000.000,00
PA 144 B	Castronovo di S.	Opere di consolidamento del centro abitato: versante Est a difesa della Scuola Elementare di Via Mazzini, ecc.	Comprensorio urbano	€ 1.600.000,00
PA 145 A	Castronovo di Sicilia	Centro Urbano	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.344.000,00
PA 146 B	Geraci Siculo	Progetto di consolidamento della zona nord orientale	Comprensorio urbano	€ 1.057.000,00
PA 147 B	Marinco	Consolidamento centro abitato	Comprensorio urbano	€ 2.257.528,00
PA 148 A	Mezzojuso	Collina Brigna	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00
PA 149 A	Misilmeri	C/da piano Stoppa	Opere di regimazione idraulica - C/da piano Stoppa	€ 2.000.000,00
PA 150 A	Palermo	C/da Belmonte Chiavelli	Opere di regimazione idraulica - C/da Belmonte Chiavelli	€ 4.300.000,00
PA 151 B	Partinico	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	Comprensorio urbano	€ 950.000,00
PA 152 A	Petralia Sottana	Quartiere Casale e Scavarello	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello	€ 1.200.000,00
PA 153 B	Polizzi Generosa	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 920.000,00
PA 154 A	Polizzi Generosa	Via G. Borgese	Opere di consolidamento - Zona via G. Borgese	€ 500.000,00
PA 155 B	Termini Imerose	Intervento di monitoraggio del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 198.625,00



	COMUNE	TITOLO	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	IMPORTO
PA 156 A	Termini Imerese	Foce Fiume Torto	Risagomatura argini e opere di pulitura - Zona foce Fiume Torto	€ 800.000,00
PA 157 A	Valledolmo	C/da Renella	Opere di consolidamento - C/da Renella	€ 500.000,00
RG 158 B	Modica	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	Comprensorio urbano	€ 3.000.000,00
RG 159 A	Modica	Torrente S.Liberale	Opere di sistemazione idraulica e dei versanti - Zona Torrente S.Liberale	€ 800.000,00
RG 160 B	Ragusa	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.692.234,00
SR 161 A	Avola	C/da cavagrande del cassibile	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C/da Cavagrande del Cassibile	€ 600.000,00
SR 162 A	Carlentini	Centro abitato via venezia via 4 novembre via dei caduti	Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000,00
SR 163 B	Pachino	Intervento in Contrada Raneddi	Comprensorio urbano	€ 2.000.000,00
SR 164 B	Porto Palo di Capo Passero	Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 719.000,00
SR 165 A	Portopalo di Capo Passero	C/da casuzze-scalo mandrie	Ripristino e stabilizzazione scarpate - ripristino e protezione litorale - Zona C/da Casuzze-Scalo mandrie	€ 800.000,00
SR 166 B	Rosolini	Opere di consolidamento del centro abitato	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
SR 167 A	Rosolini	Vallone ristallo-masicugno	Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone Ristallo-Masicugno	€ 1.500.000,00
TP 168 A	Erice	Crocifassello	Consolidamento costone roccioso - Zona Crocifassello	€ 500.000,00
TP 169 A	Mazara del Vallo	Tonnarella	Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture - Zona Tonnarella	€ 800.000,00
TP 170 B	Poggioreale	Consolidamento versante orientale dell'abitato	Comprensorio urbano	€ 1.500.000,00
TP 171 A	Salemi	C/da Monte Rose	Sistemazione del costone roccioso Monte Rose a monte della via Marsala - Zona C/da Monte Rose	€ 1.500.000,00
TP 172 A	San Vito Lo Capo	Makari	Collocazione rete paramassi - Zona Makari	€ 450.000,00
TP 173 A	Trapani	Salinagrande	Opere di regimazione idraulica - Zona Salinagrande	€ 4.000.000,00

SOMMAMO

€

304.337.176,92







*Il Commissario Straordinario Delegato*



## ALLEGATO 2

---

Ufficio del Commissario Straordinario Delegato sede: Via C. Nigra, 5 – 90141 Palermo

Tel. 091 9768705 fax 091 2510542 – email : [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) – sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it)



*Ministero dell' Ambiente*

*alla Tutela del Territorio e del Mare*

UFFICIO GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

*17/01/2011 del 03 AGO. 2011*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il Regolamento del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l' articolo 2, comma 240;

**VISTA** la legge di stabilità n. 13.12.2010 n. 220;

**VISTA** la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013;

**VISTA** la Direttiva generale sull' attività amministrativa e sulla gestione per il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l' anno 2011 di cui al Decreto Ministeriale n. GAB/DEC/2011/0017 del 18/02/2011;

**VISTO** l' Accordo di Programma tra il Ministero dell' Ambiente e la Regione Siciliana, sottoscritto il 30 marzo 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297, finalizzato all' individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Siciliana;


**VISTO** l' Atto Integrativo all' Accordo di Programma sopracitato, stipulato in data 03.05.2011 tra il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Siciliana per un importo complessivo di Euro 21.251.185,84, di cui risorse nazionali pari a Euro 12.756.002,61 e risorse regionali pari a Euro 8.495.183,23;

**CONSIDERATO** che la copertura finanziaria delle risorse nazionali è assicurata per Euro 12.756.002,61 con fondi che periodicamente saranno attribuiti dal Ministero dell' Economia e delle Finanze ai sensi dell' Art. 2, comma 240 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 sul capitolo 8531(06) appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

*762* **TENUTO CONTO** che la copertura finanziaria delle risorse regionali è assicurata per complessivi Euro 8.495.183,23 con fondi di bilancio della Regione Siciliana sul capitolo 842057.

**RITENUTO** di procedere all' approvazione, con apposito decreto direttoriale, del sopracitato Atto Integrativo;

CORTE DEI CONTI



0019916-12/08/2011-SCCLA-Y30PREV-A

REG. TO ALLA CORTE DEI CONTI

Add. *28 SET 2011*

UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERI  
DELLE INFRASTRUTTURE ED ASSETTO  
DEL TERRITORIO

Reg. N. *109*

IL CONSIGLIERE


## D E C R E T A:

Art. 1 – E' approvato l'unito Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, stipulato a valle delle motivazioni specificatamente descritte nelle premesse dell'Atto stesso ed integralmente richiamate nel presente decreto.

Art. 2 – L'onere per la copertura finanziaria dell'Atto Integrativo di cui sopra, quantificato in complessivi Euro 21.251.185,84, è assicurato dalle fonti finanziarie indicate in premessa.

Il presente decreto, corredato da un "Piano di azione esplicativo" dei Piani Straordinari di cui all'art. 2, comma 240 della Legge Finanziaria 2010, sarà trasmesso agli Organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Marco Lupo)



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
VISTO N. 351

Addi, 10.8.2011.....

IL DIRETTORE





# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE  
IDRICHE

## APPUNTO PER LA CORTE DEI CONTI

*Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico*

### Piano di azione. Accordi di Programma integrativi

Il Decreto Legge n. 225/2010, convertito con legge n. 10 del 26 febbraio 2011 ("Decreto milleproroghe"), all'art. 2, comma 12 quinquies, ha autorizzato la spesa di 100 milioni di euro per il 2011 da ripartire tra la regione Liguria, la regione Veneto, la regione Campania e i comuni della provincia di Messina, colpiti dall'alluvione del 2 ottobre 2009.

All'onere derivante da tale previsioni si dovrà provvedere a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), che sono corrispondentemente ridotte di pari importo.

Tale disposizione impone al Ministero dell'Ambiente di intervenire sul Piano di azione già elaborato, "integrando" gli Accordi di Programma sottoscritti. Si ricorda che l'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria 2010 aveva destinato 1.000 milioni di euro, successivamente ridotti a 900 milioni di euro per l'effetto dell'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legge 195/2009 convertito, con modificazioni, in legge 26/2010, alla realizzazione di Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più alto rischio idrogeologico, individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le Autorità di Bacino e il Dipartimento della protezione civile nazionale. La stessa norma aveva altresì individuato, quale strumento privilegiato per l'utilizzo delle risorse, l'accordo di programma da sottoscrivere con le regioni interessate. Nell'occasione, il Ministero dell'Ambiente aveva incrementato la dotazione di 1.000 milioni di euro, originariamente prevista dalla legge finanziaria, con le risorse direttamente disponibili sul proprio bilancio per le finalità di difesa del suolo pari a circa 386 milioni di euro, destinando, pertanto, al finanziamento dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, un totale complessivo di 1.386 milioni di euro. Ciò, con l'obiettivo di programmare in maniera unitaria le risorse disponibili realizzando un complesso di interventi quanto più possibile organico e coordinato ed evitando, al contempo, duplicazioni di atti programmatori e procedure di spesa aventi medesime finalità. Si è inteso, quindi, ripartire una parte delle risorse,

pari a circa il 70% del totale, tra tutte le regioni sulla base di specifici criteri elaborati nell'ambito di uno studio effettuato dagli Uffici del Ministero dell'Ambiente; si è deciso, altresì, di ripartire l'altra parte delle risorse, pari a circa il 30% del totale, tra le regioni del Mezzogiorno, in considerazione del fatto che le risorse assegnate con la citata disposizione provenivano originariamente dai Fondi per le aree sottoutilizzate e che per queste, normalmente, trova applicazione un criterio di ripartizione territoriale (85% alle Regioni del Mezzogiorno-15% alle restanti Regioni) che tiene conto degli squilibri economico-sociali fra le diverse zone del Paese (art. 18, comma 3, del decreto-legge n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009). In particolare, sono stati utilizzati i coefficienti tradizionali, opportunamente ricalibrati anche in funzione della misura della compartecipazione finanziaria al programma da parte delle regioni interessate (*allegato 1*).

Ora, alla luce della recente ed ulteriore riduzione operata dal decreto *milleproroghe*, è necessario riconsiderare la quantificazione delle risorse da attribuire alle singole regioni (*allegato 2*). La tabella dà evidenza, tra l'altro, di un "recupero" di circa 60 milioni di euro a valere sugli Accordi di Programma sottoscritti con le regioni del Nord che potranno essere ridistribuiti alle regioni del Mezzogiorno che si vedranno assegnati complessivamente oltre 708 milioni di euro.

Il valore complessivo degli Accordi di Programma sarà pari ad Euro 2.146.152.538,63; le risorse statali, pari ad Euro 1.200.939.376,59, sono comprensive di risorse FAS (Euro 800.000.000,00) e di risorse di bilancio 2008, 2009, 2010 (Euro 386.080.415,23) nonché, limitatamente alla quota di Euro 14.858.961,36, di risorse di bilancio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Marco Lupo



## Allegato 1

REGIONE	Riparto secondo i coefficienti relativi a: Superf. 25% Popolaz. 25% Criticità idrogeol. 35% Erosione coste 15%	RIPARTO RICALIBRATO SOLO PER REGIONI FAS	RIPARTO DEFINITIVO PREMIALITÀ REGIONI FAS (*)
Abruzzo	3,154%	8%	5%
Basilicata	1,856%	5%	3%
Calabria	6,795%	17%	21%
Campania	7,632%	19%	16%
Molise	1,701%	4%	2%
Puglia	6,155%	16%	19%
Sardegna	3,790%	10%	9%
Sicilia	8,471%	21%	26%
<b>TOTALE</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

(\*) che tiene conto anche della compartecipazione

Allegato 2

REGIONE	Ripartita secondo i coefficienti relativi a: Superficie Popolare ZS5 Capacità alberghi ZS5 Sostanze ZS5	ACCORDI SOTTOSCRITTI					REGIONI CENTRO E NORD				REGIONI SUD			VALORI FINALI DEGLI ACCORDI	
		FONDI AJP SANITARI	ASSEGNIATE IN BASE AL COEFFICIENTE DI RIPARTIZIONE	AMTIPO PREALITIVA	FONDI AJP REGIONE	TOTALE AJP	FONDI ATTO INTEGRATIVO IN ESERCIZIO	PREALITIVA IN ATTO INTEGRATIVO	FREMIATIVA DEFINITIVA REGIONI SUD	TOTALE MATERIALI REGIONI SUD	TOTALE MATERIALI DEFINITIVO	TOTALE AJP RIDISTRIBUITO	TOTALE AJP RIDISTRIBUITO		
1 Piemonte	3.154%	50.750.000,00	90.665.000,00	144.000,00	10.000.000,00	40.750.000,00	17.259.762,20	47.905.762,20	47.905.762,20	47.905.762,20	57.905.762,20	57.905.762,20			
2 Valle d'Aosta	1.856%	20.200.000,00	18.205.000,00	2.155.000,00	6.735.000,00	26.395.000,00	6.735.000,00	26.395.000,00	26.395.000,00	26.395.000,00	35.204.000,00	35.204.000,00			
3 Lombardia	6,78%	114.000.000,00	63.930.000,00	43.070.000,00	110.000.000,00	220.000.000,00	67.265.000,00	131.195.000,00	131.195.000,00	131.195.000,00	243.195.000,00	243.195.000,00			
4 Campania	7,63%	110.000.000,00	74.049.000,00	35.652.000,00	110.000.000,00	230.000.000,00	50.598.829,28	124.546.829,28	124.546.829,28	124.546.829,28	345.872.029,15	345.872.029,15			
5 Sicilia	9,23%	25.293.000,00	29.599.000,00	-	6.295.000,00	35.155.000,00	2.890.200,00	32.274.000,00	32.274.000,00	32.274.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00			
6 Lazio	6,14%	40.250.000,00	59.559.000,00	391.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	35.750.000,00	35.750.000,00			
7 Umbria	3,10%	30.200.000,00	30.200.000,00	-	5.000.000,00	35.200.000,00	7.752.000,00	27.448.000,00	27.448.000,00	27.448.000,00	27.448.000,00	27.448.000,00			
8 Toscana	7,90%	77.323.000,00	77.323.000,00	-	147.370.000,00	224.693.000,00	56.477.838,75	9.959.000,00	9.959.000,00	9.959.000,00	217.199.700,00	217.199.700,00			
9 Marche	3,70%	35.300.000,00	46.302.000,00	400.000,00	20.527.833,75	56.477.833,75	7.497.000,00	24.030.833,75	24.030.833,75	24.030.833,75	32.310.000,00	32.310.000,00			
10 Abruzzo	1,70%	16.500.000,00	16.500.000,00	-	89.300.000,00	112.167.000,00	7.396.700,00	7.396.700,00	7.396.700,00	7.396.700,00	27.029.000,00	27.029.000,00			
11 Molise	2,50%	72.867.000,00	72.867.000,00	-	100.000.000,00	230.000.000,00	10.432.544,37	20.432.544,37	20.432.544,37	20.432.544,37	104.570.500,00	104.570.500,00			
12 Puglia	6,13%	118.000.000,00	59.724.000,00	50.284.000,00	100.000.000,00	310.000.000,00	70.065.510,00	28.301.065,02	64.381.065,02	64.381.065,02	230.432.544,37	230.432.544,37			
13 Basilicata	3,70%	36.000.000,00	35.775.000,00	65.000,00	33.595.510,00	70.065.510,00	30.439.173,92	11.756.502,53	165.448.574,72	165.448.574,72	317.893.179,52	317.893.179,52			
14 Calabria	8,41%	132.532.372,11	82.191.000,00	79.501.572,11	151.644.601,31	304.439.173,92	526.573.395,00	21.283.724,01	21.283.724,01	21.283.724,01	528.863.117,93	528.863.117,93			
15 Sicilia	5,95%	67.000.000,00	67.438.000,00	489.000,00	59.379.595,00	127.368.595,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	45.548.450,00	45.548.450,00			
16 Puglia	2,23%	21.000.000,00	21.275.000,00	2.280.000,00	24.048.450,33	49.048.450,33	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	30.398.734,00	30.398.734,00			
17 Valle d'Aosta	4,09%	10.000.000,00	18.507.000,00	507.000,00	11.584.734,00	21.584.734,00	57.677.000,00	57.677.000,00	57.677.000,00	57.677.000,00	47.677.000,00	47.677.000,00			
18 Valle d'Aosta	4,09%	10.000.000,00	18.507.000,00	507.000,00	11.584.734,00	21.584.734,00	57.677.000,00	57.677.000,00	57.677.000,00	57.677.000,00	47.677.000,00	47.677.000,00			
19 Lazio	5,95%	55.853.000,00	55.292.000,00	734.000,00	11.584.000,00	67.460.000,00	60.637.900,00	122.253.904,93	122.253.904,93	122.253.904,93	2.146.525.533,33	2.146.525.533,33			
TOTALE		3.139.323.372,11	934.252.000,00	205.071.572,11	945.213.162,04	2.053.525.754,15	60.637.900,00	122.253.904,93	205.378.816,59	1.209.999.376,59	1.209.999.376,59	2.146.525.533,33			

di cui fondi FAS attivati e autorizzati

DISPONIBILITA' ECONOMICHE TOTALI 1.285.090.415,23 di cui 32% accantonamento prealitalia (che tiene conto anche della quota di compartecipazione

PRIMO TAGLIO 100.000.000,00

SECONDO TAGLIO 1.285.090.415,23

DEFINITIVA DISPONIBILITA' TOTALE 100.000.000,00

DEFINITIVA DISPONIBILITA' TOTALE 1.186.090.415,23

DISPONIBILITA' 2008, 2009, 2010 1.186.090.415,23

SCOSTAMENTO 14.855.961,35 a valere sulle risorse di bilancio 2011



*Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

e

*Regione Siciliana*

**ATTO INTEGRATIVO  
ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30 MARZO 2010  
FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL  
FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E  
PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO  
IDROGEOLOGICO**



**PREMESSE**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

**VISTO** il Regolamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240 che aveva previsto che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, venissero assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione Generale competente del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le Autorità di Bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**VISTA** la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013;

**VISTA** la legge di stabilità n. 13.12.2010 n. 220;

**VISTA** la Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l'anno 2011 di cui al Decreto Ministeriale n. GAB/DEC/2011/0017 del 18/02/2011 registrata alla Corte dei Conti il 28 marzo 2011, Registro n. 2, Foglio n. 142;

**VISTO** l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, sottoscritto il 30 marzo 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297, finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto Legge 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, che, all'art. 2, comma 12-quinquies, ha ridotto di un importo pari ad euro 100 milioni le risorse stanziati dall'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, già divenute 900 milioni per l'effetto dell'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legge 195/2009 convertito, con modificazioni, in legge 26/2010;

**QUANTIFICATE** in complessivi Euro 12.756.002,61 le ulteriori risorse statali rese disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 da attribuire alla Regione Siciliana per il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** il verbale della riunione del 24 marzo 2011 del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, nell'ambito della quale la Regione Siciliana ha comunicato la disponibilità di Euro 8.495.183,23 provenienti dalla revoca di finanziamenti nell'ambito del POR-FESR 2007-2013 - Linee di intervento 2.3.1.1 e 2.3.1.2 disposta con DDG n. 156 del 18.3.2011, per il finanziamento di ulteriori interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da utilizzare nel presente Atto integrativo all'Accordo di Programma del 30 marzo 2010;

**RAVVISATA** quindi la necessità di procedere alla programmazione delle menzionate risorse attraverso l'individuazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da realizzare nel territorio della Regione Sicilia.

**VISTO** il verbale della riunione del 24 marzo 2011 del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del

territorio e delle Risorse Idriche, la Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente che è competente anche per la gestione dei bacini regionali e il Dipartimento della Protezione Civile hanno concordato l'individuazione degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico integrativi dell'Allegato 1 all'Accordo di programma del 30 marzo 2010, individuando gli interventi a valere sui fondi ministeriali (lettera A) e quelli di competenza regionale (lettera B);

**VISTA** la nota del Commissario straordinario delegato per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma del 30 marzo 2011 Prot. n. 371/UC del 30 marzo 2011;

**VISTA** l'integrazione al verbale della riunione del 24 marzo 2011 del Comitato di indirizzo e controllo dell'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Siciliana, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche, la Regione Siciliana, Assessorato Territorio ed Ambiente;

**VISTA** la nota del Dipartimento della Protezione Civile Prot. n. DPC/RIA/24234 del 12 aprile 2011 con la quale lo stesso Dipartimento ha preso atto che gli interventi identificati nell'ambito della menzionata riunione del 24 marzo 2011 hanno la finalità di prevenzione, mitigazione e protezione del rischio ed hanno un effettivo impatto per la tutela dell'incolumità della vita umana.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana (di seguito denominate *Parti*)

si conviene e si stipula il presente

## **ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30 MARZO 2010**

### **Articolo 1**

*(Premesse)*

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

### **Articolo 2**

*(Oggetto e finalità)*

Il presente Atto Integrativo è finalizzato all'individuazione, finanziamento ed attuazione di interventi di difesa del suolo urgenti e prioritari finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana.

### **Articolo 3**

*(Programma degli interventi)*

1. Sulla base delle disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 4, gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione Siciliana vengono elencati nell'Allegato 1 al presente Atto Integrativo, che ne costituisce parte integrante, per un importo complessivo di Euro 21.251.185,94. Tale elenco rappresenta una integrazione di quello riportato in Allegato 1 dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, registrato dalla Corte dei Conti in data 3/5/2010, Reg. n. 4 Fog. 297.

2. Gli interventi di cui al comma 1, sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa - sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria - che saranno

seguiti con le modalità di cui all'articolo 5 del citato Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010.

#### Articolo 4

*(Copertura finanziaria degli interventi)*

La copertura finanziaria del fabbisogno, pari a complessivi Euro 21.251.185,84 è analiticamente descritta nella successiva Tabella n.1, che integra l'omologa Tabella n. 1 dell'art. 4 dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010.

**Tabella 1**

	<b>FONTE</b>	<b>RISORSE</b>
MATM	Art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191	12.756.002,61
	<b>TOTALE RISORSE MATM</b>	<b>12.756.002,61</b>
REGIONE SICILIANA	Cap. 842057	8.495.183,23
	<b>TOTALE RISORSE REGIONE</b>	<b>8.495.183,23</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>21.251.185,84</b>

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare metterà a disposizione le risorse di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei tempi in cui le stesse saranno direttamente disponibili nel proprio bilancio.

#### Articolo 5

*(Disposizioni generali e finali)*

1. Il presente Atto Integrativo all'Accordo di Programma, comprendente come parti integranti e sostanziali l'Allegato 1 e l'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010, è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. Il presente Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.
3. Per quanto non riportato nel presente Atto Integrativo, si rimanda all'Accordo di Programma sottoscritto in data 30 marzo 2010.


Letto, approvato, sottoscritto.

In Roma, li 3 maggio 2011

Per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


Il Ministro

Stefania Prestigiacomo




Per la Regione Siciliana

L'Assessore del Territorio e dell'Ambiente  
Calogero Sparna



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
PACIO PERLA OPERAZIONE EURO SPAN  
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO  
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
VISTO n. 541  
Addi, 10.8.2011

IL DIRETTORE  


DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE  
SICILIANA

INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 30 MARZO 2010 FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA  
AZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  
(dati per Provincia e Comune)

N°	Cod	Provincia	Comune	Localizzazione Intervento	Titolo	Importo (Euro)
174	B	AG	Naro	Zone adiacenti la via rotabile Agrigento e tratto di strada a valle che congiunge il centro abitato alla SS 576	Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato	1.067.000,00
175	B	AG	Palma di Montechiaro	Centro urbano	Lavori di rinaturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano	1.800.000,00
176	B	CT	Sant'Alfio	Torrente Tagliaborse	Completamento consolidamento costone	1.900.000,00
177	A	ME	Braço	C.da Iannello Alto	Consolidamento e salvaguardia fabbricati	600.000,00
178	A	ME	Capri Leone	Centro abitato	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	1.000.000,00
179	A	PA	Altofonte	Centro abitato	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	600.000,00
180	A	PA	Cefalù	Località Testardita	Messa in sicurezza movimenti franosi	90.000,00
181	A	PA	Cefalù	Località Testardita - Proprietà Greco	Messa in sicurezza movimenti franosi	400.000,00
182	B	PA	Corleone	Contrada San Giovanni	Messa in sicurezza costone roccioso	1.578.183,23
183	B	PA	Pollina	Rupe San Pietro	Consolidamento	800.000,00
184	A	SR	Avola	Linea di costa di Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	2.000.000,00
185	A	SR	Buscemi	Santuario della Madonna del Mosco	Consolidamento costone sottostante il Santuario	200.000,00
186	A	SR	Porto Paio di Capo Passero	Casuzze - Scalo Mandrie	Regimazione acque e consolidamento scarpata	600.000,00
187	A	SR	Rosolini	Centro abitato	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	1.800.000,00
188	A	SR	Siracusa	Falesia compresa tra Punta Carrozza e Punta Castelluccio - 2° lotto	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	3.466.002,61
189	A	TP	Mazara del Vallo	Bacino portuale e del retrostante porto canale - Zona Foce fiume Mazzaro	1° stralcio lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	2.000.000,00
190	B	TP	San Vito lo Capo	Cala di Grottazza nel territorio comunale	Consolidamento del tratto di costa	1.350.000,00
<b>Totale</b>						<b>21.251.185,84</b>

## ALLEGATO 3





*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

II. DIRETTORE GENERALE

PROT. N. 32454/TRI/A1

14 DIC. 2010

RACCOMANDATA A/R

All'Ing. Santi Muscarà  
Via Capodieci 51  
SIRACUSA  
fax 091 581683

Al dott. Maurizio Croce  
Via San Paolo dei Disciplinanti, 10  
98122 MESSINA  
fax 06 89280585

Al Ministero infrastrutture e trasporti  
c. a. Capo di Gabinetto Dott. C. Iafolla  
ROMA  
fax 06 44267370

Alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri – Dip. della Protezione civile  
c. a. Capo del Dipartimento  
Via Ulpiano, 11  
ROMA  
fax 06 68897696

Al Presidente della Regione Siciliana  
Commissario delegato ai sensi delle  
OPCM 3815/2009 e 3865/2010  
c. a. Dott. Raffaele Lombardo  
PALERMO  
fax 091 7075199

Alla Regione Siciliana  
Assessore Territorio e Ambiente  
c. a. Dott. G. Sparma  
PALERMO  
Fax 091 7078607

**ANTICIPATA VIA FAX**

**Oggetto:** interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Siciliana.  
Notifica del DPCM del 10 dicembre 2010.

Si comunica che con DPCM del 10 dicembre u.s., trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, il dott. Maurizio Croce è stato nominato commissario straordinario, in sostituzione del dimissionario ing. Santi Muscarà (già nominato con DPCM del 16 luglio 2010), ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 195/2009 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per l'espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati dall'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, tra questo Ministero e la Regione Siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marco Lupo

MODUCARIO  
P. C. N. 127

MOD



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

su proposta  
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

VISTA la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenza nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile";



VISTO l'Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Siciliana, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in data 30 marzo 2010 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Siciliana - Assessorato del territorio e dell'ambiente;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2010 con il quale è stato nominato l'ing. Santi Muscarà commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato in premessa da effettuare nel territorio della Regione Siciliana;

VISTA la nota dell'ing. Santi Muscarà n. 650 del 24 novembre 2010 nella quale il medesimo rassegna le proprie dimissioni dall'incarico in questione per motivi familiari e di salute;

RITENUTO pertanto che sia necessario provvedere alla nomina di un nuovo commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, individuati nell'allegato 1 al suddetto Accordo di Programma, da effettuare nel territorio della Regione Siciliana;

RITENUTO che in sostituzione del dimissionario ing. Santi Muscarà possa essere nominato il dott. Maurizio Croce, in considerazione dell'alta e specifica professionalità e comprovata esperienza posseduta, requisiti indispensabili per lo svolgimento dell'incarico;

SENTITI il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della Regione Siciliana;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

## DECRETA

### ART. 1

1. Il dott. Maurizio Croce è nominato, in sostituzione dell'ing. Santi Muscarà, commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'allegato 1 all'Accordo di Programma citato in premessa da effettuare nel territorio della Regione Siciliana.

2. L'incarico ha durata triennale, prorogabile, a decorrere dalla data del presente decreto.





## ART. 2

1. Il commissario straordinario delegato attua gli interventi di cui all'articolo 1, provvede alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del citato decreto-legge n. 195 del 2009 citato in premessa e delle norme ivi richiamate.

2. Il suddetto commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data del presente decreto di nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo.

3. Il menzionato commissario, per il tramite del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presenta al Parlamento, annualmente ed al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attività.

## ART. 3

1. Il commissario è tenuto a presentare un cronoprogramma di attuazione degli interventi ai soggetti responsabili dell'Accordo di Programma di cui al comma 1 e, qualora non sia rispettato o non sia possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma medesimo, provvederà a comunicare senza indugio le circostanze del ritardo al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

## ART. 4

1. Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e degli enti da questo vigilati, di società specializzate a totale capitale pubblico, delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, dell'amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tale attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art 92 del D. lgs. n. 163 del 2009 e s.m.i. e di cui all'art 17 del D.P.R. n. 554 del 1999.

2. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal commissario straordinario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.



## ART. 5

1. Il commissario straordinario invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione trimestrale sull'attività svolta, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione delle opere.


## ART. 6

1. Con successivi provvedimenti, su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri per la determinazione e la corresponsione del compenso spettante al commissario straordinario.
2. Alla corrispondente spesa si farà fronte nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1.


Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 10 DIC 2010

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE





## ALLEGATO 4

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive flourish.



*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*  
*Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche*

## FAX

**A: Ai Commissari Straordinari Delegati per l'attuazione  
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.**

REGIONE PUGLIA  
Dott. MAURIZIO CROCE  
0802140585

**Da: Direzione Generale per la tutela del territorio e delle  
risorse idriche Div. X**

**Data: 07/12/11**

**Messaggio: D.P.C.M. 20 luglio 2011.**

**Pagg.compresa la presente.: 8**



7 DIC. 2011 Mod. 7

Roma, .....

*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio  
e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL  
TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Ai Commissari straordinari delegati  
per l'attuazione degli interventi di  
mitigazione del rischio idrogeologico  
LORO SEDI

*Indirizzo...*

*37190/GR/DI/X*

e p.c.

Alla Corte dei Conti  
Ufficio di controllo sui Ministeri istituzionali  
Via V. Talli, 141

00139 R O M A

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle risorse idriche  
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA

**OGGETTO:** D.P.C.M. 20 luglio 2011. Ulteriori disposizioni per consentire ai Commissari straordinari delegati per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.17 del d.l. 195/2009, di dotarsi di una struttura minima di supporto, nonché per accelerare le procedure tecnico amministrative connesse all'attuazione degli interventi.

Come noto alle SS.LL., sul decreto in oggetto indicato la Corte aveva formulato alcuni rilievi, a cui la Direzione aveva dato riscontro con nota del 27 ottobre 2011, n. 32745/TRI/DI .

In seguito a contatti intercorsi direttamente con la Corte , la Direzione, al fine di poter dotare quanto prima le SS.LL. dei poteri necessari ad operare con urgenza per l'attuazione degli accordi, ha inviato una nota alla Magistratura di controllo, il cui contenuto è stato condiviso informalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è stata data assicurazione che, in caso di registrazione del D.P.C.M., sarebbe rimasta inoperante la facoltà accordata con il medesimo decreto, di affidare incarichi di consulenza e che in tal senso, a registrazione avvenuta, sarebbe stata impartita specifica disposizione a tutti i Commissari straordinari.

Ora, nel comunicare che la Corte ha provveduto a registrare il provvedimento, in data 16 novembre 2011, reg. 19, fg. 243, che si allega, si segnala alle SS.LL. l'impossibilità di avvalersi della facoltà di conferire incarichi di consulenza, di cui al comma 5 dell'art. 1 del D.P.C.M. in oggetto, e la conseguente responsabilità, anche erariale, che deriverebbe dall'avvalersi della suddetta previsione.

Si coglie, infine, l'occasione per informare che la scrivente sta predisponendo apposito quesito al fine di chiarire se il disposto dell'art. 15, comma 2 e 3, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge 15.7.2011, n. 111, trovi applicazione anche nei riguardi dei Commissari delegati per l'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

Si fa riserva di ulteriori notizie al riguardo.


IL DIRETTORE GENERALE AD INTERIM  
Dr. Renato Grimaldi



Stampa  
P. C. M. 194



CODICE DEL DOCUMENTO



0020887-26/06/2011-SCCLA-Y30PREV-A

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

su proposta  
del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento per la semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili;


VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale";

VISTO, in particolare, l'articolo 20 del predetto decreto legge n. 185 del 2008 concernente, tra l'altro, l'introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

VISTA la delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato, per interventi di risanamento ambientale;

VISTA la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE, pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;


VISTO il decreto-legge 23 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile";



VISTA, altresì, la previsione contenuta in ogni singolo decreto-legge  
consente, per l'attuazione degli interventi, che i soggetti sottoscrittori si avvalgano di uno  
o più commissari straordinari di cui al sopra citato articolo 17 del predetto decreto-legge  
n. 195 del 2009;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei Piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni  
a più elevato rischio idrogeologico, è necessario assicurare, alla luce della complessità  
delle procedure nonché dei riflessi connessi alla salvaguardia delle vite umane nonché  
della sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale, una gestione  
commissariale capace di accelerarne la realizzazione, anche attraverso l'esercizio dei  
poteri previsti dall'art. 13 del decreto legge 29 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge  
23 maggio 1997, n. 135, richiamato dal già citato art. 20 del decreto legge n. 185 del  
2008;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri con i quali sono stati nominati i  
commissari straordinari per la velocizzazione delle procedure relative all'attuazione dei  
suddetti interventi, finalizzati ad agevolare la realizzazione degli interventi previsti nei  
Piani straordinari menzionati, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e di  
supporto, promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e,  
se del caso, emanando gli atti e i provvedimenti e curando tutte le attività di competenza  
delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi.





VISTO in particolare l'art. 2 dei suddetti decreti di nomina che dispone che i commissari straordinari, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, possono avvalersi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del citato decreto legge n. 195 del 2009;

VISTO il comma 4 dell'art. 20 del citato decreto legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, cui fa richiamo il summenzionato art. 17, con il quale si dispone che i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina dei commissari contengano l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare;

RITENUTO, pertanto, in ossequio al più volte citato art. 20 ed anche al fine di garantire le situazioni giuridiche soggettive dei terzi e la trasparenza dell'azione amministrativa, di dover provvedere alla suddetta specificazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo all'art. 17 del citato decreto-legge n.195 del 2009, i Commissari straordinari si configurano come soggetti attuatori degli interventi di cui ai citati Accordi di Programma;

CONSIDERATO che i citati Commissari straordinari hanno ripetutamente segnalato l'esigenza di poter disporre di una dotazione di mezzi e personale strettamente necessaria all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti;

VISTO l'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, richiamato dall'art. 4, primo comma, dei decreti di nomina dei commissari straordinari, che consente di ricomprendere soltanto le spese relative ai costi e alle attività svolte dai soggetti che ricoprono ruoli connessi con la progettazione e realizzazione delle opere;

RITENUTO, pertanto, al fine di corrispondere alle richieste dei Commissari, di dover prevedere la possibilità di sostenere ulteriori costi funzionali all'espletamento dell'incarico, quali quelli connessi all'espletamento delle funzioni di monitoraggio ed impulso richiamati dal combinato disposto degli articoli 20 del citato decreto-legge 185/2008 e art. 17 del decreto-legge 195/2009, che non rientrano nell'ambito di applicazione del sopra citato articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;

CONSIDERATO che il comma 3 del menzionato art. 20 del decreto-legge 185/2008 prevede che il commissario straordinario delegato, per l'espletamento delle attività ivi contemplate, utilizza le risorse disponibili assegnate a tal fine;

RITENUTO che si possa far fronte ai costi sopra menzionati – in una percentuale definita – a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di programma, in analogia con quanto già previsto per la corresponsione dei compensi dei citati Commissari straordinari;

RITENUTO, altresì, di dover dettare ulteriori disposizioni per accelerare lo svolgimento dei compiti dei citati Commissari straordinari;

SENTITI il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Dipartimento della protezione civile ed i Presidenti delle Regioni interessate;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

## DECRETA

### ART. 1

1. I commissari straordinari delegati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministero competente o dell'assessore competente per materia, secondo che il dissenso sia stato espresso dall'amministrazione statale o dall'amministrazione regionale e/o locale, che si pronunciano entro sette giorni dalla richiesta.
2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta ovvero in un termine complessivamente non superiore a 15 giorni in caso di richiesta motivata di proroga, e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui agli Accordi di Programma citati in premessa, i commissari straordinari delegati, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale d'immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della Regione o degli altri enti territoriali interessati.
4. I commissari straordinari, se dipendenti di Società a totale capitale pubblico e/o di Società dalle stesse controllate, anche in deroga ai Contratti collettivi nazionali di lavoro delle Società di appartenenza, sono collocati, in analogia a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di



servizio, a far data dal decreto di nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico.

5. Una quota, non superiore all'1,5 %, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi previsti nel singolo Accordo di Programma, può essere impiegata, ove ritenuto indispensabile, dai commissari straordinari per lo svolgimento di missioni, nonché per l'acquisizione di risorse necessarie al più efficace espletamento del proprio incarico, anche mediante conferimento di incarichi di consulenza, in misura comunque non superiore a tre unità, e corresponsione di un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 30 ore mensili pro capite oltre i limiti già fissati dalla vigente normativa, al personale delle Amministrazioni pubbliche e degli altri enti dei quali gli stessi possono avvalersi ai sensi dei rispettivi decreti di nomina.
6. La quota di cui al comma che precede verrà fatta gravare sui quadri economici dei singoli interventi previsti nel singolo Accordo di programma.
7. La quota di cui ai commi precedenti non incide sulla quota prevista dall'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, richiamato dall'art. 4, primo comma, dei rispettivi decreti di nomina dei commissari straordinari.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 5 OTTOBRE 2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

*Nikio Pannoni*

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

*[Signature]*

N. 335  
28.08.2011


*[Signature]*

Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI

Add. 1.6 NOV. 2011

Reg. n. 19 Fog. n. 343

*[Signature]*



## ALLEGATO 5





SR161	Avola	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da Cavagrande del Cassibile						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012	Importo Finanziato	€ 600.000,00	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 193 el 14/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 479.164,03		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	€ 600.000,00	Decreto impegno e pagamento MAV	Decreto Commissariale n. 577 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto Impegno ulteriore somma	Decreto Commissariale n. 245 del 03/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 43.418,12		
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	€ 522.807,15		
								Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	€ 0,00

<b>CONVENZIONI</b>	DRPC
--------------------	------

**Figure Tecniche**

RUP	Dott. Geol. Gaetano Marino (DRPC SR)	Decreto di Incarico	D.C. n. 169 del 16/04/2012	Supporto al RUP		Decreto di Incarico	
Progettista	DRPC SR	Ing. Davide Di Grazia	Nota di Incarico	prot. n. 45374 del 25/09/2008	Coord Sicurezza fase Progett.	Nota di Incarico	
Geologo			Determina di Incarico				
Direttore Lavori	Ing. Davide Di Grazia (DRPC SR)	Nota di Incarico	prot. n. 45374 del 25/09/2008	Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.c.ar.l.	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 661 del 03/12/2012	data contratto	11-dic-12
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	18-dic-12	data presunta di termine lavori	16-apr-13



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

SR161	Avola	Opere di consolidamento e protezione centrale idroelettrica - C.da Cavagrande del Cassibile	Importo ApQ	€ 600.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 300 del 28/09/2010, al DRPC SR che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot.n. 1223 del 25.07.2011. A seguito della verifica degli elaborati e della richiesta di apportare modifiche da parte del Commissario con nota prot.n. 1974 del 04.10.2011, il DRPC di SR ha trasmesso le integrazioni al progetto con nota acquisita al protocollo n.1063 del 29.03.2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 238 del 24/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 661 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012</p> <p>In data 18/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei lavori, la cui ultimazione, essendo stati previsti a tal fine 120 giorni naturali e consecutivi, è fissata entro il 16/04/2013</p> <p>Con nota protocollo n.1263 del 28/02/2013 Il Commissario, stante la relazione del D.L. condivisa dal RUP nella quale sono evidenziate le motivazioni correlate a sopravvenute circostanze imprevedibili e non prevedibili in fase di progettazione, si autorizza alla redazione della Perizia di Variante Suppletiva.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 193 del 14 marzo 2013 Si Impegna la somma di € 479.164,03 per la realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota protocollo 1690 del 18/03/2013 il RUP trasmette la PVS.</p> <p>con nota prot. n. 2462 del 29/04/2013 Il D.L. Ing. Davide Di Grazia convoca la Consorzio Stabile Vitruvio SCARL e per il giorno 02/05/2013 alle ore 10,00 per procedere alla formale redazione del certificato di ultimazione lavori.</p>		SAL	LAVORI ULTIMATI

SR162	Carlentini	Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti						Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 506 del 03/07/2013	Importo Finanziato	€ 763.402,88	Decreto di Impegno	Decreto n. 768 del 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 569.730,05		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 438 del 03/09/2012	Importo Finanziato	€ 36.491,85	Decreto di Impegno indagini preliminari	Decreto n. 316 del 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 24.012,06		
Decreto di Finanziamento plottaggio tavole	Decreto n. 436 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 105,27	Decreto di Impegno plottaggio tavole	Decreto n. 436 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 105,27		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 800.000,00</b>	Decreto di disimpegno	Decreto n. 316 del 07/05/2013	Importo del disimpegno	€ 229,78		
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 594.077,16</b>		
								Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	€ 0,00

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA	CGIAM
--------------------	-----------	-------

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Francesco Ingalisi	Decreto di incarico	D.C. n. 329 del 10/07/2012	Supporto al RUP	Arch. Francesco Giuseppe Fricano Ing. Gianluca Coroneo (Fino al 29/01/2013)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 361 del 17/05/2013 (revoca con Decreto Commissariale n. 329 del 10/07/2012)	
Progettista	INVITALIA	Ing. Domenico Imbroglia@ Ing. Rossella Zumbè Ing. Alberto Peligra	Nota di Incarico	prot. n.2119 del 11/06/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	INVITALIA Ing. Rossella Zumbè	Nota di Incarico	prot. n.2119 del 11/06/2012
Geologo	CGIAM (Alessio D'Urso)	Determina di Incarico	prot. n. 1342 del 20/04/2012					
Direttore Lavori	Ing. Francesco Freni	Decreto di incarico	D.C. n. 711 del 09/09/2013	Assistente al DL			Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Francesco Freni	Decreto di incarico	D.C. n. 711 del 09/09/2013					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

<b>SR162</b>	<b>Carlentini</b>	<b>Messa in sicurezza costone centro abitato – Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti</b>					Importo ApQ	<b>€ 800.000,00</b>	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 484 del 21/09/2012	<b>AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori</b>	<b>TRISCARI COSTRUZIONI S.r.l.</b>	Decreto Affidamento Lavori	<b>Decreto n. 601 del 26/07/2013</b>	data contratto	4-set-13
contratto	27/09/2012	data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

Con nota prot. N.

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La progettazione è stata inizialmente affidata al D.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 17/11/2010: non avendo avuto alcun riscontro e atteso il carattere di urgenza, il Commissario con nota prot. n.478 del 15/02/2012, ha revocato l'incarico.</p> <p>Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2012 è stata incaricata la CGIAM per la predisposizione del piano di indagini preliminari, mentre la progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 1343 del 20/04/2012, ad INVITALIA.</p> <p>Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari sono state trasmesse dalla CGIAM con nota acquisita agli atti al prot. 2875 del 25/07/2012 e sono state approvate con Decreto Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 484 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari e le indagini sono ad oggi concluse.</p> <p>La CGIAM con nota protocollo n. 486 del 23/01/2013 trasmette la relazione geologica propedeutica alla fase di progettazione.</p> <p>Con nota prot. n.2483 del 29/04/2013 la Società Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati progettuali esecutivi.</p> <p>In sede di CdS tenutasi in data 06/06/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Il RUP con le note prot. n.3948del 01/07/2013 e prot. n. 3953 del 02/07/2013 trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Triscari Costruzioni srl a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 32,0000%.</p> <p>Il Commissario invita l'aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto in data 04/09/2013.</p> <p>Con Decreto n. 768 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	SAL	<b>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</b>
------------------------	--	-----	---





SR163	Pachino	Intervento in Contrada Raneddi						Importo ApQ	2.000.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Comitato di Indirizzo e Controllo del 24/02/2011 l'intervento transita dalla lettera B alla lettera A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di finanziamento DHI Italia rilievi batimetrici	Decreto n. 208 del 10/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 35.090,00	Decreto di impegno e pagamento DHI Italia rilievi batimetrici	Decreto n. 208 del 10/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 35.090,00		
Decreto di finanziamento Università di catania DICA	Decreto n. 302 del 28/06/2012	Importo finanziato	€ 24.200,00	Decreto di impegno e pagamento Università di catania DICA	Decreto n. 302 del 28/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 24.200,00		
Decreto di finanziamento Università di Messina	Decreto n. 228 del 27/03/2013	Importo finanziato	€ 18.150,00	Decreto di impegno e pagamento Università di Messina	Decreto n. 228 del 27/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 18.150,00		
Decreto di Finanziamento polizze assicurative per le attività dei R. U.P. e per le verifiche della progettazione	Decreto n. 326 del 08/05/2013	Importo finanziato	€ 631,10	Decreto di impegno e pagamento polizze assicurative per le attività dei R. U.P. e per le verifiche della progettazione	Decreto n. 326 del 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 631,10		
Decreto di Finanziamento plottaggio tavole	Decreto n. 437 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 893,71	Decreto di Impegno plottaggio tavole	Decreto n. 437 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 893,71		
Decreto di Finanziamento avviso procedura VIA	Decreto n. 730 del 12/09/2013	Importo Finanziato	€ 1.234,20	Decreto di impegno e pagamento avviso procedura VIA	Decreto n. 730 del 12/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.234,20		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	€ <b>80.199,01</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	€ <b>80.199,01</b>		
								Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	€ 0,00

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA	Università degli Studi Catania	Università degli Studi Messina	Università degli Studi Palermo	DHI Italia	CNR	
--------------------	-----------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------	-----	--

Figure Tecniche							
	Dott. Giuseppe Lombardo	Nota di incarico	Decreto n. 74 del 01/02/2013	Supporto al RUP	Dott. Gaetano Vinci	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 78 del 31 maggio 2011



<b>SR163</b>	<b>Pachino</b>	<b>Intervento in Contrada Raneddi</b>						Importo ApQ	<b>2.000.000,00</b>
<b>RUP</b>	Ing. Marco Calogero Dott. Maurizio Liberatore		Nota di incarico	D.C. n. 29 del 23 gennaio 2012 (revoca con D.C. n. 74 del 01/02/2013) - D.C. n.78 del 31 maggio 2011 (revoca con D.C. n. 29 del 23 gennaio 2012)	Supporto alla Progettazione		Ing. Pietro Viviano	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 235 del 20/09/2011
<b>Progettista</b>	INVITALIA	Imbroglia © Peligra Pulizzi	Nota di Incarico	Prot. N. 621 del 03/05/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	INVITALIA	Imbroglia © Peligra Pulizzi	Nota di Incarico	Prot. N. 621 del 03/05/2011
<b>Geologo</b>	INVITALIA	Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Nota di Incarico	Prot. N. 621 del 03/05/2011					
<b>Direttore Lavori</b>			Nota di Incarico		Assistente al DL			Nota di Incarico	
<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>			Nota di Incarico						
<b>Collaudatore Statico</b>			Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico	

<b>INDAGINI preliminari affidate a:</b>	Decreto di affidamento INDAGINI		<b>AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori</b>	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
<b>contratto</b>	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La progettazione è stata affidata a INVITALIA, mentre con Decreto n. 121 del 23/03/2012 sono state approvate convenzioni e contratti con le università di Catania, Messina, Palermo e con la DHI Italia.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2793 del 6/12/2011 il DICA ha trasmesso la relazione su "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini", l'Università di Messina con nota acquisita al prot. n. 303 del 01/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Analisi diacronica delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra Punta Castellazzo e Punta delle Formiche", la DHI Italia acquisita al prot 363 del 07/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Acquisizione e processamento dei dati del modello d'onda Mar Mediterraneo di MeP Office per tre celle situate a largo della costa Sud- Orientale della Sicilia".</p> <p>Con Decreto n. 194 del 26/04/2012 è stata approvata la convenzione con CNR per la "ricerca, l'individuazione e caratterizzazione di cave di sabbie relitte sulla piattaforma siciliana nell'area prospiciente il golfo di Gela" e con Decreto Commissariale n. 408 del 02 Agosto 2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 19/04/2012.</p> <p>Con nota protocollo n. 3925 del 08/10/2012 il CNR ha trasmesso il Rapporto Tecnico Finale delle attività relative alla Convenzione del 30/03/2012.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4085 del 16/10/2012, ha trasmesso al Commissario gli elaborati relativi alle tre nuove ipotesi d'intervento.</p> <p>Con nota protocollo n. 5026 del 29/11/2012 il Commissario ha chiesto all'ARPA - DAP di Ragusa la trasmissione dei risultati della caratterizzazione dei sedimenti portuali da esso effettuati nel porto di Pozzallo, a supporto delle scelte progettuali che dovranno essere definite dai tecnici incaricati dal Commissario.</p> <p>Con nota protocollo n. 1355 del 05/03/2013 Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati progettuali esecutivi.</p> <p>Con nota protocollo n. 2739 del 13 maggio 2013 il Commissario convoca per il giorno 21/05/2013 alle ore 11,00 una Conferenza dei Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi di giorno 21/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri di assenso per la realizzazione dell'intervento fatta eccezione per l'ARTA Serv. 3, peraltro, l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS ritiene necessario che il progetto venga sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale.</p> <p>Con nota prot. n. 3504 del 12/06/2013 l'ARTA Serv. 3 trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni.</p>	SAL	<b>PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</b>
------------------------	--	-----	---



<b>SR165</b>	<b>Portopalo di Capo Passero</b>	<b>Ripristino e stabilizzazione scarpate - ripristino e protezione litorale – Zona C.da Casuzze-Scalo mandrie</b>						Importo ApQ	<b>€ 800.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	

**Figure Tecniche**

<b>RUP</b>	Geom. Mario Poidomani (Comune)	Decreto di incarico	D.C. n. 147 del 02/04/2012	<b>Supporto al RUP</b>	Arch. Giampiero Di Magro	Nota di Incarico	D.C. n.300 del 27-06-2012	
<b>Progettista</b>	COMUNE	Ing. Antonio Lanza	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n. 3/70 del 06/03/2012	<b>Coord Sicurezza fase Progett.</b>	Ing. Antonio Lanza	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n. 3/70 del 06/03/2012
<b>Geologo</b>	Dott. Geol. Corrado Avarino	Determina di Incarico	Determina Dirigenziale n. 27/376 del 16/11/2010					
<b>Direttore Lavori</b>		Nota di Incarico		<b>Assistente al DL</b>		Nota di Incarico		
<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>		Nota di Incarico						
<b>Collaudatore Statico</b>		Decreto di Incarico		<b>Collaudatore Tecnico amministrativo</b>		Nota di Incarico		

<b>INDAGINI preliminari affidate a:</b>		Decreto di affidamento INDAGINI		<b>AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori</b>	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
<b>contratto</b>		data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p><i>La progettazione è stata affidata al Comune di Portopalo di Capo Passero. Si è in attesa del progetto esecutivo in quanto necessita della Verifica di assoggettabilità alla VIA presso il Servizio 1 VIA-VAS dell'ARTA, per cui il comune ha già avviato la procedura di verifica. Il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv 1 VIA/VAS con nota prot. n. 3466 del 12/09/2012. Il Commissario convoca gli enti in indirizzo per il tavolo tecnico del 30/10/2012. L'ARTA Serv. 1 comunica al Comune l'attivazione della procedura di danno ambientale ai sensi dell'art. 29 del d.Lgs. 152/2006, pertanto dispone la demolizione di quanto realizzato ed il ripristino dei luoghi.</i></p>					<b>SAL</b>	<b>PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</b>
------------------------	---	--	--	--	--	------------	---



<b>SR166</b>	<b>Rosolini</b>	<b>Opere di consolidamento del centro abitato</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.500.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	€ 1.500.000,00	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Giovanni Calabrese (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 687 del 11/12/2012	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 687 del 11/12/2012
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	-

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso il progetto e la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto al Commissario invitando il Comune di Rosolini a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.</p> <p>Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP ha comunicato che tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto è stata consegnata all'Ufficio del Commissario in data 08/08/2012.</p> <p>Con nota acquisita al protocollo n. 2614 del 07/05/2013 Il RUP Arch. Giovanni Calabrese trasmette il parere favorevole del GC di Siracusa</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6439 del 28/10/2013 il RUP trasmette la documentazione integrativa richiesta ai fini dell'approvazione del progetto.</p>	SAL	<p>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
------------------------	--	-----	---



SR167	Rosolini	Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 427 del 22/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.315.000,00	Decreto di Impegno	n. 653 del 28/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 975.912,96		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 1.315.000,00</b>	Decreto di Impegno e pagamento spese di pubblicazione GURI	Decreto n. 555 del 23/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 979,11	Economie da finanziamento	
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	€ 976.892,07		
								Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>


**Figure Tecniche**

RUP	Geom. Vindigni Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n.225 del 16/05/2012	Supporto al RUP	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 30/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D.C. n.225 del 16/05/2012	
Progettista	COMUNE Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012	
Geologo		Determina di Incarico						
Direttore Lavori	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n.4 del 24/01/2012	Assistente al DL	Arch. Giuseppe Calvo	Nota di Incarico	Nota di accettazione prot. N. 33731 del 30/10/2012	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Giuseppe Calvo	Nota di Incarico	prot. n. 33731 del 30/10/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Francesco Tabacco	Decreto di Incarico	D.C. n. 100 del 18/02/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Francesco Tabacco	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 100 del 18/02/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Unifica Soc Coop.	Decreto Affidamento Lavori	D.C. 534 del 15/10/2012	data contratto
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	19-dic-12	data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




SR167	Rosolini	<b>Consolidamento versante e sistemazione idraulica – Zona vallone Ristallo-Masicugno</b>	Importo ApQ	€ 1.500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p><i>La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita agli atti al prot. n. 657 del 12/05/2011 ha trasmesso il progetto esecutivo.</i></p> <p><i>Il Commissario con nota prot n. 2796 del 6 /12/2011 ha chiesto alcuni chiarimenti al Comune e rappresentato la mancanza di alcuni pareri necessari all'approvazione e finanziamento progetto nonché della comunicazione del RUP relativa ai vincoli presenti sull'area oggetto dell'intervento.</i></p> <p><i>In sede di Conferenza dei Servizi del 16/05/2012, e nei giorni successivi, sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni utili per l'approvazione dell'intervento, tra cui il parere del GC di SR che ha chiesto integrazioni per poter esprimersi.</i></p> <p><i>Le integrazioni sono state trasmesse dal Comune con note acquisite ai prot. n. 1947 del 31/05/2012 e n. 2176 del 14/06/2012.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 427 del 22/08/2012 è stato finanziato del progetto esecutivo dell'intervento.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</i></p> <p><i>In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori</i></p> <p><i>Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg data all'Impresa Unifica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.</i></p>		SAL	AVVIATI LAVORI  

SR177	Carlentini	Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)					Importo ApQ	2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 MAR 2011 COMITATO 15 SET 2011	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 247 del 28/05/2012	Importo Finanziato	€ 2.500.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 307 del 06/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.047.454,02	
				Decreto di impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	Decreto n. 307 del 29/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.027,47	
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione Publikompass Spa e A. Manzoni & C. Spa	Decreto n. 415 del 08/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 3.820,58	
				Decreto di impegno e pagamento spese pubblicazione GURI esito gara	Decreto n. 435 del 03/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 895,23	
				Decreto impegno e pagamento MAV	Decreto Commissariale n. 577 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00	
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 2.047.454,02</b>	
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Francesco Ingalisi	Nota di Incarico	D.C. n. 191 del 26/04/2012	Supporto al RUP	Ing. Diego Li Calzi	Nota di Incarico	D.C. n. 191 del 26/04/2012
Progettista	COMUNE Geom. Santi di Stefano Geom. Francesco Incontro	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 70 del 18/11/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Arch. Daniele Lentini	Determina di incarico	Determina Sindacale n.1 del 23/01/2012
Geologo	Dott. Geol. Salvatore Antonio Sciara	Determina di incarico	Determina Sindacale n. 70 del 18/11/2011				
Direttore Lavori	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Incarico	D.C. n. 637 del 22/11/2012	Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonio Lanza	Decreto di Incarico	D.C. n. 637 del 22/11/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Gaetano Montana	Decreto di Incarico	D.C. n. 108 del 20/02/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Gaetano Montana	Nota di Incarico	D.C. n. 108 del 20/02/2013

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 429 23/08/2012	data contratto	26-set-12
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	



SR177	Carlentini	<b>Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)</b>	Importo ApQ	<b>2.500.000,00</b>
STATO DELL'ARTE	<p><i>La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 459 del 11/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 1511 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso variazioni tecniche ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico dell'area oggetto di intervento.</i></p> <p><i>A seguito dell'accoglimento dell'istanza di variante tecnica nel corso del comitato del 15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 1823 del 21 set 2011, ha autorizzato il comune a procedere alle modifiche progettuali richieste.</i></p> <p><i>Con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo rivisitato. In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 247 del 28/05/2012.</i></p> <p><i>Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori; il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 307 del 06/05/2013 si impegna la somma di € 2.047.454,02 per la realizzazione dell'intervento.</i></p> <p><i>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/05/2013.</i></p>		SAL	<p>AVVIATI LAVORI</p> 





UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

SR184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa						Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento e Impegno acquisizione progettata. Esecut.	n. 268 del 10/04/2013	Importo Finanziato	€ 35.156,27	Decreto di Finanziamento e Impegno acquisizione progettata. Esecut.	n. 268 del 10/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 35.156,27	Economie da finanziamento	
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	n. 509 del 04/07/2013	Importo Finanziato	€ 44.492,23						
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 79.648,50</b>			<b>TOTALE IMPEGNATI</b>	<b>€ 35.156,27</b>		
								Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>


Figure Tecniche

RUP	Arch. Gaetano Brex (Dirigente Area 4 del Comune di Avola)	Decreto di Incarico	D.C. n. 358 del 17/07/2012	Supporto al RUP	Geom. Romina Sparacino	Decreto di Incarico	D.C. n. 358 del 17/07/2012
Progettista	COMUNE	Nota di Incarico	prot. n. 231 del 25/01/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico	
Geologo		Determina di Incarico					
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Geomerid srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 597 del 25/07/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

SR184	Avola	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p><i>L'intervento è inserito dell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il quale, con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011, è stato invitato a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni.</i></p> <p><i>Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 231 del 25/01/2012, ha rappresentato di essere in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, per un importo pari a 2.000.000,00.</i></p> <p><i>Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5313 del 12/12/2012, ha convocato un tavolo tecnico l'08/01/2013.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 268 del 10/04/2013 viene disposto il finanziamento e impegno per l'acquisizione del progetto esecutivo 1° stralcio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 597 del 25/07/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari a favore della Geomerid srl a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 40,2000%. In data 01/08/2013 è prevista la stipula del contratto.</i></p>		SAL	INDAGINI PRELIMINARI IN CORSO  

<b>SR185</b>	<b>Buscemi</b>	<b>Consolidamento costone sottostante il Santuario</b>						Importo ApQ	<b>€ 200.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>AdP Integrativo</b>	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n.319 del 09/07/2012	Importo Finanziato	€ 200.000,00	Decreto di Impegno	n. 566 del 30/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 162.190,54		
						<b>TOTALE IMPEGNATI</b>	<b>€ 162.190,54</b>		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	

<b>CONVENZIONI</b>
--------------------

**Figure Tecniche**


<b>RUP</b>	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di incarico	D.C. n. 176 del 19/04/2012	<b>Supporto al RUP</b>	Ing. Giovanni Donetti	Nota di Incarico	D.C. n. 176 del 19/04/2012
<b>Progettista</b>	COMUNE	Nota di incarico	prot. n.2888 del 15/12/2011	<b>Coord Sicurezza fase Progett.</b>	Arch. Aldo Aprile	Nota di Incarico	Determina Dirigenziale n. 24 del 05/03/2012
<b>Geologo</b>	Dott. Geol. Giuseppe Peluso	Determina di incarico	Determina Dirigenziale n. 198 del 28/12/2011	<b>Geologo</b>		Nota di Incarico	convenzione CGIAM
<b>Direttore Lavori</b>	Ing. Giovanni Donetti	Nota di Incarico	prot. n. 4144 del 18/10/2012	<b>Assistente al DL</b>		Nota di Incarico	
<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>	Arch. Aldo Aprile	Nota di Incarico	D.C. n. 535 del 15/10/2012	<b>Direttore Operativo</b>	Arch. Aldo Aprile	Decreto di Incarico	D.C. n. 535 del 15/10/2012
<b>Collaudatore Statico</b>	Ing. Salvatore Bordonaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 28 del 16/01/2013	<b>Collaudatore Tecnico amministrativo</b>	Ing. Salvatore Bordonaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 28 del 16/01/2013

<b>INDAGINI preliminari affidate a:</b>	Decreto di affidamento INDAGINI		<b>AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori</b>	<b>TECNO COSTRUZIONI S.r.l.</b>	Decreto Affidamento Lavori	<b>Decreto Commissariale n. 449 del 07/09/2012</b>	data contratto	26-set-12
<b>contratto</b>	data conclusione lavori				verbale inizio attività	<b>23-ott-12</b>	data di fine lavori	29-gen-13



**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”*  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



SR185	Buscemi	<b>Consolidamento costone sottostante il Santuario</b>	Importo ApQ	€ 200.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La Progettazione è stata affidata al Comune.</p> <p>L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento. Tali rilievi sono stati trasmessi dalla CGIAM con nota acquisita al prot. n. 498 del 16/02/2012. Il Comune, con nota acquisita al prot. n.1263 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi del 26/04/2012 sono stati acquisiti gli assensi da parte degli enti interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2308 del 25/06/2012 ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo. Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca dell'incarico conferito per SR 185 .</p> <p>Con Decreto n. 319 del 09/07/2012 è stato finanziato il progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 449 del 07 09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 23/10/2012 e l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 29/01/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013 si provvede alla Presa d'Atto della Perizia di Variante e Suppletiva e rimodulazione impegno.</p>		SAL	LAVORI ULTIMATI  

SR186	Portopalo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 498 del 28/06/2013	Importo Finanziato	€ 397.797,49	Decreto di Impegno	n. 908 del 28/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 319.038,58		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 452 del 11/09/2012	Importo Finanziato	€ 18.028,15	Decreto di Impegno e Pagamento indagini Preliminari	Decreto n. 92 del 08/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 11.786,20		
Decreto di finanziamento plottaggio tavole di progetto	Decreto n. 438 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 248,29	Decreto di impegno plottaggio tavole di progetto	Decreto n. 438 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 248,29		
Decreto di definanziamento differenza tra il D.C n.452 e il D.C. n. 92	Decreto n. 498 del 28/06/2013	Importo Definanziato	€ 6.241,95	Decreto di impegno e pagamento plottaggio elaborati	Decreto n. 539 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 38,30		
Decreto di finanziamento plottaggio elaborati	Decreto n. 539 del 10/07/2013	Importo Finanziato	€ 38,30	Decreto di impegno e pagamento commissione gara	Decreto n. 641 del 05/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.774,66		
				Decreto di impegno e pagamento commissione gara	Decreto n. 812 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.334,20		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 409.870,28</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 334.220,23</b>		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	

<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA
--------------------	-------	-----------

**Figure Tecniche**

RUP	Geom. Mario Poidomani	Decreto di incarico	D.C. n.313 del 06/07/2012	Supporto al RUP	Arch. Giampiero Di Magro	Decreto di Incarico	D.C. n.313 del 06/07/2012
Progettista	INVITALIA	Ing. Domenico Imbroglia© Ing. Alberto Peligra Ing. Rossella Zumbè	Nota di Incarico	prot. n. 533 del 20/02/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Alberto Peligra	Decreto di incarico D.C. n. 853 del 11/10/2013
Geologo	INVITALIA CGIAM	Dott. Geol. Gianluca Sabatini Dott. Geol. Alessio D'urso	Determina di Incarico	convenzione CGIAM			
Direttore Lavori	Ing. Alberto Peligra	Decreto di incarico	D.C. n. 853 del 11/10/2013	Assistente al DL			Nota di Incarico
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Alberto Peligra	Decreto di incarico	D.C. n. 853 del 11/10/2013				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 511 del 04/10/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	PULLARA CALOGERO	Decreto Affidamento Lavori	n. 595 del 24/07/2013	data contratto	24-set-13
contratto	09/10/2012	data conclusione lavori				verbale inizio attività	05-nov-13	data presunta di termine lavori	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

SR186	Portopalo di Capo Passero	Regimazione acque e consolidamento scarpata	Importo ApQ	€ 600.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 553 del 20/02/2012. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata. La CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha trasmesso la restituzione parziale degli elaborati Con nota acquisita al protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM, a seguito della presa d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini.</p> <p>Il RUP, con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012, ha trasmesso la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvate e finanziate con Decreto n. 452 del 11/09/2012.</p> <p>Con Decreto n. 511 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto il contratto.</p> <p>I risultati delle indagini eseguite sono state acquisite al prot. n. 4362 del 26/10/2012.</p> <p>Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali esecutivi.</p> <p>Con nota protocollo n. 3018 del 21 maggio 2013 il Commissario trasmette il verbale della CdS tenutasi in data 21/05/2013 e rimane in attesa delle integrazioni da parte dei progettisti e del parere della Provincia Regionale di Siracusa Serv. VIII e della Soprintendenza entro e non oltre 7gg dalla presente.</p> <p>Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla Provincia e resta in attesa di valutazioni.</p> <p>A seguito della nota della Provincia Regionale Serv.VIII nella quale si reiterava il parere già espresso in precedenza, il GdL di Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette gli elaborati progettuali integrativi stralciati della parte idraulica, al fine di superare le prescrizioni del sopracitato servizio.</p> <p>Con nota prot. n. 3800 del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 498 del 28/06/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 397.797,49. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 595 del 24/07/20123 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Pullara Calogero che ha offerto un ribasso pari al 31,2727%. In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 908 del 28/10/2013 sono state impegnate le somme</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 6484 del 29/11/2013 invita l'Impresa ed il DL per il giorno 05 Novembre 2013 alle ore 10,00 per procedere alla formale consegna dei lavori.</p> <p>Con nota prot. n. 6778 del 12/11/2013 il Commissario invita il RUP a sospendere ulteriori attività propedeutiche all'inizio dei lavori, nelle more dell'acquisizione di comunicazione da parte della Prefettura di Palermo.</p>		SAL	AVVIATI I LAVORI


<b>SR187</b>	<b>Rosolini</b>	<b>Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.800.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>AdP Integrativo</b>	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 434 del 31/08/2012		€ 38.614,00						
Decreto di Finanziamento intervento	Decreto n. 867 del 18/10/2013		€ 1.800.000,00						
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 1.800.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 0,00</b>		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	

<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM
--------------------	-------

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Giuseppe Vindigni	Decreto di incarico	D.C. n. 198 del 02/05/2012	Supporto al RUP	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 30/01/2013)	Decreto di Incarico	D.C. n. 198 del 02/05/2012
Progettista	COMUNE	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	determina n. 3 del 24/01/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso (CGIAM)	Determina di Incarico	convenzione CGIAM				
Direttore Lavori	Ing. Corrado Mingo	Nota di Incarico	determina n. 3 del 24/01/2012	Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 485 del 21/09/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
contratto	26/09/2012	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori



SR187	Rosolini	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	Importo ApQ	€ 1.800.000,00
<p>STATO DELL'ARTE</p>		<p>La progettazione è stata affidata al Comune.</p> <p>Con nota prot. n. 130 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definire la progettazione esecutiva aveva necessità di avvalersi di consulenze specifiche (indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, coordinamento della sicurezza) e ha chiesto autorizzazione.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 169 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già incaricato la CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il conferimento delle altre consulenza specifiche richieste.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 485 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 31/10/2012 l'impresa ha trasmesso il verbale di consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura dei sottoservizi già richiesta al comune.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4506 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato di non essere ancora in possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la <b>sospensione dei lavori</b>.</p> <p>A seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 5135 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.</p> <p>Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.</p> <p>L'ARTA Serv.3. con nota prot. n. 5172 del 03/09/2013 trasmette il proprio parere favorevole, precisando che in futuro per un eventuale aggiornamento delle aree si richiederà un adeguato studio idraulico.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 6244 del 16/10/2013 trasmette il Verbale di Verifica e Validazione del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 1.800.000,00.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 897 del 24/10/2013 si approva lo schema lettera di invito e avvio della Procedura di gara.</p>	<p>SAL</p>	<p>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</p> 






RG158_1	Modica	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato						Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato		
					COMITATO 24 MAR				
Decreto di Finanziamento acquisizione progettazione	Decreto n. 190 del 14/03/2013	Importo Finanziato	€ 86.920,77	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto integrazione al Finanziamento acquisizione progettazione	Decreto n. 300 del 19/04/2013	Importo Finanziato	€ 22.950,48					Economie da finanziamento	
			€ 109.871,25					Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche							
RUP		Incarico conferito tramite:		Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2369 del 27/06/2012 l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso al Commissario in quanto Ente Beneficiario tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.</p> <p>Il Comune con nota acquisita al prot. n. 4298 del 24/10/2012 ha trasmesso gli elaborati progettuali.</p> <p>Il Commissario convoca una riunione presso gli Uffici della Struttura Commissariale per il giorno 26/03/2013 alle ore 16,00, al fine di discutere su alcune criticità emerse in merito al progetto.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 23/05/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 5733 del 25/09/2013 l'Artec Associati trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo validato e verificato.</p>	SAL	<p>ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE</p> 
-----------------	---	-----	---



<b>RG159</b>	<b>Modica</b>	<b>Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S.Liberale</b>						Importo ApQ	<b>€ 800.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	€ 800.000,00	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	


<b>CONVENZIONI</b>	GC	CGIAM
--------------------	----	-------

**Figure Tecniche**

RUP	-	Nota di incarico		Supporto al RUP		Nota di Incarico	
Progettista	GC RG	Nota di Incarico	nota prot. N. 465 del 27/10/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico	
Geologo		Determina di Incarico					
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	



RG159	Modica	Opere di sistemazione idraulica e dei versanti – Zona Torrente S.Liberale	Importo ApQ	€ 800.000,00
STATO DELL'ARTE	<p><i>Il Commissario ha rappresentato al Comitato di Indirizzo e Controllo del 15 /09/2011 le problematiche legate alle scelte progettuali indicate dal GC, evidenziando che l'intervento NON E' RISOLUTIVO per l'intera problematica.</i></p> <p><i>A seguito del Tavolo Tecnico del 26/09/2011 si rimane in attesa di ricevere uno stralcio del progetto di importo pari a quello dell'Adp per la valutazione e approvazione da parte del Comitato.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n.20 del 09/01/2012, il GC di Ragusa ha comunicato che l'intervento risultava ancora in fase di progettazione.</i></p> <p><i>In data 11/04/2012 si è tenuta una riunione presso gli Uffici dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS, dalla quale sono emerse delle problematiche di carattere ambientale per cui si è ritenuto necessario procedere ad una rielaborazione delle scelte progettuali.</i></p> <p><i>Il GC di Ragusa ha trasmesso con nota prot. n. 5348 del 14/12/2012 la rappresentazione tecnica dell'idea progettuale, chiedendo l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi al fine di definirne la fattibilità.</i></p> <p><i>In data 10 /01/ 2013 si è tenuta una Conferenza dei Servizi Preliminare, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</i></p> <p><i>Con nota prot. n. 5767 del 26/09/2013 il Commissario incarica la Società Invitalia allo sviluppo di tutte le attività di progettazione per la realizzazione dell'intervento.</i></p> <p><i>Con nota prot. n. 5941 del 04/10/2013, il Commissario comunica alla CGIAM l'integrazione all'elenco allegato al Piano Esecutivo del 30.11.2011, tramite l'inserimento dell'intervento RG 159 Modica " Opere di sistemazione idraulica e dei versanti - Zona Torrente S. Liberale". Importo 800.000,00"</i></p>		SAL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO  



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1




<b>PA136</b>	<b>Belmonte Mezzagno</b>	<b>Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano</b>						Importo ApQ	€ <b>3.000.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 24 FEB 2011</b> <b>COMITATO 24 MAR 2011</b>	note:	Comitato del 24 febbraio 2011: l'intervento passa alla lettera B Comitato del 24 marzo 2011: transita nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento indagini	n.460 del 18/06/2013	Importo Finanziato	€ 10.947,60	Decreto di Impegno	n.460 del 18/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 10.947,60		
								Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	DRPC								
--------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

<b>RUP</b>	Ing. Angelo Alferi (DRPC PA)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n.42 del 22/01/2013	<b>Supporto al RUP</b>	Sig.ra Teresa Marano (DRPC)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n.42 del 22/01/2013
<b>Progettista</b>	DRPC PA	Nota di Incarico	prot. n.694/UC del 24/11/2010	<b>Coord Sicurezza fase Progett.</b>		Nota di Incarico	
<b>Geologo</b>		Determina di Incarico					
<b>Direttore Lavori</b>		Nota di Incarico		<b>Assistente al DL</b>		Nota di Incarico	
<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>		Nota di Incarico					
<b>Collaudatore Statico</b>		Decreto di Incarico		<b>Collaudatore Tecnico amministrativo</b>		Nota di Incarico	

<b>INDAGINI preliminari affidate a:</b>	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013	<b>AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori</b>	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
<b>contratto</b>	05/06/2013	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di Palermo con nota prot. n. 694 del 24/11/2010. A seguito della nota del Commissario prot. n. 3298 del 03/09/2012, con cui sollecitava il DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo, con nota acquisita al prot. n. 5511 del 21/12/2012 il RUP trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 07/02/2013 si resta in attesa dei pareri non ancora pervenuti.</p> <p>Con nota prot. n. 1869 del 27/03/2013 il Commissario sollecita l'ARTA Serv.1 al rilascio del parere di competenza</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva inerente il Piano di indagini Preliminari a favore della Geo Services Trivellazioni e Sondaggi srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 43,1999%.</p> <p>Con D.C. n. 460 del 18/06/2013 si è provveduto a finanziare ed impegnare le somme necessarie per la realizzazione del piano di indagini.</p> <p>In data 30/07/2013, con nota prot.n. 4616, l'aggiudicataria delle indagini trasmette alla Struttura Commissariale i risultati delle stesse.</p>	SAL	<p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO</p> 
------------------------	--	-----	---



PA137_1	Blufi	Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento del centro urbano					Importo ApQ	€ 1.310.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'intervento originario di € 2.000.000,00 "consolidamento del Centro Urbano" viene, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato 24 febbraio 2011, stralciato in due progetti	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento	n. 67 del 24/05/2011	Importo Finanziato	€ 1.310.000,00	Decreto di Impegno	n. 348 del 30/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.067.015,52	
				Decreto di Impegno pagamento GURI	n.193 del 10/08/2011	Importo dell'Impegno	€ 991,76	
				Decreto di Impegno pagamento GURI	n.304 del 04/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.104,91	
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	n.312 del 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 375,00	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.310.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.069.487,19</b>	
								Economie da finanziamento € -
								Economie da ribasso

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di incarico	D.C. n.25 del 23/02/2011	Supporto al RUP	Geom G. Ferrante Geom P.Nicollicchia Dott. F. Barranco	Decreto di incarico	D.C. n.25 del 23/02/2011		
Progettista	Comune	Arch. Vincenzo Vaccarella (Resp area tecnica)	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.01 del 11/01/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Comune	Arch. Vincenzo Vaccarella (Resp area tecnica)	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.01 del 11/01/2011
Geologo	Dott. Giuseppe Abbate	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.4 del 10/02/2011	Geotecnico	Ing. Michele Zafonti	Determina di Incarico	Determina Sindacale n.3 del 10/02/2011		
Direttore Lavori	Ing Michele Zafonti	Decreto di incarico	D.C. n. 208 del 31/08/2011	Assistente al DL		Nota di Incarico			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing Michele Zafonti	Decreto di incarico	D.C. n. 208 del 31/08/2011						
Collaudatore Statico	Arch. Laura Oieni	Decreto di incarico	D. C. n. 193 del 26.04.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Arch. Laura Oieni	Decreto di incarico	D. C. n. 193 del 26.04.2012		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.300 del 27/10/2011	data contratto	15-nov-11
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	06-dic-11	data fine lavori	31-ott-12

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011.</p> <p>A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI; La consegna dei lavori è avvenuta il 06/12/2011.</p> <p>A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.1934 del 31/05/2012, la stessa DL ha trasmesso la perizia assunta al prot. n. 2863 del 24/07/2012 ed approvata dal RUP in data 29/08/2012</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e della rimodulazione del quadro economico di impegno delle somme.</p> <p>I lavori sono ultimati in data 31/10/2012.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	-----	-----------------



PA137_2	Blufi	Opere di consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli						Importo ApQ	€ 690.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'intervento originario di € 2.000.000,00 "consolidamento del Centro Urbano" viene, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato 24 febbraio 2011, stralciato in due progetti	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 87 del 10/6/2011	Importo Finanziato	€ 690.000,00	Decreto di Impegno	n.246 del 28/09/2011 così come modificato dal Decreto n. 146 del 2/04/2012 di presa atto PVS e rimodulazione QE	Importo dell'Impegno	€ 558.878,57		
								Economie da finanziamento	€ -
								Economie da ribasso	€ 131.121,43

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Giuseppe La Placa		Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 24 del 23/02/2011	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicollicchia		Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 24 del 23/02/2011
Progettista	Comune	Arch. Vincenzo Vaccarella (responsabile area tecnica)	Determina di Incarico	Determina sindacale n.2 del 11/01/2011	Coord Sicurezza fase Progett.			Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Giuseppe Abbate		Determina di Incarico	Determina sindacale n.6 del 14/02/2011	Geotecnico	Ing. Michele Zafonti		Determina di Incarico	Determina sindacale n.6 del 14/02/2011
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti		Decreto di incarico	D.C. n.207 del 31/08/2011	Assistente al DL			Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Michele Zafonti		Decreto di incarico	D.C. n.207 del 31/08/2011					
Collaudatore Statico	Prof. Angelo Milone		Decreto di Incarico	D.C. n. 355 del 02/12/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Arcobaleno 3000 Srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.158 del 29/07/2011	data contratto	10-ago-11
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	7-set-11	fine lavori	29-mar-12

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011.</p> <p>A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 87 del 10/06/2011</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 29/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori avviati in data 07/09/2011.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.493 del 16 /02/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è stata autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 20/02/2012.</p> <p>La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 843 del 15/03/2012, approvata dal RUP in data 19 /03/2012 e ratificata dal Commissario con Decreto n. 146 del 02/04/2012.</p> <p>I lavori sono ultimati in data 29/03/2012.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	-----	-----------------

<b>PA140</b>	<b>Camporeale</b>	<b>Opere di consolidamento centro abitato</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.500.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 15 SETT 2011	note:	A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 15/09/2011 l'intervento transita in B	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche								
RUP	Ing. Manlio Munafo (GC Pa)	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 139260 del 17/04/2013	Supporto al RUP	Arch. Giovanni Lo Cascio	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	
Progettista	Ing. Giuseppe Nogara GC Pa	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Dott. Geol. Claudio Venturella	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	Collaboratore Tecnico alla Progettazione	Geom. Marco Imburgia	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Collaboratore amministrativo alla progettazione	Sig. Francesco Sunseri	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 154196 del 02/05/2013	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL				
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ARTA Serv. 3 comunica che l'Ufficio del Commissario è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento</p> <p>Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie del progetto esecutivo</p> <p>A seguito del tavolo tecnico si resta in attesa che il Comune proceda a richiedere l'ampliamento dell'aera PAI.</p>	SAL	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	-----	------------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA141	Capaci	Consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 410 del 02/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.200.000,00	Decreto di Impegno	n. 179 del 11/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 944.262,41		
				Decreto di Impegno e pagamento progettazione geotecnica	n. 523 del 08/10/12	Importo dell'Impegno	€ 25.554,04		
				Impegno e pagamento spese di pubblicazione sulla GURI	n. 537 del 16/10/12	Importo dell'Impegno	€ 979,11		
				Impegno e pagamento spese di pubblicazione Publikompass Spa, Gruppo 24Ore Spa	n.724 del 20/12/12	Importo dell'Impegno	€ 1.861,89		
				Impegno e pagamento espletamento dei servizi tecnico-amministrativi	n. 102 del 18/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 4.751,67		
Finanziamento polizze assicurative attività di RUP	n. 829 del 08/10/2013	Importo Finanziato	€ 522,75	Impegno polizze assicurative attività di RUP	n. 829 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 522,75		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.200.522,75</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 977.931,87</b>		
								Economi da finanziamento	
								Economie da ribasso	


Figure Tecniche

RUP	Ing. Giuseppe Lo Iacono	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.131 del 22/02/2013	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 347 del 11/07/2012	
Progettista	Dott Ing Carlo Barbuza (fig. esterna)	Delibera di Incarico	Giunta Municipale n.376 del 26-06-1990	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico		
Geologo	Dott.ssa Geol. Palma Pratini (fig. esterna)	Incarico conferito tramite:	ai sensi dell'art.9 del disciplinare di incarico del progettista	Geotecnico	Ingg. Proff. Guido Umiltà e Fabio Cafiso (fig. esterne)	Delibera di Incarico	Giunta Municipale n.376 del 26-06-1990	
Direttore Lavori	Dott Ing Carlo Barbuza (fig. esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 29 del 16/01/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Carlo Barbuza (fig. esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 29 del 16/01/2013					
Collaudatore Statico	Arch. Francesco Barbato	Nota di Incarico	D. C. n. 327 del 08/05/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Arch. Francesco Barbato	Nota di Incarico	D. C. n. 327 del 08/05/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori ZACCARIA COSTRUZIONI Srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n.522 del 08/10/2012	data contratto	23/01/2013
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	24/05/2013	data presunta di termine lavori	





**UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**  
*“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”*  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA141	Capaci	Consolidamento centro abitato	Importo ApQ	€ 1.200.000,00
<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato il passaggio dell'intervento in A, l'ARTA, con nota acquisita al prot. n.528 del 18 /04/2011 ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa dell'intervento.</i></p> <p><i>La progettazione è stata effettuata da progettisti esterni incaricati dal Comune.</i></p> <p><i>In data 07 /11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n.180 del 23/04/2012 il Commissario ha acquisito il progetto l stralcio esecutivo.</i></p> <p><i>A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento .</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e validazione del progetto.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</i></p> <p><i>In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 1519 del 11/03/2013, il D.L. comunica all'impresa Zaccaria Costruzioni che in data 18/03/2013 si procederà alla consegna dei lavori.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013 si è provveduto ad impegnare le Somme.</i></p> <p><i>A seguito della CdS del 12/09/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione della Perizia di Variante.</i></p>		<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 



PA142	Carini	Barriere paramassi - Zona Industriale						Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 583 del 18/07/2013	Importo Finanziato	€ 976.967,14	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento Indagini	n. 589 del 07/11/2012	Importo Finanziato	€ 32.546,39	Decreto di impegno pagamento indagini preliminari	n. 318 del 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 22.941,53		
Decreto di finanziamento plottaggio tavole grafiche	n. 435 del 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 90,75	Decreto di Impegno plottaggio tavole grafiche	n. 435 del 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 90,75		
Decreto di definanziamento somma residua delle indagini	n. 583 del 18/07/2013	Importo Definanziato	€ 12.677,54	Decreto di Impegno pubblicazione GURI	n. 689 del 05/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 917,58		
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione quotidiano	n. 787 del 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 617,10		
				Decreto di Impegno pagamento spese pubblicazione esito gara	n. 917 del 31/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 996.926,74</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 25.655,96</b>		
							Economi da finanziamento		
							Economie da ribasso		

<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA						
--------------------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--


**Figure Tecniche**

RUP	Geom. Salvatore Bellia	Decreto di incarico	D.C. n. 850 del 11/10/2013	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto di Incarico	D.C. n.35 del 23/01/2012
RUP	Ing. Antonino Cracchiolo	Decreto di incarico	D.C. n. 179 del 09/08/2011 (revocato con D.C. n. 850 del 11/10/2013)				
Progettista	INVITALIA	Ing. Marco Calogero © Ing. Giuseppe Morganti	Nota di Incarico	prot. n.520/UC del 18/04/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM				
Direttore Lavori	Ing. Michele Zafonti.	Decreto di Incarico	prot. n. 872 del 10/10/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Michele Zafonti.	Decreto di Incarico	prot. n. 872 del 10/10/2013				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO R.A.S. S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 663 del 03/12/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO TRIVENETO	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 677 del 27/08/2013	data contratto	
contratto	19/12/2012	data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA142	Carini	Barriere paramassi - Zona Industriale	Importo ApQ	€ 1.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Con nota prot. n. 520 del 18/04/2011 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, mentre con nota prot. n. 2759 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono stati affidati al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM".</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 17/09/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardante il programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse a favore dell'Impresa GEO R.A.S. S.r.l., in data 19/12/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie cartacee degli elaborati inerenti ai report delle indagini svolte.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Cds del 05/06/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Co Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 si provvede ad approvare e finanziare l'intervento per un importo complessivo pari ad € 976.967,14.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 590 del 22/07/2013 viene predisposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa CONSORZIO TRIVENETO che ha offerto un ribasso pari al 35,8978%.</p>		SAL	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p> 



PA143	Castelbuono	Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia						Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 808 del 08/10/2013	Importo Finanziato	€ 1.978.972,49	Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
Decreto di Finanziamento indagini	n. 203 del 19/03/2013	Importo finanziato	€ 38.862,54					Economie da finanziamento	
Definanziamento di cui al D.C. n.203 del 19/03/2013	n.480 del 26/06/2013	Importo Definanziato	€ 17.835,03	Impegno somme realizzazione piano di indagini	n.480 del 26/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 21.027,51	Economie da ribasso	
				Disimpegno somme realizzazione piano di indagini	n.650 del 06/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 289,37	Economie da ribasso	
				Impegno somme plottaggio	n. 912 del 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 762,25	Economie da ribasso	
				Impegno somme pagamento GURI	n. 950 del 08/11/2013	Importo dell'Impegno	€ 861,46	Economie da ribasso	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 22.940,59</b>		

<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA							
--------------------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--


**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Santi Sottile	Decreto di Incarico	D.C. n. 576 del 06/11/2012	Supporto al RUP	Dott. Angelo Nicastro	Decreto di Incarico	D.C. n. 576 del 06/11/2012
Progettista	INVITALIA	Ing. Rossella Zumbè © Ing. Adriano Grassi; Ing. Gianluca Coroneo; Ing. Fabio Ferla; Dott. Gianluca Sabatini.	Nota di Incarico	prot. n. 4370 del 29/10/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Giuseppe Bonomo (informazione estrapolata dal verbale di riunione)	Determina di Incarico					
Direttore Lavori	Incarico revocato con nota prot. n. 4370 del 29/10/2012	Ingg. G. Nogara	Nota di Incarico	prot. n. 484/UC del 03/11/2010	Assistente al DL	Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Nota di Incarico				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	D. C. n. 273 del 11/04/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	FERRARO IGNAZIO	Decreto Affidamento Lavori	n.922 del 31/10/2013	data contratto	
contratto	16/04/2013	data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA143	Castelbuono	Opere di drenaggio e consolidamento – C.da Liccia	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è affidata al GC di Palermo.</p> <p>Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto esecutivo.</p> <p>Con nota del 02/11/2011 il GC Pa ha chiesto al Dott. Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico-tecnico eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva.</p> <p>A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si resta in attesa dei risultati.</p> <p>Il Commissario, facendo seguito alla nota prot. n. 3961 del 09/10/2012, con la quale concedeva al GC di Pa 20 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A- Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia", con nota prot. n. 4369 del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, compreso quello di RUP.</p> <p>Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a INVITALIA, che ha comunicato il GdL con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 ha chiede alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, di poter acquisire copia della consulenza tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 28/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD contenenti i prodotti risultanti dai rilievi aerei</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 273 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari a favore dell'Impresa GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l. (ribasso percentuale del 46,9999 %)</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3799 del 24/06/2013 la CGIAM trasmette all'Ufficio del Commissario i documenti relativi all'approvazione della relazione geologica ed i relativi elaborati riguardanti le "Opere di drenaggio e consolidamento C.da Liccia nel Comune di Castelbuono".</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dal GdL.</p> <p>A seguito delle richieste di integrazioni emerse in sede di CdS del 31/07/2013 e richieste dal RUP, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4772 del 02/08/2013, il Gruppo di progettazione IAP, trasmette gli elaborati integrativi.</p> <p>A seguito della CdS del 12/09/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 808 del 08/10/2013 è stato finanziato l'intervento;</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n.922 del 31/10/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva a favore dell' impresa FERRARO IGNAZIO</p>		SAL	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p> 

PA148	Mezzojuso	Opere di consolidamento – Zona Collina Brigna						Importo ApQ	€ 2.144.000,00
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010	note:	A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21/10/2010 l'intervento transita in B	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento acquisizione progettazione	n. 224 del 26/03/2013	Importo Finanziato	€ 129.278,25					Economie da finanziamento	
Decreto di finanziamento polizza assicurativa per le verifiche della progettazione	n. 868 del 17/10/2013	Importo Finanziato	€ 650,24	Decreto di impegno e pagamento polizza assicurativa per le verifiche della progettazione	n. 868 del 17/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 650,24	Eventuali Economie da ribasso	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 129.928,49</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 650,24</b>		

Figure Tecniche								
RUP	Ing. Calogero Foti	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 192 del 14/03/2013	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 192 del 14/03/2013	
Progettista	Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:		
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2295 del 22/06/2012 l'ARTA ha trasmesso all'Ufficio del Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento invitando il Comune trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto in proprio possesso. L'ARTA Serv. 3, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Commissario con nota prot. n. 724 del 04/02/2013, trasmette il parere favorevole sulla coerenza dell'efficacia degli interventi previsti nel progetto ai fini della mitigazione della pericolosità e del rischio geomorfologico.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 224 del 26/03/2013 si è provveduto ad acquisire tutta la documentazione tecnica progettuale redatta dalla Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico Ing. salvatore Miliziano.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2770 del 13/05/2013 la Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl ha trasmesso in formato cartaceo e digitale il progetto esecutivo rielaborato ed adeguato al nuovo prezzario regionale OO.PP. per l'anno 2013. A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti i pareri necessari e con nota acquisita agli atti al prot. n. 4405 del 22/07/2013 il Dipartimento Azienda Foreste Demaniali conferma il parere positivo alla realizzazione dell'intervento e rimanda per le eventuali determinazioni di competenza alla nota a suo tempo inviata all'ARTA Serv.6.</p> <p>Con nota prot. n. 5231 del 05/09/2013 Il Commissario comunica i componenti del gruppo di verifica del progetto esecutivo.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	---	-----	--------------------------------




PA149	Misilmeri	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa						Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
Decreto di finanziamento indagini preliminari	n. 678 del 27/08/2013	Importo Finanziato	€ 48.302,19				Economi da finanziamento		
Decreto di finanziamento pagamento AVCP	n. 572 del 17/07/2013	Importo Finanziato	€ 30,00	Decreto di Impegno pagamento AVCP	n. 572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 48.332,19</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 30,00</b>		
							Economie da ribasso		
<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM								

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di incarico	D.C. n. 126 del 22/02/2013	Supporto al RUP			Nota di Incarico		
Progettista	ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013	Coord Sicurezza fase Progett.	ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013		
Geologo	Dott. Giorgio Milazzo (professionista esterno)	Determina di Incarico	Provvedimento del sindaco n.46 del 22/06/2011						
Direttore Lavori	ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013	Assistente al DL			Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	Decreto di incarico	D.C. n. 274 del 12/04/2013						
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID S.r.l	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 733 del 12/09/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto		
contratto	24/09/2013	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori		



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA149	Misilmeri	Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p><i>La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di Misilmeri che con nota acquista al prot. n. 1650 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto.</i></p> <p><i>Con nota prot. n.4707 del 07/02/2012 Il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto esecutivo per l'emissione del parere di competenza, parere poi acquisito al prot. 1011 del 26/03/2012 con esito negativo.</i></p> <p><i>Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012 con cui il RUP ha trasmesso unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 19/06/2012 di approvazione amministrativa, il progetto esecutivo-1° lotto funzionale, senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA Serv.3, ha ribadito che avrebbe provveduto ad avviare nuove procedure per il conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento.</i></p> <p><i>Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Misilmeri.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 274 del 12/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. misure di contabilità' e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dell' Associazione Temporanea di Professionisti ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO (ribasso percentuale pari al 51,1861 %).</i></p> <p><i>In data 27/08/2013, con Decreto n. 678, è avvenuta l'approvazione delle specifiche tecniche afferenti il Piano di Indagini preliminari.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 733 del 12/09/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini a favore della GEOMERID Srl (ribasso percentuale pari al 51,5000 %) In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.</i></p>		SAL	<p>PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO</p> 





<b>PA151</b>	<b>Partinico</b>	<b>Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio</b>						Importo ApQ	<b>€ 950.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

<b>CONVENZIONI</b>								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

RUP		Incarico conferito tramite:	-	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del Commissario ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune ha informato di non essere in grado di rispettare i termini di consegna richiesti per la progettazione.</p> <p>Con nota prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario ha comunicato al Comune che in qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, avrebbe proceduto alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario revoca l'incarico precedentemente conferito alla CGIAM con nota prot. n. 3339/UC del 06/09/2012.</p> <p>L'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 6315 del 21/10/2013 chiede al Comune di Partinico, la trasmissione del progetto preliminare.</p>	SAL	<p>PROGETTAZIONE IN CORSO</p>
------------------------	--	-----	-------------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA152	Petralia Sottana	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello						Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Comitato del 21 ott 2010: transita alla Lettera B; Comitato del 24 feb 2011: l'intervento transita nuovamente alla lettera A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	433 - 29/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.200.000,00	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	520 del 09/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.127,25		
				Decreto di Impegno pagamento pubblicazione gara	n.860 del 11/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.706,10		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 2.833,35</b>		
								Economi da finanziamento	
								Economie da ribasso	

Figure Tecniche									
RUP	Comune	Geom. Sabatino Giovanni	Decreto di Incarico	D.C. n. 488 del 27/06/2013	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di Incarico	D.C. n.127 del 22/02/2013	
RUP	Comune	Geom. Croce Salvatore Scelfo	Decreto di Incarico	D.C. n.137 del 20/07/2011	Soggetto REO (Caronte)	Geom. Giuseppe Ferrante	Nota di Incarico	prot. N. 5317/UC del 13/12/2012	
Progettista	Comune	Ing. Alessandro Sammataro (UTC)	Nota di Incarico	prot. n.6086 del 30/05/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico		
Geologo	Dott. Torre Alessandro		Determina di Incarico	Determina sindacale n.25 del 11/07/2011	Geotecnico	Ing. Michele Zafonti	Determina di Incarico	Sindacale n. 24 del 11/07/2011	
Direttore Lavori	Ing. Alessandro Sammataro		Nota di Incarico	D.C. n. 715 del 10/09/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Alessandro Sammataro		Nota di Incarico	D.C. n. 715 del 10/09/2013					
Collaudatore Statico			Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI			AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 504 del 02/07/2013	data contratto	04/09/2013
contratto		data conclusione lavori			GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l.	verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>A seguito del Comitato del 21/10/2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B.</p> <p>Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale.</p> <p>Nella seduta del Comitato di Indirizzo e Controllo del 18/05/2012 l'intervento transita in lettera B.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2254 del 21/06/2012 l'ARTA ha comunicato di aver individuato il Commissario Straordinario Delegato quale Ente Beneficiario</p> <p>In data 06.08.2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22.06.2012 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per i lavori.</p> <p>Con D.C. n. 433 del 29.08.2012 il Commissario prende atto del DDG n. 360 del 22.06.2012 dell'ARTA inerente il finanziamento dell'intervento</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Con Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l. (ribasso pari al 30,8684%), in data 04/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4566 del 26/07/2013 il RUP trasmette il verbale di attestazione sull'esigibilità dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del Regolamento n. 207/2010.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5924 del 03/10/2013, il RUP invita la D.L. e l'Impresa aggiudicataria per il giorno 10/10/2013 per effettuare la consegna dei lavori.</p>	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI
-----------------	--	-----	--------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

<b>PA154</b>	<b>Polizzi Generosa</b>	<b>Opere di consolidamento – Zona via G.Borgese</b>						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.39 del 31/03/2011	Importo Finanziato	€ 366.497,75	Decreto di Impegno	n.245 del 28/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 407.990,10		
				Decreto di Disimpegno	n. 632 del 20/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 41.492,35	Economie da finanziamento	€ 133.502,25
						Importo dell'Impegno dopo il disimpegno e definanziamento	€ 366.497,75	Economie da ribasso (definanziamento D.C. n. 632 del 20/11/2012)	€ 133.502,25

<b>CONVENZIONI</b>	GC
--------------------	----

**Figure Tecniche**

<b>RUP</b>	Ing. Vincenzo Di Rosa (Ing. Capo GC PA)	Nota di Incarico	prot. n. 483/UC del 03 novembre 2010	Supporto al RUP		Nota di Incarico	
<b>Progettista</b>	GC Pa	Nota di Incarico	prot. n. 483/UC del 03 novembre 2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico	
<b>Geologo</b>		Determina di Incarico					
<b>Direttore Lavori</b>	Ing. Giuseppe Nogara Genio Civile di PA	Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>		Nota di Incarico					
<b>Collaudatore Statico</b>	Ing. Giuseppe Dragotta	Decreto di Incarico	D.C. n. 359 del 02/12/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

<b>INDAGINI preliminari affidate a:</b>	Decreto di affidamento INDAGINI		<b>AFFIDATARIA</b> Esecuzioni Lavori	<b>CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL</b>	Decreto Affidamento Lavori	<b>D.C. n.168 del 03/08 2011</b>	data contratto	10-ago
<b>contratto</b>	data conclusione lavori				verbale inizio attività	<b>14/09/2011</b>	fine lavori	23-apr-12

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p><i>La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Palermo.                  A seguito dell'espletamento delle procedure di gara con Decreto Commissariale n. 168 del 03/08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.                  I lavori sono stati avviati 14/09/2011 e sono stati completati in data 23/04/2012.                  Il Collaudatore Statico ha prodotto il Certificato di Collaudo Statico delle opere redatto in data 09/05/2012                  Il GC PA, con nota acquisita al protocollo con n. 1921 del 30/05/2012, ha trasmesso la Perizia di Assesamento Finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Decreto Commissariale n.263 del 07/06/2012.                  Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato redatto dalla DL in data 12/07/2012.</i></p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
------------------------	---	-----	-----------------

<b>PA156</b>	<b>Termini Imerese</b>	<b>Risagomatura argini e opere di pulitura – Zona foce Fiume Torto</b>						Importo ApQ	<b>€ 800.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.108 del 15/03/2012	Importo Finanziato	€ 800.000,00	Decreto di Rimodulazione Impegno	Decreto n. 606 del 15/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 547.274,70		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione Gara	n.317 del 06/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 636,30		
				Decreto di Impegno e Pagamento AVCP	n. 387 del 24/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 800.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 548.136,00</b>		
								Economie da finanziamento	€ -
								Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	DRPC								
--------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Calogero Foti (DRPC Pa)	Decreto di incarico	D.C. n.116 del 20 marzo 2012	Supporto al RUP				Nota di incarico	
Progettista	DRPC Pa	Nota di Incarico	prot. n. 298/UC del 28/09/2010	Coord Sicurezza fase Progett.				Nota di incarico	
Geologo	Dott. Geol. Rosario Di Piazza	Nota di Incarico	prot. n. 6553 del 31/10/2013						
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL				Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico							
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo				Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	SILGEO srl	Decreto Affidamento Lavori	<b>Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012</b>	data contratto	08-giu-12
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	<b>28-giu-12</b>	data di termine lavori	25-ott-12

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La Progettazione è stata affidata al D.R.P.C. di Palermo che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 1116 del 11/07/2011 e successiva integrazione con nota acquisita al prot. 1779 del 19/09/2011 . A seguito della ricezione di tutti i pareri necessari il Commissario ha finanziato l'intervento con Decreto n.108 del 15/03/2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 28/06/2012 sono stati consegnati i lavori.</p> <p>Con D.C. n. 606 del 15/11/2012 di presa atto perizia di variante si è avuta una rimodulazione e riduzione dell'impegno di spesa</p> <p>In data 25/10/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.</p>	SAL	<b>LAVORI ULTIMATI</b>
------------------------	--	-----	------------------------



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

<b>PA157</b>	<b>Valledolmo</b>	<b>Opere di consolidamento - C.da Renella</b>						Importo ApQ	<b>€ 500.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	D.C. n. 02 del 23/11/2010	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	D.C. n.50 del 18/04/2011 come rimodulato dal D.C. n.108 del 29/06/2011	Importo dell'Impegno	€ 465.000,00		
Decreto di Definanziamento	D.C. n. 152 del 01/03/2013	Importo defanziato	43.212,35,	Decreto di disimpegno	D.C. n. 152 del 01/03/2013	Importo disimpegnato	€ 8.212,35		
	D.C. n. 152 del 01/03/2013	importo a seguito definanziamento	€ 456.787,65				€ 456.787,65	Economie da finanziamento	€ -
								Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	<b>COMUNE</b>								
--------------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

<b>RUP</b>	Geom. Orazio Pizzolanti (Capo UTC)	Determina di incarico	Determina sindacale n° 227 del 10 agosto 2010	<b>Supporto al RUP</b>				Nota di Incarico	
<b>Progettista</b>	Comune	Nota di Incarico		<b>Coord Sicurezza fase Progett.</b>				Nota di Incarico	
<b>Geologo</b>	Dott. Geol. Alfonso Spera	Determina di Incarico	Determina sindacale n. 21 del 27/08/2010	<b>Geotecnico</b>	Ing. Spina Pietro			Determina di Incarico	Determina sindacale n.22 del 30/08/2010
<b>Direttore Lavori</b>	Ing. Gioacchino Muscato	Nota di Incarico		<b>Assistente al DL</b>				Nota di Incarico	
<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>		Nota di Incarico							
<b>Collaudatore Statico</b>	Ing. Francesco Carollo	Nota di Incarico	prot. n. 442/UC del 07/04/2011	<b>Collaudatore Tecnico amministrativo</b>				Nota di Incarico	
<b>INDAGINI preliminari affidate a:</b>	Decreto di affidamento INDAGINI		<b>AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori</b>	<b>CO.GEN.AP. Srl</b>	Decreto Affidamento Lavori	<b>Determina Dirigenziale n.65 del 18/02/2011; Determina di Modifica n.102 del 18/03/2011</b>		data contratto	
<b>contratto</b>	data conclusione lavori				verbale inizio attività	<b>14-mar-11</b>		fine lavori	04-lug-11

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p><i>La Progettazione è stata affidata al Comune.                  A seguito dell'espletamento delle procedure di gara il Comune ha provveduto ad affidare i lavori.                  Con nota acquisita al prot. n. 1266 del 26/07/2011 il Comune ha comunicato la fine dei lavori in data 04/07/2011 e l'avvenuto collaudo statico in data 07 /07/2011.</i></p>						SAL	<b>LAVORI ULTIMATI</b>
------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	------------------------



PA179	Altofonte	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 449 del 17/06/2013	Importo Finanziato	€ 578.022,01	Decreto di Impegno	n. 735 del 12/09/2013	Importo dell'impegno	€ 428.662,50		
Decreto di definanziamento	n. 449 del 17/06/2013	Importo Definanziato	€ 1.814,19						
Decreto di Finanziamento specifiche tecniche	n. 233 del 21/05/2012	Importo Finanziato	€ 23.549,50	Decreto di Impegno e pagamento Indagini Preliminari	n. 652 del 28/11/2012	Importo dell'impegno	€ 21.735,31		
Decreto di finanziamento Polizza Assicurativa RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 242,68	Decreto di Impegno Polizza Assicurativa RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo dell'impegno	€ 242,68		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 603.628,38</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 450.640,49</b>		
								Economi da finanziamento	
								Economie da ribasso	


<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM								
--------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di incarico	D.C. n.211 del 10/05/2012	Supporto al RUP	Dott. Gaetano Vinci	Decreto di Incarico	n.32 del 23/01/2012		
	Comune	Arch. Salvatore Butera	Nota di incarico					D.C. n.16 del 17.01.2012	
Progettista	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO	Decreto di Incarico	D.C. n. 596 del 09/11/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO	Nota di Incarico	n. 3964 del 09/10/2012		
Geologo	CGIAM Dott. Geol Giacomo Anselmo	Determina di Incarico							
Direttore Lavori	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO	Decreto di Incarico	D.C. n. 596 del 09/11/2012	Assistente al DL		Nota di Incarico			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO	Decreto di Incarico	D.C. n. 596 del 09/11/2012						
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico			
INDAGINI preliminari affidate a:	CGIAM (GEO R.A.S Srl indagini integrative preliminari)	Decreto di affidamento INDAGINI	CGIAM Accordo Quadro del 29/11/2011. (GEO RAS Srl D.C. n. 285 del 18 giugno 2012)	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	URANIA srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 561 del 15/07/2013	data contratto	10-set
contratto	GEO R.A.S. srl 03/07/2012	data conclusione lavori	03/08/2012			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

PA179	Altofonte	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	Importo ApQ	€ 600.000,00
STATO DELL'ARTE		<p><i>La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto all'affidamento a progettisti esterni. Le indagini preliminari alla progettazione sono invece state affidate dal Commissario alla CGIAM che con nota assunta al prot. n. 1256 del 12/04/2012 ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 285 del 18/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari ed in data 03/07/2012 è stato sottoscritto il contratto.</i></p> <p><i>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 10/07/2012, nel quale è emersa la problematica inerente la presenza di una folta vegetazione che non consentiva l'esecuzione di un idoneo rilievo, ha chiesto all'Impresa aggiudicataria di trasmettere un atto aggiuntivo al contratto principale per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni.</i></p> <p><i>l'Impresa, con nota acquisita agli atti al prot.n. 3040 del 03.08.2012, ha trasmesso copia degli elaborati tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la documentazione relativa alla Relazione Geologica.</i></p> <p><i>Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013 trasmette alla Mediterraneo Engineering le indagini e la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO-GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo. A seguito della Cds del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 12/06/2013 il D.L. trasmette attestazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.P.R. n.207/2010 di conformità del progetto esecutivo e il permanere delle condizioni di esecuzione dell'opera.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 449 del 17/06/2013 è stato finanziato l'intervento.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 561 del 15/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl., in data 10/09/2013 è stato stipulato il contrattodi appalto.</i></p>	SAL	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p> 



PA180	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita						Importo ApQ	€	90.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-			
Decreto di finanziamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo Finanziato	€ 502,72	Decreto di impegno e pagamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 502,72	Economi da finanziamento		
Finanziamento somme plottaggio tavole	Decreto n. 913 del 30/10/2013	Importo Finanziato	€ 16,48	Impegno somme plottaggio tavole	n. 913 del 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 16,48	Economie da ribasso		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 519,20</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 519,20</b>			
								Economie da ribasso		

<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA								
--------------------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--


**Figure Tecniche**

RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto di incarico	D. C. n. 71 del 01/02/2013	Supporto al RUP		Decreto di Incarico	
	Ing. Giuseppe Morganti	Decreto di incarico	D. C. n.130 del 27/03/2012 (revocato con D.C. n. 71 del 01/02/2013)	Supporto al RUP		Decreto di Incarico	
Progettista	INVITALIA	Arch Fabio Pulizzi Ing. Rossella Zumbè Dott. Gianluca Sabatini	Nota di Incarico	prot. 2494 del 04/07/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM				
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	data presunta di termine lavori





*UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1*

PA180	Cefalù	<b>Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita</b>	Importo ApQ	€ <b>90.000,00</b>
<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p>A seguito della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha incaricato la CGIAM di predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini geologiche.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 2711 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.</p> <p>In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fine della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP, con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha invitato il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.</p> <p>A seguito della nota prot. n. 3351 del 06/09/2012, con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.</p> <p>Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 71 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.</p> <p>A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l'attivazione della procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.</p>		<p>SAL</p>	<p>ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE</p> 




PA181	Cefalù	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita- Proprietà Greco						Importo ApQ	€ 400.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
Decreto di Finanziamento indagini	n.132 del 30-03-2012		€ 48.395,70	Decreto di Impegno e pagamento indagini	Decreto n. 444 del 06/09/2012	Importo dell'impegno	€ 30.827,42		
Decreto di finanziamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo Finanziato	€ 502,72	Decreto di impegno e pagamento plottaggio elaborati	Decreto n. 538 del 10/07/2013	Importo dell'impegno	€ 502,72		
Finanziamento somme plottaggio tavole	Decreto n. 913 del 30/10/2013	Importo Finanziato	€ 16,48	Impegno somme plottaggio	n. 913 del 30/10/2013	Importo dell'impegno	€ 16,48	Economie da ribasso	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 48.914,90</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 31.346,62</b>		
								Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA							
--------------------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto di incarico	D. C. n. 71 del 01/02/2013	Supporto al RUP		Decreto di Incarico	
	Ing. Giuseppe Morganti	Decreto di incarico	D.C. n.130 del 27/03/2012 (revocato con D.C. n. 71 del 01/02/2013)	Supporto al RUP		Decreto di Incarico	
Progettista	INVITALIA	Ing. Domenico Imbroglia Ing. Gianluca Coroneo Arch. Fabio Pulizzi Ing. Rossella Zumbè Dott. Gianluca Sabatini	Nota di Incarico	prot. n.2494 del 04/07/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM				
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO PLANTS srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 196 del 02/05/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori



PA181	Cefalù	<b>Messa in sicurezza movimenti franosi                      Loc. Testardita- Proprietà Greco</b>	Importo ApQ	€ 400.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il Commissario con nota prot. n. 2723 del 02/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA In virtù della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha affidato alla CGIAM la redazione delle indagini geologiche, trasmesse con nota acquisita agli atti al prot. n. 953 del 21/03/2012. Con Decreto Commissariale n. 196 del 02/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari.</p> <p>Le attività di indagine hanno avuto inizio in data 14/05/2012 e sono state completate in data 20/06/2012. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012.</p> <p>In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 dalla L.R. 78/76 e ss.mm.ii, pregiudiziali ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012 ha invitato il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza.</p> <p>A seguito della prot. n. 3351 del 06/09/2012 con la quale il RUP chiedeva al GdL di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CC.AA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte.</p> <p>Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento.</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 70 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento.</p> <p>In data 08/05/2013 si è svolto un tavolo Tecnico</p> <p>A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 Il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l'attivazione della procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.</p>		SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE  


CT	Castel di Judica	Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato						Importo ApQ	€ 900.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	-	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

### Figure Tecniche

RUP	Geom. Domenico Faranda	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 06 del 29/02/2012	Supporto al RUP	-	Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE Ing. Giovanni Amato, Ing. Giuseppe Vaccaro- Incarico esterno	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 1496 del 15/12/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Salvatore Cavallaro	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 1401 del 01/12/2010			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune.                  Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2291/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette all'Ufficio del Commissario, in quanto Ente Beneficiario, il progetto, e la relativa documentazione tecnico/amministrativa, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.                  Con nota acquisita al prot. n. 273/UC del 16/01/2013, il RUP chiede al Commissario l'indizione della CdS.                  Considerato che durante la CdS del 07/03/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, il Commissario con nota prot. n.2330 del 19/04/2013 trasmette all'ARTA Serv. 3 tutta la documentazione amministrativa e l'unico progetto trasmesso, per la definizione dell'iter di finanziamento dell'intervento.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	---	-----	--------------------------------



CT 022	Bronte	Consolidamento frana						Importo ApQ	€ 1.092.500,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>				<b>TOTALE IMPEGNATO</b>			
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Santo Saitta (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 10/07/2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 10/07/2012	
Progettista	Comune	Nota di Incarico	Prot.n.559 del 10/11/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Comune	Nota di Incarico	Prot.n.559 del 10/11/2010	
Geologo	Dott. Geol. Giovanni Cavallaro	Determina di Incarico	Determina Dirigenziale n. 33 del 21/02/2011					
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina						
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota prot. n. 559 del 10/11/2010 il Commissario autorizza il Comune a redigere il progetto esecutivo. Il Comune trasmette il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n. 2892 del 15/12/2011. A seguito di incontri e colloqui, Il Commissario, con nota protocollo n. 2182 del 14/06/2012, sollecita il comune a trasmettere il progetto esecutivo, debitamente munito dei pareri e documenti economici. Il RUP, con nota assunta al protocollo con n. 2377 del 27/06/2012, trasmette copia del progetto esecutivo con le integrazioni richieste, già inviato dallo stesso all'ARTA Serv. 3 per il relativo parere di competenza in quanto l'area oggetto dell'intervento è stata classificata R4, giusto Decreto n° 296/41 del 04.07.2000 (prot. n. 2376 del 27/06/2012).</p> <p>In sede della Conferenza dei Servizi del 18/07/2012, essendo stati acquisiti tutti i pareri e/o atti autorizzativi per la realizzazione dell'intervento, il Comune comunica di aver già avviato le procedure espropriative, come da documentazione trasmessa con nota acquisita al prot/UC n. 195 del 11/01/13.</p>	SAL	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA
-----------------	---	-----	------------------------------

CT023	Calatubiano	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide - Pasteria						Importo ApQ	€ 250.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	note:	Nel comitato del 21/10/2010 l'intervento transita in lettera B Nel comitato del 24/02/2011 l'intervento transita di nuovo in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 374 del 22/05/2013	Importo Finanziato	€ 250.000,00	Decreto di Impegno	619 - 30/07/2013	Importo dell'impegno	€ 189.722,07		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 250.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNATI</b>			
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00

CONVENZIONI	INVITALIA
-------------	-----------

Figure Tecniche									
RUP	Dott. Gaetano Cani	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 356 del 17/07/2012	Supporto al RUP	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 29/01/2013)	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n. 356 del 17/07/2012		
Progettista	INVITALIA	Arch. Fabio Pulizzi © Ing. Alberto Peligra Ing. Gianluca Coroneo	Nota di incarico (in virtù della convenzione stipulata il 18/02/2011)	prot. N. 667 del 28/02/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	INVITALIA	Nota di incarico (in virtù della convenzione stipulata il 18/02/2011)	prot. N. 667 del 28/02/2012	
Geologo	INVITALIA	Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Nota di incarico (in virtù della convenzione stipulata il 18/02/2011)	prot. N. 667 del 28/02/2012					
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Faro	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 565 del 16/07/2013	Assistente al DL			Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Faro	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 565 del 16/07/2013						
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico		


INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento		AFFIDATARIA	G.C. COSTRUZIONI S.R.L.	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 508 del 04/07/2013	data contratto	23/07/2013
contratto	data conclusione lavori		Esecuzioni Lavori		verbale inizio attività	06-ago-13	data presunta di termine lavori	29-gen-14

STATO DELL'ARTE	<p>A seguito del Comitato del 21/10/2011 l'intervento diventa di competenza dell'ARTA, alla quale si trasmette tutta la documentazione;</p> <p>Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale. A seguito della rinuncia del Comune, la Progettazione viene affidata ad INVITALIA con nota prot. n.667 del 28/02/2012.</p> <p>Con nota protocollo n. 5295 del 12/12/2012 la Società Invitalia trasmette all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07 febbraio 2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del parere ambientale dell'ARTA Serv. 1 VIA/VAS .</p> <p>Con nota prot. n. 2485 del 30/04/2013 L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica che non è necessario attivare le procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. N. 152/06, poiché le opere previste non ricadono tra quelle elencate negli allegati n. III e IV del suddetto decreto.</p> <p>L'Ufficio del Commissario con nota 2705 del 10/05/2013 comunica al RUP che alla data odierna non risulta ancora pervenuto il parere dell'ARTA Serv. 3, pertanto, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario, lo stesso si intende acquisito favorevolmente e lo invita a redigere il verbale di verifica e validazione dell'intervento.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 2930 del 20/05/2013 trasmette al Commissario la verifica e validazione dell'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 374 del 22/05/2013 viene approvato e finanziato l'intervento per un importo pari ad € 249.978,03.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 508 del 04/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Società G.C. COSTRUZIONI S.R.L. (ribasso percentuale del 31,7898%), in data 23/07/2013 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 619 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.</p> <p>In data 06/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale Consegna Lavori.</p> <p>Con nota prot. n. 5457 del 16/09/2013 il RUP trasmette tutta la documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.</p>					SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	--	--	--	--	-----	----------------

CT024	Castel di Iudica	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 640 del 22/11/2012	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 490 del 27/06/2013	Importo dell'impegno	€ 2.227.552,38		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>	Decreto di Impegno e pagamento GURI	Decreto n. 727 del 20/12/2012	Importo dell'impegno	€ 2.006,50	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione avviso gara	Decreto n. 112 del 20/02/2013	Importo dell'impegno	€ 1.887,60		
				Decreto di impegno e pagamento MAV	Decreto n. 202 del 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 600,00		
				Decreto di impegno e pagamento relazione geologica	Decreto n. 237 del 28/03/2013	Importo dell'impegno	€ 61.181,44		
				Decreto di impegno pubblicazione quotidiano di sicilia	Decreto n. 260 del 05/04/2013	Importo dell'impegno	€ 605,00		
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 297 del 08/04/2013	Importo dell'impegno	€ 916,20		
				Decreto di Impegno e pagamento commissione di gara	Decreto n. 385 del 24/05/2013	Importo dell'impegno	€ 8.536,27		
				Decreto di Impegno e pagamento coordin. Sicurezz. Fase progett.	Decreto n. 171 del 08/03/2013	Importo dell'impegno	€ 22.431,95		
				Decreto di impegno pubblicazione quotidiano	Decreto n. 492 del 28/06/2013	Importo dell'impegno	€ 1.706,10		
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 2.327.423,44</b>		
								Eventuali Economie da ribasso	
								<b>€ 0,00</b>	

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Domenico Faranda	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n.096 del 16 giugno 2011 (revocato con Decreto n. 476 del 24/06/2013)	Supporto al RUP				
	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n.476 del 24/06/2013		Ing. Federica Bottini	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n.096 del 16 giugno 2011 (revocato con Decreto n. 476 del 24/06/2013)	
Progettista	COMUNE	Nota di incarico	Da acquisire determine di incarico ai singoli professionisti	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Lorenzo Moschetto	Determina di incarico	Determina U.T.C. n° 858 del 08/07/2011	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Determina di incarico	Determina U.T.C. n° 856 del 08/07/2011	Studio Geotecnico	Ing. Roberto Barbagallo	Determina di incarico	Determina U.T.C. n° 857 del 08/07/2011	
Direttore Lavori	Geom. Domenico Faranda	Decreto di nomina	Decreto n. 479 del 25/06/2013	Assistente al DL		Nota di incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Francesco Freni	Decreto di nomina	Decreto n. 479 del 25/06/2013					
Collaudatore Statico	Ing. Fabrizio Greco	Decreto di incarico	Decreto n. 634 del 01/08/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Fabrizio Greco	Decreto di incarico	Decreto n. 634 del 01/08/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori ATI Mammana Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	n. 251 del 04/04/2013	data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	



CT024	Castel di Iudica	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	Importo ApQ	€ 3.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che con nota prot. n.984 del 23/03/2012 trasmette copia del progetto esecutivo.</p> <p>Il Comune ha attivato le procedure ambientali, al termine delle quali si è tenuta, in data 18/07/2012, la Conferenza di Servizi finalizzata ad ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto opportunamente modificato ed integrato, così come richiesto, ai fini del rilascio di apposito parere, dal GC di CT, con nota acquisita al prot. n. 2778 del 18/07/2012</p> <p>Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012, l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il parere di competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità identificata nel vigente PAI e per assenza di adeguata relazione idraulica per la definizione delle interferenze con le opere da realizzare. Le relazioni Idrauliche vengono inviate all'ARTA dal Commissario con nota prot. n. 3387 del 10/09/2012. L'intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 04/04/2013 viene disposta l'Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un ribasso percentuale pari al 29,6650%.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di € 2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.</p>		SAL	<p>AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI</p> 



CT025	Giarre	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada						Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>				<b>TOTALE IMPEGNATO</b>			
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

**Figure Tecniche**

RUP	Precedente R.U.P. Ing. Giuseppa Rita Leonardi	Nota di incarico	Nomina: determina sindacale n.88 del 8.10.2010 (Revocato con determina n. 111 del 2.12.2011)	Supporto al RUP	Ing. Antonino Cancelliere	Determina di Incarico	Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012
	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della 111A Area	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012				
Progettista	Comune	Nota di Incarico	prot. N. 414 del 19/10/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Comune	Determina di Incarico	prot. N. 414 del 19/10/2010
Geologo		Determina di Incarico					
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>Il Comune, con nota prot. 2823/UC del 7/12/2011, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, trasmette il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071/UC del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p> <p>Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti interessati.</p> <p>Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2136/UC del 12.06.2012, adempimento cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con con nota prot. n. 4024 del 12/10/12 e fornendo successivamente, con nota prot. n. 5159/UC del 6/11/12, i chiarimenti richiesti dall'ARTA Serv. 1 VAS/VIA. L'avviso pubblico per la consultazione degli elaborati progettuali relativamente alla verifica ambientale è stato pubblicato sulla GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. n. 5085 del 28/08/2013 comunica al Comune che l'intervento non necessita della procedura di assoggettabilità ambientale.</p> <p>Con nota prot. n. 5372 del 10/09/2013 Il RUP chiede ai progettisti di procedere alla validazione del progetto avendo già ottenuto tutti i pareri necessari, al fine di consentire l'emissione del Decreto Commissariale di finanziamento e la relativa gara d'appalto.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	---	-----	--------------------------------




<b>CT026</b>	<b>Giarre</b>	<b>Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.000.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 695 del 13/12/2012	Importo Finanziato	€ 1.000.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 446 del 14/06/2013	Importo dell'impegno	€ 734.670,35		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 295 del 18/04/2013	Importo dell'impegno	€ 1.083,94		
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	€ 735.754,29		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>

**Figure Tecniche**

<b>RUP</b>	nomina di R.U.P. all'Ing. Giuseppa Rita Leonardi	Nota di incarico	Determina sindacale n.88 del 8.10.2010 (revocato con determina n. 111 del 2.12.2011)	<b>Supporto al RUP</b>	Ing. Enrico Foti	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 293 del 25/06/2012
	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della 111A Area	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 293 del 25/06/2012				
<b>Progettista</b>	Comune	Nota di Incarico	prot. N. 413 del 19/10/2010	<b>Coord Sicurezza fase Progett.</b>	Comune	Nota di Incarico	prot. N. 413 del 19/10/2010
<b>Geologo</b>		Determina di Incarico					
<b>Direttore Lavori</b>	Ing. Leonardi Giuseppa Rita	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013	<b>Assistente al DL</b>	Geom. Rompineve Sorbello Roberto Geom. Torrisi Carmelo	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013
<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>	Geom. Licciardello Vito	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 225 del 26/03/2013				
<b>Collaudatore Statico</b>	Ing. Giuseppe Caradonna	Decreto di Incarico	Decreto n. 332 del 10/05/2013	<b>Collaudatore Tecnico amministrativo</b>	Ing. Giuseppe Caradonna	Decreto di Incarico	Decreto n. 332 del 10/05/2013

<b>INDAGINI preliminari affidate a:</b>	Decreto di affidamento INDAGINI		<b>AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori</b>	<b>Soc. Operae srl</b>	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 270 del 11/04/2013	data contratto	09/05/2013
<b>contratto</b>	data conclusione lavori				verbale inizio attività	17/05/2013	data presunta di termine lavori	



CT026	Giarre	<b>Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe</b>	Importo ApQ	€ 1.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il Comune, con nota prot. 2824 del 7/12/2011, trasmette, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste, ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p> <p>Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti pareri degli enti. Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2135/UC del 12.06.2012, prescrizione cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con nota prot. n. 4026/UC del 12/10/12. Le pubblicazioni sono state effettuate sulla GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica con nota acquisita al prot. n. 4811 del 20/11/2012 che il progetto non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dettando tuttavia delle prescrizioni.</p> <p>Il Comune, con nota prot. n. 5257/UC del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto n. 695 del 13/12/2012 il Commissario approva e finanzia l'intervento per un importo pari a € 1.000.000,00.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 30,2283%.</p> <p>Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad € 734.344,35.</p>		SAL	<p>AVVIATI LAVORI</p> 

CT027	Grammichele	<b>Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B.Buozzi</b>					Importo ApQ	€ 700.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012	Importo Finanziato	€ 700.000,00	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 303 del 19/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 549.978,26	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	€ 700.000,00	Decreto di impegno e pagamento MAV	Decreto n. 202 del 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00	
						<b>TOTALE IMPEGNI</b>	€ 550.203,26	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00

**Figure Tecniche**

RUP	Geom. Michele Iudica UTC	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.325 del 10/07/2012	Supporto al RUP	Ing.Rossella Zumbè (FINO AL 29/01/2013)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.325 del 10/07/2012
Progettista	Comune	Ing. Biagio Ventura UTC	Determina di Incarico	Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Dirigenziale n. 677 del 24/11/2003	Coord Sicurezza fase Progett.	Comune Geom. Michele Iudica UTC	Determina di Incarico Determina Sindacale n. 42 del 03/11/2003 Determina Dirigenziale n. 677 del 24/11/2003
Geologo			Determina di Incarico				
Direttore Lavori	Ing. Biagio Ventura	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 107 del 19/02/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Franco Giuseppe	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n. 216 del 25/03/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Celona	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 402 del 05/06/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	GLOBALGEO S.R.L.	Decreto Affidamento Lavori	n. 27 del 15/01/2013	data contratto	10-apr
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	24/06/2013	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che trasmette il progetto esecutivo nell'aprile del 2011. Da una prima visione del progetto sono emerse delle criticità.</p> <p>Con nota prot. n. 1870 del 28/05/2012 il Commissario ha richiesto un adeguamento del progetto, rielaborato con integrazioni richieste.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2120 del 11/06/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato con le integrazioni richieste.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 10/07/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, tra i quali il parere dell'ARTA serv 3 che prescrive un piano di monitoraggio dell'intervento.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4875/UC del 22/11/2012, trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della GLOBALGEO S.R.L. che ha offerto un ribasso percentuale del 29,7999 % ed il contratto è stato stipulato in data 10/04/2013;</p> <p>In data 24/06/2013 sono stati avviati i lavori.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	-----	----------------



<b>CT028</b>	<b>Licodia Eubea</b>	<b>Consolidamento Via Duca degli Abruzzi</b>						Importo ApQ	<b>€ 880.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	<b>B</b>	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Salvatore Lentini	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n. 587 del 07/11/2012	Supporto al RUP	Sig.ra Stefania Vallone	Decreto di Nomina	Decreto Commissariale n. 587 del 07/11/2012
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La progettazione è in capo al Comune.                  Con nota prot. n.2293/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario, in quanto Ente Beneficiario il progetto, la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.                  Con nota prot. n. 3442/UC del 12/09/2012, il Comune trasmette al Commissario copia del verbale di sopralluogo congiunto con il DPPC CT ed il GC CT, in cui si considera prioritario l'intervento sul "Versante Duca degli Abruzzi".                  Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012, il RUP trasmette il progetto esecutivo aggiornato. In sede di CdS del 19/12/2013 vengono acquisiti tutti i necessari pareri, tranne quello dell'ARTA serv. 3 che il Commissario, con nota prot. n. 409 del 22/01/13, considera comunque acquisito positivamente, stante la mancata ricezione nel termine assegnato di 7 gg.                  Il Comune, con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013, trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS del 19/12/2013.                  Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione dell'intervento.</p>	SAL	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA 
------------------------	--	-----	----------------------------------

CT031	Misterbianco	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 130 del 13/7/2011	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 331 del 21/11/2011 come modificato dal Decreto n. 371 del 18/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 387.388,21		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	Decreto Commissariale n. 312 del 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno Somma aggiuntiva Collaudatore	Decreto Commissariale n. 494 del 26/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.157,99		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	€ 500.000,00			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	€ 388.771,20		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 112.386,79

<b>CONVENZIONI</b>	DRPC CT
--------------------	---------


**Figure Tecniche**

RUP	Dott. Aldo Bonina(DRPC)	Nota di incarico	prot .n. 53823 del 14.12.2010	Supporto al RUP	Ing. Giocchino Marino Geom. Antonino Sciuto	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035317 del 08/09/2011		
Progettista	DRPC CT (Dott. Aldo Bonina, Arch. Fabio Borzi, Arch. Paolo Licandri)	Nota di Incarico	prot. n. 305 del 28/09/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	DRPC di Catania	Nota di Incarico	prot. n. 305 del 28/09/2010		
Geologo		Determina di Incarico		RUP Espropri	responsabile UTC (Ing. Vincenzo Orlando)	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 109 del 29/06/2011		
Direttore Lavori	Arch. Fabio Borzi(DRPC) Paolo Licandri	Arch.	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035317 del 08/09/2011	Assistente al DL	Geom. Antonio Sciuto	Nota di Incarico	prot. n. 035317 del 08/09/2011	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina						
Collaudatore Statico	Ing. Giovanna Baratta	Nota di incarico	Prot. N. 298 del 31/01/2012	Decreto Conferma incarico	Decreto Commissariale n. 149 del 02/04/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:	SGM srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Pippo Pizzo	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 249 del 03/10/2011	data contratto	15/11/2011
contratto	08/02/2011	data conclusione lavori	11/03/2011			verbale inizio attività	07/11/2011	data termine lavori	25/05/2012



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



CT031	Misterbianco	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	Importo ApQ	€ 500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 249 del 03/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.                      Il Contratto è stato stipulato il 15/11/2011. I lavori sono stati consegnati il 7/11/2011 e sono stati ultimati in data 25/05/2012.                      Durante lo svolgimento delle attività si è resa necessaria una Perizia di Variante e Suppletiva e di conseguenza una rimodulazione del quadro economico dell'intervento.                      Il Commissario ha preso atto della perizia con Decreto Commissariale n. 371 del 18/07/2012. <u>Con Decreto n. 494 del 26/09/2012 i è ulteriormente modificato il Q.E, a seguito dell'impegno della somma aggiuntiva di € 1.157,99 relativo alla voce B/5 (Collaudo Statico e prove su materiali).</u>                      Con nota protocollo n. 3036 del 03/08/2012 l'ing. Giovanna Baratta trasmette la relazione-certificato di collaudo statico.                      A seguito dell'invito del Commissario a relazionare sull'attività svolta, di cui alla nota prot. n. 4792 del 19/11/12, il RUP Espropri comunica, con nota n. 5355 del 14/12/12, di aver eseguito lo stato di consistenza ed occupazione temporanea delle aree oggetto di espropriazione nonché di aver calcolato l'indennità di espropriazione, di occupazione e di servitù da corrispondere ai proprietari delle aree espropriate</p>		SAL	LAVORI ULTIMATI  

<b>CT033</b>	<b>Piedimonte Etneo</b>	<b>Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa</b>						Importo ApQ	<b>€ 500.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 265 del 07/10/2011	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 36 del 25/01/2012	Importo dell'Impegno	€ 402.969,16		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 402.969,16</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	
								<b>€ 97.030,84</b>	

<b>CONVENZIONI</b>	DRPC CT
--------------------	---------

**Figure Tecniche**

RUP	Dott. Aldo Bonina (DRPC)	Nota di incarico	prot. n. 54711 del 20/12/2010	Supporto al RUP	Ing. Gioacchino Marino Antonino Sciuto	Geom.	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035316 del 08/09/2011
Progettista	DRPC CT	Nota di Incarico	prot. n. 364/UC del 12/10/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Dipartimento Protezione Civile Catania		Nota di Incarico	prot. n. 364/UC del 12/10/2010
Geologo		Determina di Incarico		RUP Espropri	Geom. Giuseppe Del Popolo UTC		Decreto Commissariale	Decreto Commissariale n. 211 del 06/09/2011
Direttore Lavori	Ing. Gioacchino Marino	Nota di conferimento incarico	prot. n. 035316 del 08/09/2011	Assistente al DL	Geom. Antonino Sciuto		Nota di conferimento incarico	prot. n. 035316 del 08/09/2011
Coord Sicurezza fase Esecuzione	DRPC CT	Decreto di nomina	prot. n. 364/UC del 12/10/2010					
Collaudatore Statico	Ing. Maurizio Artale	Nota di Incarico	prot. n. 294 del 31/01/2012	Decreto Conferma incarico	Decreto Commissariale n. 150 del 02/04/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ARCHAS s.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	<b>Decreto n. 303 del 03/11/2011</b>	data contratto	18/01/2012
contratto	28/04/2011	data conclusione lavori	15/03/2011			verbale inizio attività	<b>25/01/2012</b>	data conclusione lavori	09/08/2012

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 22/08/2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 303 del 03/11/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato stipulato in data 18/01/2012. I lavori sono stati avviati in data 25/12/2012 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto, era fissata entro il 22/07/2012; tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 31/07/2012, Il DRPC di Catania ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal direttore dei lavori ed il parere favorevole del RUP. Con nota prot.n. 3014 del 02.08.2012, il Dirigente del Servizio del DRPC di Catania ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia degli Ordini di Servizio del Direttore Lavori e del Verbale di Consegna della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, approvata con Decreto Commissario n. 409 del 02/08/2012. Con nota prot. n. 3265/UC del 30/08/2012, il RUP comunica l'ultimazione dei lavori, come accertato dal direttore dei lavori in data 09/08/2012. Il DRPC CT con nota prot. n. 5141 del 30/08/2013 trasmette la documentazione inerente lo Stato Finale e l'attestazione e certificato di regolare esecuzione.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
------------------------	---	-----	-----------------



CT034	Raddusa	Opere di consolidamento del versante						Importo ApQ	2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Roberto Antonio La Mastra	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012	Supporto al RUP	Ing. Federica Bottini		Decreto di incarico	Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012
Progettista	Comune	Nota di Incarico		Coord Sicurezza fase Progett.			Determina di Incarico	
Geologo		Determina di Incarico						
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL			Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina						
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 27/07/2011.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. 2277 del 26/10/2011, ha invitato il RUP a trasmettere all'ARTA la documentazione progettuale, al fine di avviare le procedure VIA/VAS.</p> <p>Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 3000/UC del 23/12/2011, ha ritenuto necessaria l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06, richiedendo la necessaria documentazione.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/06/2012, vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione per il parere dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS che attende dei chiarimenti sulle scelte progettuali, nonché dell'Isp. Ripartimentale delle Foreste di Catania.</p> <p>Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 2882/UC del 26/07/2012, ha comunicato la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06, esprimendo dubbi sulle scelte progettuali.</p> <p>Il Comune, ritenuto pertanto di dover modificare le scelte progettuali precedentemente adottate, ha chiesto, con nota acquisita al prot. n. 3254 del 29/08/2012, l'autorizzazione ad affidare all'esterno gli incarichi di progettazione, studio geologico, indagini geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 3380 del 10/09/2012, ha concesso la relativa autorizzazione, successivamente revocata, con nota prot n. 302/UC del 17/01/13, limitatamente all'incarico di progettazione, affidato invece, in forza della convenzione del 18/02/2011, ad Invitalia. Quest'ultimo incarico viene a sua volta revocato dal Commissario, con nota prot.482 del 23/01/13, in considerazione della nota del Comune, assunta al prot. n. 457/UC del 22/01/13, di comunicazione dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei servizi tecnici.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 2418 del 24/04/2013 comunica al Commissario che ha invitato il Capogruppo della R.T.P. a presentare nel più breve tempo possibile tutta la documentazione per la stipula del disciplinare d'incarico e che alla stessa saranno assegnati come da disciplinare trenta giorni di tempo per ottemperare alla progettazione esecutiva.</p> <p>Con nota prot. n. 3090 del 24/05/2013 il Comune trasmette al Commissario il Progetto Esecutivo.</p> <p>Il Commissario convoca una Cds per il giorno 04/06/2013 al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. N. 6441 del 28/10/2013 esaminati gli elaborati progettuali ritiene che non si debba attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità ambientale</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	--	-----	--------------------------------





CT036	Ramacca	Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato						Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto Commissariale n. 89 del 01/03/2012	Importo Finanziato	€ 1.176.008,88	Decreto di Impegno	Decreto Commissariale n. 458 del 12/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 951.340,42		
				Decreto di Impegno somme integrativo	n.830 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 46.634,65		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto Commissariale n. 170 del 03/08/2011	Importo Finanziato	€ 23.991,12	Decreto di Impegno indagini preliminari	n.224 del 14/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 19.088,12		
				Decreto di Impegno spese pubblicazione GURI	n.151 del 03/04/2012	Importo dell'Impegno	€ 958,14		
				Decreto di Impegno spese pubblicazione quotidiani	n. 266 del 08/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 3.115,75		
				Impegno e pagamento Commissione di Gara	n.334 del 10/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 307,93		
				Decreto di Impegno e pagamento contributo AVCP	n. 387 del 24/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.200.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 1.021.820,01</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA								
--------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

RUP	Geom.Salvatore Sottosanti (UTC)	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.136 del 20/07/2011	Supporto al RUP	Ing. Federica Bottini Rag. Domenica Patrizia Arcidiacono	Decreto di incarico	Decreto Commissariale n.136 del 20/07/2011
Progettista	INVITALIA	Ing. Fabio Ferla© Ing. Gianluca Coroneo Ing. Rossella Zumbè	Nota di Incarico	Prot. N. 255 del 08/03/2011	Coord Sicurezza fase Progett. INVITALIA	Ferla © Coroneo Zumbè	Nota di Incarico Prot. N. 255 del 08/03/2011
Geologo	INVITALIA	Dott. Geol. Matteo Del Mastro	Determina di Incarico	Prot. N. 255 del 08/03/2011			
Direttore Lavori	Ing. G. Coroneo	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.210 del 10/05/2012	Assistente al DL	Ing. R. Zumbè	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.210 del 10/05/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. D. Imbroglia	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.210 del 10/05/2012	Collaboratore Tecnico Amministrativo al D.L.	Geom. Domenico La Piana (in servizio presso l'UTC di Ramacca)	Decreto di nomina	Decreto Commissariale n.288/bis del 22/06/2012



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

CT036	Ramacca	<b>Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato</b>					Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Collaudatore Statico	LUIGI BOERI INGEGNERE & ASSOCIATI	Decreto di nomina	D.C. n. 312 del 06/07/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	LUIGI BOERI INGEGNERE & ASSOCIATI	Decreto di nomina	D.C. n. 312 del 06/07/2012	

INDAGINI preliminari affidate a:	I.GE.M. INDAGINI GEOLOGICHE MERIDIONALI s.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 224 del 14 settembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CO.E.S.I srl	Decreto Affidamento Lavori	n. 125 del 26/03/2012	data contratto	10/05/2012
contratto	21/09/2011	data conclusione lavori	21/11/2011			verbale inizio attività	08/06/2012	data presunta di termine lavori	21/03/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia.</p> <p>A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/09/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini Preliminari alla progettazione.</p> <p>A seguito della restituzione delle risultanze delle indagini, con nota acquisita al prot.n. 95 del 16/01/2012, la Soc. INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 89 del 01/03/2012.</p> <p>Con Decreto n. 125 del 26/03/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>In data 02/04/2012 si è emesso Decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dall'intervento.</p> <p>Il contratto è stato firmato in data 10/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 08/06/2012.</p> <p>Con Decreto n. 458 del 12/09/2012 si è preso atto della Perizia di Variante n. 1 migliorativa ed in diminuzione.</p> <p>A seguito di comunicazione del RUP in merito ad uno smottamento della parte superficiale del terreno con fuoriuscita di acqua di ignota provenienza, il Commissario, con nota prot. n. 4532 del 04/07/2012, ha richiesto ad Invitalia di predisporre un piano di indagini integrativo, successivamente acquisito al prot. n.2553 del 09/07/2012. Le indagini integrative sono state affidate dal RUP al Dott. Domenico Boso, come comunicato con nota acquisita agli atti al prot. n. 3055 del 06/08/2012. A seguito dell' espletamento delle indagini, così come attestato dal RUP con nota prot. 5292/UC del 12/12/12, e dalla nota tecnica integrativa del Geologo Dott. Boso, dalla quale si ravvisa "la necessità e l'urgenza di interventi mirati a stabilizzare il pendio ed evitare danni", il Comune ha chiesto, con nota prot. 4602/UC del 8/11/12, di utilizzare le economie risultanti dal ribasso d'asta per la risoluzione della problematica.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4670 del 13/11/2012, ha trasmesso copia della perizia di variante e suppletiva n. 2, di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 610 del 15/11/2012. <u>Con nota prot. 525 del 11/12/12 il Commissario ha invitato il Comune a presentare un progetto preliminare, con la quantificazione delle spese, per trasmetterlo al Comitato di Indirizzo e Coordinamento ai fini di un'eventuale riprogrammazione delle risorse residue dei lavori.</u></p> <p>I lavori - sospesi come da verbale del 19/12/2012, a causa dello spostamento, da parte dell'ENEL, dell'impianto di media tensione - sono stati ripresi il 15/01/2013, come da relativo verbale, trasmesso dal D.L. con nota n. 271/UC del 16/01/13.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	-----	-----------------




CT037	Randazzo	Opere di consolidamento del centro abitato						Importo ApQ	€ 960.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 24 FEB 2011</b>	note:	A seguito del Comitato del 24 Febbraio 2011 l'intervento transita dalla lettera B alla lettera A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	197 - 23/8/2011	Importo Finanziato	€ 960.000,00	Decreto di Impegno	83 del 27/02/2012	Importo dell'Impegno	€ 765.181,07		
				Decreto di Impegno spese pubblicazione GURI	336 del 28/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.042,01		
				Decreto di Impegno spese progettazione	388 del 19/12/2011	Importo dell'Impegno	€ 60.808,04		
				Decreto di Rimodulazione Impegno dopo PVS	553 del 24/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 102.248,40		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 960.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 929.279,52</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche									
RUP	Geom. Vincenzo Patorniti	Nota di incarico	Decreto n. 340 del 28 novembre 2011 (Rinuncia all'incarico con nota prtot. N. 2706 del 01.12.2011)	Supporto al RUP	Ing. Marco Calogero (FINO AL 29/01/2013)	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 363 del 5 dicembre 2011		
	Ing. Domenico Imbroglia	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 363 del 5 dicembre 2011						
Progettista	COMUNE	Ing. Antonino Romano	Nota di Incarico	Determina Sindacale n. 24 del 16/05/2007	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Romano Antonino	Nota di Incarico	Determina Sindacale n. 24 del 16/05/2007	
Geologo	Dott.ssa Geol. Sabrina Foti	Determina di Incarico	Determina Sindacale n. 18 del 10/05/2007 incarico studio geologico;	Consulente per le procedure espropriative	Ing. Antonino Romano	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 624 del 31 luglio 2013		
Direttore Lavori	Ing. Antonino Romano	Decreto di nomina	Decreto N. 374 del 13 dicembre 2011	Assistente al DL		Nota di Incarico			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonino Romano	Decreto di nomina	Decreto N. 374 del 13 dicembre 2011						
Collaudatore Statico	Ing. Clemente Francesco	Decreto di Incarico	Decreto N. 219 del 14 maggio 2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Clemente Francesco	Nota di Incarico	Decreto N. 219 del 14 maggio 2012		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	COTESP SRL	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n.333 del 24 novembre 2011	data contratto	29/11/2011
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	20-dic-11	data conclusione lavori	07-set-12



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

CT037	Randazzo	Opere di consolidamento del centro abitato	Importo ApQ	€ 960.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24/11/2011 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 29/11/2011.                      La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto era fissata entro il 18/04/2012;                      A seguito del verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata, con possibili ripercussioni sul buon andamento dei lavori, è emersa la necessità di una Perizia di Variante e suppletiva, trasmessa dal DL con nota prot. 1387/UC del 23/04/2012, per la cui approvazione si è tenuta apposita Conferenza dei Servizi in data 16.05.2012.                      La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.236 del 24/05/2012 ed a seguito della rimodulazione dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori, il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al 09/09/2012. I lavori si sono conclusi in data 07/09/2012.                      Il RUP Ing. Domenico Imbroglia, a seguito della nota del Comune prot/UC n. 3719 del 27/09/2012, di segnalazione di alcune carenze circa la corretta e completa esecuzione dei lavori, ordina, con nota prot. 3882 del 5/10/12, ulteriori lavori, concedendo altri 15 gg., in aggiunta a quelli concessi dal D.L. nel certificato di ultimazione lavori del 12.09.2012.</p>		SAL	LAVORI ULTIMATI  



CT038	Santa Venerina	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago						Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento acquisizione progettazione	Decreto Commissariale n. 862 del 14/10/2013	Importo Finanziato	€ 48.721,92				Economie da finanziamento		
Decreto di Finanziamento acquisizione studio geologico	Decreto Commissariale n. 863 del 14/10/2013	Importo Finanziato	€ 47.689,67				Eventuali Economie da ribasso		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 96.411,59</b>						

**Figure Tecniche**

RUP	-	Incarico conferito tramite:	-	Supporto al RUP	Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune.                      Con nota acquisita al protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a ricordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con Decreto Commissariale n. 862 e 863 del 14/10/2013 vengono acquisite la progettazione esecutiva e lo studio geologico.</p>	SAL	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	-----	------------------------------------



<b>CT039</b>	<b>Sant'Agata Li Battiati</b>	<b>Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi</b>						Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	<b>B</b>	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:			
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
Decreto di finanziamento acquisizione progettazione	Decreto n. 292 del 18/04/2013	Importo Finanziato	€ 43.314,79	Decreto di Impegno acquisizione progettazione	Decreto N. 367 del 20/05/2013	Importo dell'impegno	€ 43.314,79		
Decreto di finanziamento acquisizione studio geologico	Decreto n. 293 del 18/04/2013	Importo Finanziato	€ 29.664,42	Decreto di Impegno acquisizione studio geologico	Decreto N. 366 del 20/05/2013	Importo dell'impegno	€ 29.668,42		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 72.979,21</b>			<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 72.983,21</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Adele Giusto	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 314 del 07/05/2013	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	COMUNE (Ing. Pietro Agnello, Studio Di Mino Ing. Ass., Ing. Vincenzo Miceli)	Incarico conferito tramite:	Provvedimento Dirigenziale n. 542 R.G. del 21/05/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	Provvedimento Dirigenziale n. 552 R.G. del 27/05/2010			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La progettazione è stata redatta dal Comune.</p> <p>Con nota acquisita al protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.</p> <p>Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'Ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il progetto esecutivo. I progettisti trasmettono le integrazioni al piano di sicurezza richieste in sede di CdS tenutasi in data 04/06/2013, pertanto sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento</p>	SAL	<b>ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE</b>
------------------------	---	-----	---------------------------------------

TP168	Erice	Consolidamento costone roccioso – Zona Crocifissello						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	-	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 223 del 16/05/2012	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	n. 90 del 08/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 389.833,73		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>	<b>€ 500.000,00</b>	Decreto impegno e pagamento MAV	Decreto Commissariale n. 577 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Integrazione Impegno	n. 427 del 12/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 40.103,16		
						<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 430.161,89</b>		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	€ 0,00	

<b>CONVENZIONI</b>	DRPC
--------------------	------

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Decreto di incarico	Dcereto Commissariale n.107 del 15/03/2012	Supporto al RUP	Ass. Amm.vo Antonina Minaudo	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012
Progettista	DRPC TP Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio	Nota di Incarico	nota prot. N. 478 del 03 nov 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio (DRPC TP)	Nota di Incarico	nota prot. N. 478 del 03 nov 2011
Geologo	Dott. Geol. Giuseppe Baiata	Determina di Incarico	Determina Sindacale n. 42 del 20/08/2010	direttore operativo	Funz. Dir.Giovanni Basciano	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012
Direttore Lavori	Arch. Vincenzo Loria	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012	ispettore di cantiere	Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo	Nota di Incarico	nota prot. n. 56813 del 24/08/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico	Ing. Antonio Minutella	Decreto di Incarico	n. 07 del 08/01/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	428 - 23/08/2012	data contratto	09/10/2012
contratto	data conclusione lavori		Renzo Costruzioni srl	verbale inizio attività	28/11/2012	data presunta di termine lavori	25-feb-13

<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di TP.                      Con nota prot. 1541 del 23/08/2011, il DRPC TP ha trasmesso gli elaborati progettuali, successivamente integrati dalla documentazione trasmessa con nota prot. n. 2106/UC del 14/10/2011.                      In sede di Conferenza dei Servizi del 28/02/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed il DRPC TP, con nota n. 1635/UC del 11/05/2012, trasmette la verifica del progetto esecutivo, il rapporto conclusivo sulla verifica e la validazione dello stesso.                      Con Decreto Commissariale n. 223 del 16/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.                      Con Decreto Commissariale n. 428 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.                      Con nota acquisita al prot. n. 3219/UC del 24.08.12, il RUP ha nominato un nuovo gruppo di Direzione Lavori.                      Il contratto è stato stipulato in data 09/10/2012 ed i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2012 e dovranno concludersi entro il 25/02/2013.                      Il Commissario, con Decreto n. 90 del 08/01/2013, ha preso atto della perizia di variante e suppletiva - approvata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs163/2006, dal DRPC con determina n. 122 del 20/12/2012 - provvedendo all'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 389.833,73                      L'ing. Antonio Minutella in data 07/02/2013 effettuerà la visita di collaudo.</p>	SAL	LAVORI CONCLUSI
--	-----	-----------------



TP169	Mazara del Vallo	Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture – Zona Tonnarella						Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	-	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 216 - 11/05/2012	Importo Finanziato	€ 800.000,00	Decreto di Impegno	603 - 13/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 741.500,00		
		TOTALE FINANZIATO	€ 800.000,00	rimodulazione impegno	618 25/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 800.000,00	Economie da finanziamento	
								Economie da ribasso	
								€ 0,00	

CONVENZIONI	Prov.to Int.le OO.PP.
-------------	-----------------------

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Pietro Viviano	Nota di Incarico	prot. N. 515/UC del 04/11/2010	Supporto al RUP		Nota di Incarico	
Progettista	Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	Nota di Incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Geol. Santi Eugenio Diliberto	Nota di Incarico	prot. N. 535 del 19/04/2011				
Direttore Lavori	Ing. Leonardo Tallo	Nota di Incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010	Assistente al DL	funzionario Provveditorato OO.PP. Ufficio genio civile OO.MM.	Nota di Incarico	prot. N. 303 del 28/09/2010
	Geom. Daidone (in sostituzione dell'Ing. Tallo)						
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 176 DPR 207/2010)

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SC A.R.L.	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot. n. 1539 del 23/08/2011. A seguito della Conferenza dei Servizi del 20.10.2011 (nella quale è stato esposto il progetto generale dell'intervento che però presentava un importo delle opere da realizzare superiore a quanto stanziato dall'APQ) e del 29.11.2011 (nella quale è stato discusso uno stralcio funzionale il cui importo risultava conforme alle somme stanziato dall'APQ) sono stati acquisiti tutti i pareri, di cui alcuni con prescrizioni, necessari alla realizzazione dell'intervento dello Stralcio Funzionale.</p> <p>In virtù della Convenzione stipulata con il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria, le procedure di affidamento dei lavori sono state espletate dallo stesso Ente, che tra l'altro, con verbale del 03/11/2011, ha dichiarato la somma urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 216 del 11/05/2012 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo. Con nota acquisita agli atti al prot. n.1805 del 22/05/2012, il Comune ha comunicato l'avvenuta consegna dei lavori da parte dell'Ufficio Opere Marittime in data 26.04.2012, nelle more della stipula del contratto di appalto.</p> <p>Con nota acquisita al prot n. 4619 del 09/11/2012, il RUP ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del D.Lgs. 163/2006 munita del Decreto Dirigenziale di approvazione in linea tecnica. L'Ing. Pietro Viviano ha comunicato che i lavori sono stati ultimati in data 24/06/2013 e che non essendoci opere strutturali potrà procedere all'emissione del certificato di regolare esecuzione a firma del D.L. ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.Lgs. 163/2006</p>	SAL	LAVORI CONCLUSI
-----------------	--	-----	-----------------

<b>TP172</b>	<b>San Vito Lo Capo</b>	<b>Collocazione rete paramassi – Zona Makari</b>						Importo ApQ	<b>€ 450.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	-	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 62 del 14 febbraio 2012	Importo Finanziato	€ 450.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 401 del 02/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 366.819,04		
				Decreto di Impegno contributo AVCP	Decreto n. 387 del 24/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 450.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 367.044,04</b>		
							Economie da finanziamento		
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	

<b>CONVENZIONI</b>	DRPC
--------------------	------

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 70 del 15 febbraio 2012	Supporto al RUP	Ass. Amm.vo Giuseppa Giacalone	Nota di Incarico	nota DRPC acquisita al prot. N.983 del 23/03/2012
Progettista	DRPC TP Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio	Nota di Incarico	prot. N. 477 del 03/11/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Arch. Maria Di Girolamo Ing. Gioacchino Lo Buglio (DRPC TP)	Nota di Incarico	prot. N. 477 del 03/11/2010
Geologo	Dott. Geol. Caterina Caradonna	Nota di Incarico da repertorio DRPC TP	Rep. N. 41 del 08/02/2011	direttore operativo	Funz. Dir. Geom. Rosario Grammatico	Nota di Incarico	nota DRPC acquisita al prot. N.983 del 23/03/2012
Direttore Lavori	Arch. Maria Di Girolamo (DRPC TP)	Nota di Incarico	nota DRPC acquisita al prot. N.983 del 23/03/2012	ispettore di cantiere	Funz. Dir. Geom. Pasquale Amodeo	Nota di Incarico	nota DRPC acquisita al prot. N.983 del 23/03/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico	Arch. Stefano Lucido	Decreto di Incarico	n. 575 del 06/11/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

**PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 146 DPR 554/99)**

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Torsten Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto Commissariale N. 102 del 13/03/2012	data contratto	10/05/2012
contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	20/08/2012	data presunta di termine lavori	18-nov-12



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



TP172	San Vito Lo Capo	Collocazione rete paramassi – Zona Makari	Importo ApQ	€ 450.000,00
		<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di TP che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al prot. n. 1540 del 23/08/2011.</p> <p>Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 62 del 14/02/2012.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 102 del 13/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 114 del 19 marzo 2012 si è autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza.</p> <p>Il Contratto è stato sottoscritto in data 10/05/2012.</p> <p>In data 20/08/2012 sono stati avviati i lavori.</p> <p>Il RUP, con nota n. 4571 del 07/11/2012, ha trasmesso la determina n. 111 del 29/10/2012 di approvazione della 1° perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 9 art. 161 del D.P.R. 207/2010, e la relazione generale dell'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 693 del 12/12/2012 il Commissario ha preso atto della PVS redatta dalla D.L. e approvata dal RUP ai sensi dall'art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 163/2006, rimodulando l'impegno di spesa.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 687 del 31/01/2013 il RUP ha trasmesso i documenti contabili relativi al SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 16/01/2013 e il certificato di ultimazione dei lavori.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2290 del 17/04/2013, il DL trasmette alla Struttura Commissariale n. 2 copie della Relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art. 6 della L. 1086/71.</p> <p>IL RUP Ing. Giovanni Indelicato con nota prot. n. 3264 del 04/06/2013 trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI

<b>TP189</b>	<b>Mazara del Vallo</b>	<b>Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale</b>						Importo ApQ	<b>€ 2.000.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>AdP Integrativo</b>	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di finanziamento per piano di caratterizzazione ambientale	Decreto n. 485 del 27/06/2013	Importo Finanziato	€ 398.918,85	Decreto di impegno e pagamento per piano di caratterizzazione ambientale	Decreto n. 485 del 27/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 398.918,85		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>				<b>TOTALE IMPEGNATO</b>			
							Economie da ribasso	<b>€ 0,00</b>	

<b>CONVENZIONI</b>	Prov.to Int.le OO.PP.							
--------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Pietro Viviano Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	Nota di Incarico	D. C. n. 244 del 03/04/2013	Supporto al RUP		Nota di Incarico	
Progettista	Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	Nota di Incarico	prot. N. 2959 del 20/12/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico	
Geologo		Nota di Incarico					
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		<b>AFFIDATARIA</b> Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p><i>Il Commissario, con nota prot. n. 2728 del 05/12/2011, ha comunicato al Provveditorato Interregionale OOPP Sicilia Calabria - Ufficio IV - l'avvenuto inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo del maggio 2011, invitandolo a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni.</i></p> <p><i>Il Provveditorato - ufficio IV OO.MM per la sicilia, con nota assunta al prot. n.2926 del 20.12.2011, ha confermato la propria disponibilità a redigere la progettazione dell'intervento.</i></p> <p><i>Il Commissario, con nota prot. n. 3299 del 03/09/2012, stante la mancata ricezione del progetto esecutivo, ne sollecita la trasmissione al Provveditorato che vi tempera con nota 3683 del 25/09/2012, proponendone l'affidamento allo IAMC-CNR di Capo Granitola.</i></p> <p><i>Conseguentemente il Provveditorato, con nota prt. 4919/UC del 23/11/12, ha trasmesso lo schema di convenzione aggiornato con IAMC-CNR di Capo Granitola per le indagini preliminari, attendendo la necessaria autorizzazione alla sottoscrizione.</i></p> <p><i>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 580 del 29/01/2013 il Dott. Giorgio Tranchida dell'IAMC ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il piano di caratterizzazione dell'area del Porto Canale di Mazara del Vallo.</i></p> <p><i>A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti i pareri relativi al piano di Caratterizzazione ambientale propedeutico ai lavori da effettuare nell'ambito dell'intervento TP 189 "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale", ad eccezione del parere dell'ISPRA.</i></p> <p><i>In data 07/10/2013 avranno inizio i lavori per il campionamento di sedimenti all'interno dell'area portuale di Mazara del Vallo</i></p>				SAL	<b>PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO</b>
------------------------	---	--	--	--	-----	---

<b>TP190</b>	<b>San Vito Lo Capo</b>	<b>Consolidamento del tratto di costa</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.350.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM	INVITALIA						
--------------------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

Figure Tecniche							
RUP		Incarico conferito tramite:		Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	INVITALIA	Incarico conferito tramite:	prot. n. 3260/UC del 04/06/2013	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	CGIAM	Incarico conferito tramite:	nota n.3339 del 06/09/2012			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori		verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2372 l'ARTA ha comunica al Comune di San Vito Lo Capo che l'Ufficio del Commissario Starordinario Delegato è stato individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento, invitandolo a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Data l'impossibilità dell'UTC a redigere il progetto esecutivo, il Commissario, con nota prot.n. 3015 del 02.08.2012, ha portato a conoscenza l'Ente che sarà la struttura commissariale a redigere il progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, inserendo l'intervento - TP 190 B S. Vito Lo Capo e, quindi, incaricando gli stessi per la redazione dello studio geologico.</p> <p>Con nota prot. n. 3260 del 04/06/2013 si incarica la Società Invitalia per la redazione della progettazione esecutiva dell'intervento.</p>				SAL	<b>PROGETTAZIONE IN CORSO</b>
------------------------	--	--	--	--	-----	-------------------------------



EN042	Centuripe	Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario						Importo ApQ	€ 770.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 692 del 12/12/2012	Importo Finanziato	€ 770.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 542 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 598.087,00		
		<b>TOTALE FINANZIATO</b>				<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 598.087,00.</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

## Figure Tecniche

RUP	Geom. Salvatore Di Benedetto	Decreto di Nomina	D.C. n. 385 del 24/07/2012	Supporto al RUP	Ing. Mario Giuseppe Palazzolo	Decreto di Nomina	D.C. n. 385 del 24/07/2012
Progettista	COMUNE	Ing. Claudio Faranna	Incarico conferito tramite:	determina sindacale n. 08 del 12/02/2009	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Giancarlo Campagna	Incarico conferito tramite: determina sindacale n. 10 del 25/02/2009
Geologo			Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:
Direttore Lavori	Ing. Claudio Faranna	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 232 del 27/03/2013	Assistente al DL			Incarico conferito tramite:
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Claudio Faranna	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 232 del 27/03/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Ugo Maria Alongi	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 3253 del 04/06/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo			Incarico conferito tramite:

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	C.S. COSTRUZIONI S.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	n. 263 del 08/04/2013	data contratto	
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	24/05/2013	data presunta di termine lavori	06/11/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune di Centuripe a libero professionista esterno. Con nota acquisita al prot. n. 1438 del 26/04/2012, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 26/09/2012 il Commissario, con nota prot.n. 3937 del 09/10/2012, ha invitato il RUP a porre in essere le attività necessarie all'approvazione del progetto, propedeutiche all'emissione del Decreto di Finanziamento.</p> <p>Con nota 4881 del 22/11/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione delle verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 692 del 12/12/2012 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 263 del 08/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa C.S. COSTRUZIONI S.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,0897 %.</p> <p>In data 24/05/2013 è avvenuta la consegna dei lavori e l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro 181 giorni naturali e consecutivi, quindi entro il 20/11/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 542 del 10/07/2013 si impegnano le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 598.087,00.</p> <p>Con nota prot. n.6668 del 07/11/2013 l' Impresa C.S. Costruzioni srl comunica che in data 06 novembre 2013 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.</p>						SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----------------





EN044	Gagliano Castelferrato	Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga						Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di finanziamento indagini preliminari	n. 98 del 21/06/2011	Importo Finanziato	€ 22.300,26	Decreto di Impegno indagini preliminari	n. 141 del 21/07/2011	Importo dell'Impegno	€ 16.348,31		
Decreto di finanziamento indagini preliminari integrative	n. 314 del 11/11/2012	Importo Finanziato	€ 47.950,86	Decreto di Impegno e pagamento indagini preliminari integrative	n. 207 del 10/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 34.736,30		
				Decreto di disimpegno somme	n. 567 del 31/10/2012	Importo del disimpegno	€ 1.094,63		
		<b>TOTALE FINANZAMENTI</b>	<b>€ 70.251,12</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 49.989,98</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

CONVENZIONI INVITALIA


## Figure Tecniche

RUP	Geom. Michele Corrente	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 90 del 14.6.2011	Supporto al RUP	Arch. Diego Mammo Zagarella	Nota di Incarico	Decreto Commissariale n. 90 del 14.6.2011		
Progettista	INVITALIA	Zumbè © Coroneo Imbroglia Grassi	Nota di Incarico	prot. N. 647 del 09/03/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	INVITALIA	Zumbè © Coroneo Imbroglia Grassi	Nota di Incarico	prot. N. 647 del 09/03/2011
Geologo			Nota di Incarico						
Direttore Lavori			Nota di Incarico		Assistente al DL			Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Nota di Incarico						
Collaudatore Statico			Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	GIA EXPLORING SAS GEOMERID SRL	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 141 del 22 lug 2011 Decreto 361 del 2 dicembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto
contratto	26/07/2011 5/12/2011	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1


EN044	Gagliano Castelferrato	<b>Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga</b>	Importo ApQ	€ 800.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione dell'intervento è stata affidata ad INVITALIA S.p.A.            A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 141 del 22/07/2011 è stata disposta l'Aggiudicazione Definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione.            A seguito sia della consegna delle risultanze delle indagini geognostiche che dei successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati della progettazione e dalle osservazioni formulate del geologo, l'area di intervento è risultata essere notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dal PAI in prima istanza.            Alla luce delle criticità emerse, con nota del Commissario n. 2440 del 09/11/2011, sono state autorizzate ulteriori indagini preliminari integrative delle precedenti, affidate a seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 361 del 02/12/2011.            Il Progetto esecutivo è stato trasmesso da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 779 del 09/03/2012. In sede di Conferenza dei Servizi del 19/03/2012, in cui sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati, è emerso che gli importi stimati nel progetto esecutivo risultano superiori a quelli contenuti nell'Accordo di Programma. La problematica è stata discussa in sede di Comitato del 18/05/2012 che si è riservato di valutarla nella futura programmazione.            A seguito delle determinazioni del Comitato potranno essere avviate le procedure di gara.            Il Comune ha trasmesso alla struttura commissariale la nota prot. n. 42660 del 19/07/2012 dell'ARTA Serv. 3 con cui è stata comunicata la modifica del Piano Stralcio del PAI relativo ai dissesti di C.da Fontanelle-Urga portando il grado di pericolosità da P0 a P3. La struttura Commissariale, con nota prot. n. 3067 del 07.08.12, a trasmesso quanto sopra al Comitato di Indirizzo e Controllo del Ministero.            Al fine di risolvere le problematiche relative all'intervento, gli uffici dell'ARTA Serv. 3, hanno invitato il Comune, il DRPC e l'ufficio del Commissario a partecipare alla riunione di giorno 08/10/2013 presso i propri uffici.</p>		SAL	<p>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</p> 



EN047	Regalbuto	Opere di consolidamento del centro abitato						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	A seguito del comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n.30 del 16/01/2013	Importo Finanziato	€ 1.453.710,54	Decreto di Impegno	Decreto n. 771 del 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.097.217,01		
				Decreto di impegno e pagamento spese di pubblicazione quotidiani	Decreto n. 401 del 05/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.539,12		
				Decreto di Impegno e pagamento GURI	Decreto n. 317 del 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.021,04		
				Decreto di Impegno e pagamento commissione gara	n. 571 del 16/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.486,56		
				Decreto di Impegno e pagamento AVCP	n. 572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.453.710,54</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.101.638,73</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Vito Palazzolo (Responsabile area tecnica)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 355 del 17/07/2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Decreto di Incarico	Decreto Commissariale n. 355 del 17/07/2012	
Progettista	COMUNE	Ing. Giglio Ignazio Geom. Arnone Giuseppe	Determina di incarico	Delibera di Giunta Municipale n.224 del 09 maggio 1988	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Giglio Ignazio e Geom. Arnone Giuseppe	Determina di incarico Delibera di Giunta Municipale n.224 del 09 maggio 1988	
Geologo	Geologi Alberto Unti e La Spina Giuseppe	Determina di Incarico	Delibera di Giunta Municipale n.224 del 09 maggio 1988 Delibera G.C. n.94 del 24/05/2012 revoca incarico Dott. Geol. Alberto Unti	Geotecnico	Geologi Alberto Unti e La Spina Giuseppe e Ing. Giglio Ignazio	Determina di Incarico	Delibera di Giunta Municipale n.224 del 09 maggio 1988 Delibera G.C. n.94 del 24/05/2012 revoca incarico Dott. Geol. Alberto Unti	
Direttore Lavori	Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo	Decreto di Incarico	Decreto n. 484 del 27/06/2013	Assistente al DL		Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Giuseppe Arnone	Decreto di Incarico	Decreto n. 484 del 27/06/2013					
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -CCC Societa' Cooperativa	Decreto Affidamento Lavori	n. 262 del 08/04/2013	data contratto
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori

EN047	Regalbuto	Opere di consolidamento del centro abitato	Importo ApQ	€ 1.500.000,00
STATO DELL'ARTE	<p><i>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Regalbuto (EN).</i></p> <p><i>A seguito di richiesta del Commissario, in data 7/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina, prevedendo l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale del 01/08/2012 è stato acquisito il progetto dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</i></p> <p><i>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3361 del 07/09/2012, il gruppo di progettazione ha trasmesso gli elaborati integrativi redatti in aderenza alle prescrizioni richieste dall'ANAS in sede di CdS del 24/08/2012. Il Comune con nota prot. n. 4940 del 26/11/2012 ha trasmesso il Verbale di Verifica e Validazione dell'intervento.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 30 del 16/01/2013 è stato finanziato l'intervento.</i></p> <p><i>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 262 del 08/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI -CCC Societa' Cooperativa che ha offerto un ribasso pari al 32,1923 %.</i></p> <p><i>Il Commissario con nota prot. n .5558 del 17/09/2013 chiede al comune di indicare un nominativo di un tecnico interno al proprio UTC a cui potere affidare l'incarico di responsabile per le procedure espropriative.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 771 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento. Relativamente alle procedure espropriative è stato redatto dalla struttura commissariale il decreto di occupazione temporanea d'urgenza ed è stata conseguenzialmente effettuata la consegna dei lavori.</i></p>		SAL	INIZIO DEI LAVORI  

EN175	Barrafranca	Mitigazione rischio idrogeologico (zona a monte dell'intervento già finanziato con Accordo di Programma del 30 marzo 2010)						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 MAR 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	352 - 5/12/2011	Importo Finanziato	€ 1.500.000,00	Decreto di Impegno	245 - 28/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.208.482,15		
				Decreto di Impegno Pubblicazione GURI	Decreto Commissariale n. 19 del 18/01/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.188,78		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	Decreto Commissariale n. 95 del 07/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.210.270,93</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso	€ 0,00	

## Figure Tecniche

RUP	Arch. Francesco Costa	Nota di incarico	Decreto Commissariale n. 335 del 28.11.2011	Supporto al RUP	geom Nicolicchia e geom Ferrante	Nota di Incarico	Decreto n. 31 del 23 gennaio 2012
Progettista	COMUNE Arch. Salvatore La Terra	Nota di Incarico	Determina Sindacale n. 4 del 29/01/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Comune	Nota di Incarico	
Geologo	Dott. Geol. Salvatore Palillo	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 7 del 01/02/2010			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Arch. Salvatore La Terra	Nota di Incarico	Decreto n. 45 del 01 febbraio 2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Salvatore La Terra	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 45 del 01 febbraio 2012				
Collaudatore Statico	Ing. Clemente Francesco	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 218 del 14/05/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Clemente Francesco	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 218 del 14/05/2012
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.L.P. Srl	Decreto Affidamento Lavori	n. 10 del 16 gennaio 2012	data contratto 26/01/2012
Contratto	data conclusione lavori				verbale inizio attività	23/03/2012	data presunta di termine lavori 15/03/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione degli interventi è stata affidata dal Comune di Barrafranca a tecnici professionisti esterni. Con nota acquisita al prot. n. 425 del 05/04/2011, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.930.000,00 e quindi per un importo superiore a quanto stanziato dall'APQ (€ 1.500.000,00).</p> <p>Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 743 del 25/05/2011, uno stralcio funzionale esecutivo di importo pari a quello dell'Accordo di Programma, che però risulta redatto ai sensi di normativa obsoleta, così come evidenziato dal Commissario con nota prot. 1436 del 05/08/2011. Il progetto esecutivo, rimodulato ai sensi della vigente normativa, è stato trasmesso dal Comune, con nota acquisita al prot. n. 2117 del 18/10/2011, e finanziato dal Commissario con Decreto n. 352 del 05/12/2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 10 del 16/01/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, della durata di 357 giorni naturali e consecutivi, avviati in data 23/03/2012.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1977 del 04/06/2012, il D.L. comunica che in data 22/05/2012 sono stati sospesi i lavori.</p> <p>In riscontro alla nota prot. n. 3107 del 09/08/2012 in cui il Commissario chiede di notificare in merito allo stato di avanzamento dell'intervento, il RUP ha sollecitato, con nota acquisita al prot. n. 3180 del 23/08/2012, la DL a produrre apposita perizia di variante al fine di consentire la ripresa dei lavori.</p> <p>In data 17/10/2012 il DL, con nota assunta al prot.n. 4135 in pari data, ha trasmesso la Perizia di Variante in corso d'opera del 1° Stralcio Funzionale</p> <p>In data 11/12/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, in cui sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 1014 del 18/02/2013 trasmette il parere tecnico n. 1 del 07/02/2013 di approvazione della perizia di variante già anticipato via email.</p> <p>In data 26/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei Lavori.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	-----	----------------



<b>CL017</b>	<b>Butera</b>	<b>Consolidamento centro abitato</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.200.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato	-	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Filippo Trainiti	Incarico conferito tramite:	-	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori


STATO DELL'ARTE	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2364 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3086 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto corredato della documentazione amministrativa.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, a seguito della documentazione integrativa richiesta, ha trasmesso in data 17 ottobre 2013 il parere di coerenza al PAI favorevole con prescrizioni.</p>	SAL	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	-----	------------------------------------

<b>CL018</b>	<b>Butera</b>	<b>Opere di consolidamento pendici del centro Storico</b>						Importo ApQ	<b>€ 800.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010	note:	Importo Rimodulato	€ 800.000,00	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato	-	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

**Figure Tecniche**

RUP	-	Incarico conferito tramite:	-	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2365 del 27/06/12, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3085 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato della documentazione amministrativa.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi sul progetto generale preliminare di giorno 10/07/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari.</p>	SAL	 ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
------------------------	---	-----	---

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

CL019	Caltanissetta	<b>Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della colline Sant'Anna, centro storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato</b>				importo AdQ	€ 4.160.000,00	Importo Rimodulato	
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 MAR 2011		note:		
Decreto di finanziamento	-	Importo Finanziato	-	Decreto di impegno	-	importo dell'impegno	-	eventuali economie	

CONVENZIONI

Figure Tecniche

RUP	Arch. Armando Amico Dirigente dell'UTC	Incarico conferito tramite	D.C. n. 556 del 24/10/2012	Supporto al RUP	Geom. Nicola Giovanni Buffone (UTC Caltanissetta)	Incarico conferito tramite	D.C. n. 556 del 24/10/2012
				Progettista	Ing. E. Garito (UTC Caltanissetta)	Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico	
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Collaudatore Statico		Nota di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari	Decreto di			Decreto Affidamento		data contratto	
contratto	data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è affidata al Comune.</p> <p>In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 marzo 2011, l'intervento transita all'ARTA (B).</p> <p>Durante la riunione del 07/05/2012, si forniscono indicazioni al Comune in merito ad alcuni adeguamenti del progetto.</p> <p>L'ARTA, con nota acquisita al prot. n.1939 del 31/05/2012, trasmette al Commissario, individuato come Ente Beneficiario, tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento.</p> <p>Con note prot. n. 1258 del 13/06/2012 e n.2334 del 26/06/2012, il Commissario sollecita il Comune alla trasmissione degli elaborati progettuali, adeguati alle richieste di cui alla riunione del 07/05/12.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2873 del 25/07/2012, trasmette il progetto stralcio funzionale dell'intervento di importo pari a quanto previsto dall'AdP.</p> <p>Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del Commissario (acquisito al prot. n.2997 del 02/08/2012).</p> <p>Il RUP, in data 19/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'estratto della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 della verifica di assoggettabilità a V.I.A.</p> <p>A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al progetto generale, ad eccezione del parere dell'ARTA Serv.3, che si riserva di produrre entro 7gg il parere su problematiche attinenti il concetto di pericolosità geologica per cause profonde, per il quale si rende necessario uno studio investigativo e di monitoraggio.</p> <p>In data 14/11/2012, con nota prot.n. 4696, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con prescrizioni, di coerenza al PAI.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 4970 del 27/11/2012 trasmette il progetto di 1° stralcio esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri ad eccezione del parere ARTA Serv.3 che ha richiesto le integrazioni al progetto stralcio esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni per l'emissione del parere di competenza.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 1340 del 04/03/2013 trasmette gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS e in data 13/03/2013 con nota prot. n. 1571 l'ARTA Serv. 3 trasmette il parere favorevole di coerenza al PAI.</p>	SAL	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE
-----------------	--	-----	--------------------------------

CL020	Serradifalco	<b>Progetto per lo studio ed il monitoraggio dell'area a rischio "R4" interessata da cavità sotterranee e perimetrata con il dissesto 063-2SR-082 nel comune di Serradifalco (CL)</b>			importo AdQ	€ 1.700.000,00	Importo Rimodulato	€ 0,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria APQ	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	INTERVENTO REVOCATO	
Decreto di finanziamento		Importo Finanziato	-	Decreto di impegno	importo dell'impegno	-	eventuali economie	

CONVENZIONI	INVITALIA
-------------	-----------

RUP	Arch. Giampiero Di Magro	Nota di Incarico	D.C. n. 299 del 27.06.2012	Supporto al RUP	-	Nota di Incarico	
				Progettista	INVITALIA	Ing. Gianluca Coroneo Arch. Fabio Pulizzi Ing. Alberto Peligra Dott. Geol. Gianluca Sabatini	prot. n. 1829 del 21/09/2011
Coord Sicurezza fase Progett.		Nota di Incarico		Coord Sicurezza fase Esecuzione		Nota di Incarico	
Direttore Lavori		Nota di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Collaudatore Statico		Nota di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Nel corso della riunione del 15/09/2011 il Comitato, su proposta del Commissario, dispone la revoca del finanziamento e contestualmente incarica il Commissario della predisposizione di un piano di monitoraggio, da sottoporre all'ARTA per il relativo finanziamento a gravare sulla linea 2.3.1,3 PO FERS 2007-2013. Il Comitato si riserva la possibilità di rivalutare il progetto a seguito dell'avvenuto monitoraggio.</p> <p>Il Commissario, con nota prot 1829 del 21 set 2011, incarica INVITALIA della redazione e realizzazione del piano di monitoraggio dell'area R4 ricadente nel centro abitato del Comune di Serradifalco.</p> <p>Con nota prot n. 2360 del 27/06/2012 il Commissario affida le attività di consulenza geologica necessaria all'attività di progettazione dello studio e monitoraggio dell'intervento ad un funzionario della Struttura.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot.n.2782 del 18/07/2012, IAP trasmette gli elaborati progettuali per lo "STUDIO ED IL MONITORAGGIO DELL'AREA A RISCHIO "R4" INTERESSATA DA CAVITA' SOTTERRANEE E PERIMETRATA CON IL CODICE DI DISSESTO PAI 063-2SR-082 NEL COMUNE DI SERRADIFALCO", trasmessi dal Commissario all'ARTA Serv.3 con nota prot. n. 2807 del 20/07/2012</p>				SAL	INTERVENTO REVOCATO
-----------------	---	--	--	--	-----	---------------------

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

AG001	Agrigento	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato					Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Corso del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera A per un importo pari a € 1.520.000 Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento passa sotto la copertura finanziaria del Ministero per l'intero importo (trasferiti anche i restanti 480.000)	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno	n. 576 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 534.077,76	
Decreto di Finanziamento indagini	n.394 del 21/12/2011	Importo Finanziato	€ 55.840,00	Decreto di Impegno e Pagamento indagini preliminari	n. 446 del 06/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 44.070,45	
Decreto di Finanziamento Lavori di somma urgenza	n. 639 del 22/11/2012	Importo Finanziato	€ 683.300,00	Decreto di impegno pagamento AVCP	n. 202 del 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00	
				Decreto di Impegno pagamento commissione di Gara	n.213 del 25/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 740,47	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 739.140,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 579.113,68</b>	
								Economie da finanziamento
								Eventuali Economie da ribasso

<b>CONVENZIONI</b>	GC
--------------------	----

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC AG)	Nota di Incarico	n.1344/UC del 01/08/2011	Supporto al RUP	Geom. Francesco Mirabelli		
Progettista	GC AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011
Geologo	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011	RUP Espropri	Avv. Antonio Insalaco (Comune Ag) con il supporto dell' Arch. Elvira Quintini (Comune Ag)	Decreto di Nomina	D.C. n. 887 del 21/10/2013
Direttore Lavori	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011	Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Genio Civile AG	Nota di Incarico	n.124997 del 26/07/2011				
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Forte	Incarico conferito:	D. C. n. 156 del 06/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID Srl	Determina di affidamento INDAGINI	Determina del 02/12/2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CO.GE.MA.LA. S.r.l. (Lavori di estrema urgenza)	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 680 del 10/12/2012	data contratto	11/12/2012
contratto		data conclusione lavori	03/06/2012			verbale inizio attività	12/12/2012	data termine lavori	08/08/2013



UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 “per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010”  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1

AG001	Agrigento	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	Importo ApQ	€ 2.000.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Agrigento il quale, a seguito di gara del 25/11/ 2011, ha affidato i lavori relativi alle indagini preliminari, finanziate con Decreto Commissariale n. 394 del 21/12/2011 e ad oggi conclusi.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sprofondamenti a ridosso del marciapiede in Via Empedocle (Area di progetto), in corrispondenza dell'antica chiesa di S. Lucia, ha richiesto un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e pianificare gli interventi da realizzare.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag ha comunicato all'Ufficio del Commissario che, a seguito del violento nubifragio del 24/10/2012, è stato necessario rivedere la scelta progettuale, nonché adeguarla alla nuova situazione determinatasi.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012, il GC ha trasmesso copia del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei Lavori di somma urgenza.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri a favore della CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 29,8866%.</p> <p>Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012.</p> <p>In data 12/12/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che dovranno concludersi in giorni 150 naturali e consecutivi pertanto l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 07/05/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 è stata impegnata la somma di € 511.376,29</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2532 del 03/05/2013 il D.L. propone una proroga di giorni 28 naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 04/06/2013.</p> <p>Il GC di Agrigento con nota prot. n. 4279 del 16/07/2013 trasmette la relazione a struttura ultimata redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 si procede alla presa d'atto della PVS e rimodulazione impegno somme.</p>		SAL	LAVORI ULTIMATI




UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO  
 "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico  
 nella Regione Siciliana previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010"  
 Ex OPCM 09 luglio 2010, n.3886 art.1



<b>AG004</b>	<b>Cattolica Eraclea</b>	<b>Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccoso Eraclea Minoa</b>					Importo ApQ	<b>€ 1.480.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 21 OTT 2010</b>	note:	A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21/10/2010 l'intervento transita in B.	Importo Rimodulato
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato	-	Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-	
Decreto di finanziamento acquisizione progettazione	n. 231 del 27/03/2013	Importo Finanziato	€ 87.365,51					Economie da finanziamento
								Eventuali Economie da ribasso
<b>CONVENZIONI</b>	<b>GC</b>							

Figure Tecniche								
RUP	Arch. Caterina Stampone GC Ag	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 482 del 26/06/2013	Supporto al RUP	Geom. Francesco Mirabelli GC Ag	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013	
RUP	Ing. Lorenzo Calamo GC Ag	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013					
Progettista	Esterna	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:		Collaboratore amministrativo	Signora Croce Rita Di Caro GC Ag	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012, L'ARTA Serv. 3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente Beneficiario del finanziamento relativo all'intervento.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso due copie del progetto e la relativa documentazione amministrativa inviata dal Comune.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 è stato nominato l' Ing. Lorenzo Calamo RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Croce Rita di Caro Collaboratore Amm.vo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 231 del 27/03/2013 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'Ing. Ing. Attilio Santini e dal Dott. Geol. Matteo Vento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6723 del 08/11/2013 il RUP ha trasmesso l'elenco degli Enti preposti a salvaguardia dei vincoli insistenti sull'area di intervento, e pertanto questa struttura si accinge ad indire la conferenza dei servizi.</p>	 SAL	<b>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</b>
------------------------	---	--	---


AG006	Favara	Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n.175 del 18/04/2012	Importo Finanziato	€ 1.500.000,00	Decreto di Impegno	n. 581 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.192.811,88		
				Decreto di Impegno pubblicazione GURI	n. 271 del 11/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 937,17		
				Decreto di Impegno e Pagamento Componenti Commissione di Gara	n.335 del 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 410,58		
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazioni esito quotidiani	n. 403 del 02/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.268,75		
				Decreto di impegno e pagamento AVCP	n. 577 del 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 1.500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.196.803,38</b>		
							Economie da finanziamento	€ -	
							Eventuali Economie da ribasso		

<b>CONVENZIONI</b>	GC							
--------------------	----	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC Ag)	Nota di Incarico	n. 369/UC del 12/10/2010	Supporto al RUP				
Progettista	GC Ag	Nota di Incarico	n. 369/UC del 12/10/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Genio Civile	Nota di Incarico	n. 369/UC del 12/10/2010	
Geologo	Genio Civile	Nota di Incarico	n. 369/UC del 12/10/2010	RUP Espropri	Ing. Alberto Avenia (Dirigente dell'ufficio tecnico del comune di Favara)	Decreto di Incarico	D.C. n.283 del 19/10/2011	
Direttore Lavori	Genio Civile	Nota di Incarico	n.369 del 12/10/2010	Tecnico per procedure catastali di frazionamento	Geom. Attanasio Piritore	Nota di Incarico	D.C. n. 724 del 11/09/2013	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Genio Civile	Nota di Incarico	n.369 del 12/10/2010					
Collaudatore Statico	Ing. Pietro Agnello	Decreto di Incarico	D.C. n. 568 del 31/10/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Pietro Agnello	Decreto di Incarico	D.C. n. 568 del 31/10/2012	

INDAGINI preliminari affidate a:	IMGA s.a.s	Nota di affidamento INDAGINI	n.3411 del 21/02/2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.	Decreto Affidamento Lavori	n. 251 del 30/05/2012	data contratto	03/07/2012
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	21-ago	data di termine lavori	04/10/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata al Genio Civile di AG che, con nota acquisita al prot. n. 2000 del 5/10/2011, ha trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 10/02/2012 sono stati acquisiti i pareri necessari per l'approvazione del progetto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 1112 del 03/04/2012, il GC di Ag ha trasmesso il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 si è provveduto a finanziare l'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 si sono aggiudicati definitivamente i lavori a favore della BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2050 del 07/06/2012, il GC di Ag ha comunicato che in data 06/06/2012 sono stati redatti il verbale di immissione in possesso delle aree da espropriare nonché il verbale sulle verifiche per l'immediata esecuzione dei lavori.</p> <p>In data 03/07/2012 è stato stipulato il contratto con l'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop.</p> <p>In data 21/08/2012 sono stati consegnati i lavori, che dovranno concludersi entro il 21/08/2013.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 732 del 20/12/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 e del SAL n. 2 alla</p>	SAL	 LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	-----	--

<b>AG007</b>	<b>Lucca Sicula</b>	<b>Opere di consolidamento centro urbano</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.500.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 461,24	Decreto di Impegno Attività di RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 461,24		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

Figure Tecniche								
RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto di Incarico	D.C. n. 29 del 23-02-2011	Supporto al RUP	Geom. Ferrante Geom. Nicolichia Dott. Barranco	Decreto di Incarico	D.C. n. 29 del 23-02-2011	
Progettista	Comune Geom. Silvestre Giarratano (resp UTC)	Determinazione del Sindaco	n. 11 del 31/08/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Determina di Incarico		
Geologo	Dott. Domenico Palumbo Piccionello	Determinazione Dirigenziale	n.94 del 01/09/2011	Geotecnico	Ing. Michele Buscarnera	Determinazione Dirigenziale	n.95 del 01/09/2011	
RUP Espropri	Geom. Silvestre Giarratano (Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Lucca Sicula)	Decreto di nomina	D.C. n. 341 del 28 novembre 2011					
Direttore Lavori		Decreto di nomina		Assistente al DL		Nota di Incarico		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Decreto di nomina						
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico		

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	


<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>La Progettazione è stata affidata al Comune di Lucca Sicula.</p> <p>Con Decreto Commissariale n.34 del 28/11/2011 è stato nominato RUP per le procedure espropriative il Dirigente dell'UTC del Comune di Lucca Sicula. Ad oggi sono in corso le procedure di esproprio e la determinazione dell'indennità di Espropriazione per la definizione della quale il Comune , con nota prot. n. 169 del 12/01/2012, acquisita al prot. n. 101 del 17/01/2012, ha richiesto alla Commissione per la Determinazione dell'indennità di Espropriazione il parere ai sensi dell'art. 41 DPR 327/2011, già pervenuto al Comune di Lucca Sicula.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 286 del 16/01/2013 il progettista, geom. Silvestre Giarratano, trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS del 30/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1328 del 04/03/2013 il Geom. Silvestre Giarratano, responsabile delle procedure espropriative, trasmette copia delle comunicazioni di avvio del procedimento, per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle ditte presenti nel piano particellare di esproprio.</p>	SAL	<b>ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE</b>
------------------------	---	-----	---------------------------------------

AG010	Ribera	Completamento consolidamento centro abitato secca grande						Importo ApQ	€ 2.600.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 870 del 18/10/2013	Importo Finanziato	€ 2.467.663,33	Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
Decreto di Acquisizione progettazione definitiva ed esecutiva	n. 350 del 11/07/2012	Importo Finanziato	€ 130.119,12						
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 806,16	Decreto di Impegno Attività di RUP	n. 326 del 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 806,16		
				Decreto di Impegno pagamento spese pubblicazione GURI	n.903 del 28/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.145,65		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 2.598.588,61</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 2.951,81</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013	Supporto al RUP	Arch. Giovanni Piero Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013
	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.453 del 11/09/2012	Supporto al RUP	Ing. Rossella Zumbè	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 354 del 17/07/2012
Progettista	Ing. M.Vella Arch. L. Foderà (Arch Antonuccio: Delibera di G.M. n.152 del 25/05/2012 presa d'atto della sopravvenuta mancanza di partecipazione alla progettazione esecutiva)	Delibera di Incarico	G.M. n°332 del 06.06.1989 e successiva Delibera di G.M. n°158 del 29.08.1996;	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Maurizio Vella	Delibera di Incarico	G.M. n°332 del 06.06.1989 e successiva Delibera di G.M. n°158 del 29.08.1996;
Geologo		Determina di Incarico					
Direttore Lavori		Delibera di Incarico		Assistente al DL		Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Maurizio Vella	Delibera di Incarico	G.M. n°332 del 06.06.1989 e successiva Delibera di G.M. n°158 del 29.08.1996;				
Collaudatore Statico		Decreto di Incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo		Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
contratto	data conclusione lavori		verbale inizio attività	data presunta di termine lavori



AG010	Ribera	Completamento consolidamento centro abitato secca grande	Importo ApQ	€ 2.600.000,00
STATO DELL'ARTE	<p>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Ribera.</p> <p>A seguito di richiesta del Commissario, in data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha dato indicazioni per la definizioni delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.</p> <p>A seguito di vari incontri e colloqui, con Decreto Commissariale n. 350 del 11/07/2012 è stata effettuata l'acquisizione del progetto dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</p> <p>Il progetto è stato trasmesso dai progettisti ed acquisito agli atti al prot. n. 2903 del 27/07/2012</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe La Placa e del Supporto Ing. Rossella Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il Geom. Giuseppe Ferrante RUP dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro.</p> <p>Con nota prot. n. 5236 del 05/09/2013 il Commissario comunica i nominativi del gruppo di verifica del progetto esecutivo.</p> <p>Il RUP geom. Giuseppe Ferrante con nota prot. n. 5841 del 30/09/2013 trasmette la documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 è stato finanziato l'intervento. In data 22 ottobre 2013 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 888 del 22/10/2013 è stato approvato il bando e disciplinare di gara.</p>		SAL	<p>PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA</p> 

AG011	Ribera	Opere di consolidamento centro urbano						Importo ApQ	€ 939.021,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.33 - 8/3/2011	Importo Finanziato	€ 939.021,00	Decreto rimodulazione impegno	n.183 del 12/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 640.129,86		
				Decreto di Impegno	n.13 del 17/01/2012	Importo dell'Impegno	€ 771.049,00		
				Decreto di Impegno spese pubblicazione GURI	n.240 del 22/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.042,01		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	n.312 del 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
				Decreto di Impegno	n.280 del 14/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 640.129,86		
				Decreto di Disimpegno	n. 280 del 14/06/2013	Importo Disimpegnato	€ 625.900,81		
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 939.021,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 786.695,06</b>		
								Economie da finanziamento	€ 0,00
								Eventuali Economie da ribasso	


<b>CONVENZIONI</b>									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Gesua Palumbo (a seguito revoca dell'Ing.Cimino)	Nota di incarico	n. 39459 del 9 settembre 2010 del Dirigente Generale del DRPC	Supporto al RUP	Collaboratore amministrativo al RUP Coll. "B" Giovanna Chianetta	Nota di incarico	n.13292 del 29/03/2011
	Ing. Maurizio Cimino	Nota di incarico	n. 5591 del 07 settembre 2008 del Dirigente Generale del DRPC				
Progettista	DRPC Ag	Nota di incarico	314/UC del 29/09/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	DRPC Ag	Nota di incarico	314/UC del 29/09/2010
Geologo		Determina di Incarico					
Direttore Lavori	Ing. Carmelo Arcieri DRPC	Nota di Incarico	n. 171/UC del 23/02/2011 n. 13292 del 29/03/2011	Assistente al DL	Direttore di Cantiere e Coontabile: Geom Diego Sberna Direttore Operativo e Contabile: Geom. Emanuele Milioto	Nota di Incarico	n. 13292 del 29/03/2011
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Davide Di Piazza DRPC	Nota di Incarico	n. 171/UC del 23/02/2011 n. 13292 del 29/03/2011				
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Di Mino	Nota di Incarico	D.C. 395 del 01/08/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Di Mino	Nota di Incarico	D.C. 395 del 01/08/2012

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI			C. & P. SRL	Decreto Affidamento Lavori	D.C n. 200 del 03/05/2012	data contratto	26/06/2012
contratto	data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	GATTOPARDO COSTRUZIONI D.C. n. 163 del 11/04 2012 Revoca provvedimento di aggiudicazione	verbale inizio attività	28-giu-12	data ultimazione dei lavori	31-gen-13




AG011	Ribera	Opere di consolidamento centro urbano	Importo ApQ	€ 939.021,00
STATO DELL'ARTE		<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di AG.</p> <p>Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 33 del 08/03/2011 e, a seguito delle procedure di gara, la realizzazione dei lavori è stata affidata alla Gattopardo Costruzioni s.r.l., giusto Decreto n.237 del 21/09/2011.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 26/10/2011.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione, risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni s.r.l., a seguito della nota della Prefettura di Agrigento prot. n. 0013013 del 26/03/2012, acquisita al prot.n. 1192 del 10 /04/2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta pertanto l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa successiva in graduatoria C&amp;P srl.</p> <p>Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC di Agrigento ha trasmesso gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e delle scorte a tutto il 27/04/2012.</p> <p>In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto con la C&amp; P Srl.</p> <p>In data 28/06/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che avrebbero dovuto concludersi entro 120 giorni naturali e pertanto entro il 26/10/2012.</p> <p>Il RUP, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&amp;P Srl, visto il parere del D.L., con nota acquisita agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori.</p> <p>In data 31/01/2013 sono stati ultimati i lavori.</p> <p>Con nota prot. n. 2263 del 16/04/2013 il RUP trasmette al Commissario i certificati di ultimazione lavori e di avvenuta efficacia del certificato di ultimazione lavori.</p>	SAL	<p>LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI</p> 



<b>AG014</b>	<b>Santo Stefano di Quisquina</b>	<b>Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale</b>						Importo ApQ	<b>€ 2.360.195,11</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 21 OTT 2010</b>	note:	A seguito del Comitato di Indirizzo e Controllo del 21/10/2010 l'intervento transita in B.	Importo Rimodulato	€ 2.360.195,11
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato	-	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche							
RUP	-	Incarico conferito tramite:	-	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	Esterna	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	


<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Santo Stefano di Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3119 del 09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la documentazione in suo possesso.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p>	<p>SAL</p> 	<b>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</b>
------------------------	--	--	---

<b>AG015</b>	<b>Sciacca</b>	<b>Opere di consolidamento parete Coda di Volpe</b>						Importo ApQ	<b>€ 800.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011</b>	note:	Nel Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento originariamente in A transita in B . Nel Comitato del 24 marzo 2011 l'intervento torna in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	GC
--------------------	----

Figure Tecniche									
RUP			Nota di incarico		Supporto al RUP				
Progettista	GC Ag		Nota di incarico	Nota prot. N. 5455 del 19/12/2012	Coord Sicurezza fase Progett.			Determina di Incarico	
Geologo	Geologo Emanuele Siracusa		Determina di Incarico	Sindacale n.82 del 11/10/2007					
Direttore Lavori			Decreto di nomina		Assistente al DL			Nota di Incarico	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Decreto di nomina						
Collaudatore Statico			Decreto di incarico		Collaudatore Tecnico amministrativo			Nota di Incarico	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	


<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti incaricati dal Comune di Sciacca. In sede di Conferenza di Servizi del 12/05/2008, convocata dallo stesso Comune, sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni da parte degli Enti intervenuti. A seguito della revisione del progetto, in adempimento alle prescrizioni formulate in sede di CdS, da parte dei progettisti, il C.S. ha ritenuto opportuno, considerate le notevoli variazioni introdotte, chiedere nuovamente il parere dell'ARTA serv 3.</p> <p>Acquisito il parere dell'ARTA serv 3, al prot 1785 del 19/09/2011, il Commissario ha chiesto al Comune l'adeguamento del progetto alle prescrizioni formulate. Gli elaborati aggiornati e la stesura finale del progetto, sono stati trasmessi dal Comune con note acquisite agli atti con prot. n.460 del 14/02/2012 e con prot. n.1561 del 08/05/2012.</p> <p>A seguito della CdS del 01.08.2012, l'UTC, con nota acquisita al prot. n. 3091 del 08.08.2012, comunica l'impossibilità di rielaborare il progetto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3416/Uc del 11/09/2012 il Genio Civile di Agrigento si dichiara disponibile, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 10.11.10, a collaborare per la definizione del progetto, così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 3292 del 03/09/2012</p> <p>Con nota prot. n. 5455 del 19/12/2012, il Commissario autorizza il GC di Ag a procedere celermente alle attività tecniche richieste.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6636 del 05/11/2013 il GC di Ag trasmette il progetto esecutivo. Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS per il giorno 19/11/2013</p>	SAL	<p>PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
------------------------	--	-----	---

<b>AG174</b>	<b>Cattolica Eraclea</b>	<b>Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.170.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 24 MAR 2011</b>	note:	Importo Rimodulato	€ 1.170.000,00	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato	-	Decreto di Impegno		Importo dell'impegno	-		
Decreto di Finanziamento Indagini	n. 206 del 21/03/2013	Importo Finanziato	€ 48.189,82	Decreto di Impegno Indagini	n. 713 del 10/09/2013	Importo dell'impegno	€ 23.995,13	Economie da finanziamento	
		<b>TOTALE FINANZIAMENTI</b>	<b>€ 48.189,82</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>			
							Eventuali Economie da ribasso		
<b>CONVENZIONI</b>	<b>CGIAM</b>	<b>INVITALIA</b>	<b>GC</b>						

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Caterina Stampone	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013	Supporto al RUP	Geom. Francesco Mirabelli	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013
Progettista	INVITALIA	Ing. Gianluca Coroneo ©; Arch. Fabio Pulizzi; Ing. Rossella Zumbè; Dott. Gianluca Sabatini.	Incarico conferito tramite:	nota prot. n.4263/UC del 23/10/2012,	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo			Incarico conferito tramite:			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:		Collaboratore amministrativo	Signora Carmelina Scifo	Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO GAV S.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 281 del 16/04/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2366 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota prot. n. 2537 del 06/07/2012 di sollecito da parte del Commissario al Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa, l'UTC comunica, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4203 del 19/10/2012, di non essere in condizione di redigerlo, demandandolo al Commissario.</p> <p>Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012, il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, aggiungendo l'intervento AG 174 Cattolica Eraclea B* "Crolli costone roccioso centro abitato - Loc. Zagarella" importo € 1.170.000,00</p> <p>Con nota prot. n. 4279 del 23/10/2012, il Commissario comunica al Comune che, nella qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, procederà alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Con nota prot. n. 4263 del 23/10/2012, il Commissario incarica la Soc. IAP, in base alla convenzione del 18/02/2011, delle attività di progettazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4309 del 24/10/2012 IAP comunica i nominativi del GdL.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 è stato nominato l' Arch. Caterina Stampone RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Carmelina Scifo collaboratore amministrativa. Relativamente alle indagini geognostiche, a seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 281 del 16/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari favore della dell'Impresa GEO GAV S.r.l. (ribasso percentuale pari al 51,0001%). In data 13/05/2013 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3880 del 27/06/2013 la GEOGAV ha trasmesso gli elaborati.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5166 del 02/09/2013 la CGIAM trasmette l'approvazione della relazione geologica.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6157 del 11/10/2013, il Gruppo di Progettazione IAP trasmette gli elaborati progettuali.</p> <p>Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS, indetta il giorno 19.11.2013 alle ore 12.00.</p>	SAL	<p>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
------------------------	--	-----	---

ME049	Alcara Li Fusi	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini						Importo ApQ	€ 1.200.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012		note: Nel corso del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento passa alla lettera B Nel corso del Comitato di Indirizzo e Controllo del 18/05/2012 l'intervento torna sotto la copertura finanziaria ministeriale (A)	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	392 - 20/12/2011	Importo Finanziato	€ 834.921,87	Decreto di Impegno	366 - 17/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 677.774,45		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	30 - 23/01/2012	Importo dell'Impegno	€ 979,11		
Decreto di Finanziamento Indagini Preliminari	80 - 08/06/2011	Importo Finanziato	€ 23.923,43	Decreto di Impegno pagamento AVCP	95 - 07/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
				Decreto di Impegno Indagini Preliminari	104 - 27/06/2011	Importo impegnato € 16.617,67 poi disimpegnato con Decreto n. 366 del 17/07/2012			
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 858.845,30</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 679.128,56</b>		
								Economie da finanziamento	€ 341.154,70
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA
--------------------	-----------

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Basilio Sanseverino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 77 del 30 mag 2011	Supporto al RUP	Geom Salvatore Bontempo (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 77 del 30 mag 11
Progettista	INVITALIA Ing. Pulizzi, Ing. Grassi, Ing. Zumbè	Incarico conferito tramite:	Notadi incarico prot.n. 253 del 08 marzo 2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Arch. Fabio Pulizzi	Incarico conferito tramite:	decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012	Assistente al DL	Ing. Rossella Zumbè Dott. Geol. Gianluca Sabatini	Incarico conferito tramite:	decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	decreto commissariale n. 101 del 13/03/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Luciano Taranto	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot. 1405 del 24/04/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Luciano Taranto	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot. 1405 del 24/04/2012

INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	104 - 27/06/2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	SA.MA srl	Decreto Affidamento Lavori	aggiudicazione Definitiva Decreto commissariale n. 18 del 18/01/2012	data contratto	01/03/12
contratto	28/06/2011	data conclusione lavori	15/07/2011			verbale inizio attività	13/04/2012	data termine lavori	26/10/2012


STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.                  A seguito di procedure di gara, con Decreto n.104 del 27.06.2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari ad oggi concluse.                  Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2011 e finanziato con Decreto n. 392 del 20.12.2011.                  A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 18 del 18 /01/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.                  La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012.                  Con nota acquisita al prot. n. 2888 del 26/07/2012 il Comune ha chiesto di riutilizzare le economie per estendere l'area di intervento.                  Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 22/10/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, avvenuta in data 13/10/2012.                  Con nota prot. n. 5266 del 11/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo e statico la relazione a strutture ultimate e tabulato con le prove di carico sui pali di fondazione.</p>						SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----------------

ME051	Alì Terme	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 900.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note: Nel Comitato del 24.02.2012 si decide il transito dell'intervento in lettera A Nel Comitato del 18.05.2012 viene rimodulato l'importo dell'intervento (€ 421.050,50)	Importo Rimodulato	€ 1.321.010,50	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE DRPC ME	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	DRPC ME						
Geologo	Dott. Geol. Rosario Caminiti	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE DRPC ME			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	



<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 14/11/2011. In sede di Conferenza Servizi del 18/11/2011, il DRPC comunica che - a seguito delle prescrizioni dettate dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e della nuova normativa sismica - il progetto generale ha un costo pari a circa 3.073.000 euro. Il Commissario invita il DRPC a valutare l'opportunità di redigere uno stralcio funzionale rientrante nell'importo previsto in AdP di euro 900.000.</i></p> <p><i>Con nota prot. n. 3045 del 31/12/2011 il DRPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto esecutivo, rappresentando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore ad euro 1.321.010,50.</i></p> <p><i>Con nota prot. n. 223 del 25/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa allo stralcio funzionale al Comitato di Indirizzo e Controllo, che, nel corso dell'incontro del 18/05/2012 dispone l'incremento dei fondi per l'intervento pari a € 421.050,50, come richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal DRPC.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot.n. 1091 del 02/04/2012, il DRPC trasmette la documentazione inerente il piano di indagini per "Adeguamento del tombino di convogliamento acque".</i></p> <p><i>Il MATTM invita RFI ed ANAS ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei tombini, ed i Commissario, non avendo avuto riscontro, sollecita gli stessi direttamente con nota prot. n. 2409 del 28/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot .n. 5042 del 30/11/2012, la Direzione Commerciale ed Esercizio di rete di RFI comunica l'avvenuto inoltro delle richieste all'ufficio RFI competente.</i></p>	<p>SAL</p>	<p>PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
----------------------------	--	------------	---

ME052	Basicò		Drenaggi e opere di convogliamento - C/da Badiazza					Importo ApQ	€ 300.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	note:	Nel corso del Comitato del 21 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla lettera B. Nel corso del Comitato del 24 febbraio 2011 transita nuovamente in A. l'importo viene incrementato, passando da € 300.000 a € 1.300.000	Importo Rimodulato	€ 1.300.000,00
Decreto di Finanziamento	65 - 14/02/2012	Importo Finanziato	€ 1.291.603,12	Decreto di Impegno (PVS e Rimodulazione)	698 - 13/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.046.941,73		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	152 - 3/04/2012	Importo dell'Impegno	€ 979,11		
				Decreto di Impegno pagamento post informazione quotidiani	265 - 08/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.244,55		
				Decreto Impegno e pagamento AVCP	387 - 24/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.291.603,12</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.050.540,39</b>		
								Economie da finanziamento	€ 8.396,88
								Eventuali Economie	

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Giuseppe Trifilò (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011	
Progettista	Dott. Ing. Renato Cilona (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.22 del 28.04.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Antonino Savoca (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 23 del 28.04.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Renato Cilona	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 118 del 21 marzo 2012	Direzioe Lavori di carattere geologico	Dott. Antonino Savoca	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 454 del 11/09/2012	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Renato Cilona	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 118 del 21 marzo 2012					
Collaudatore Statico	Ing. Maurizio Coroneo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 343 del 11/07/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Maurizio Coroneo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 343 del 11/07/2012	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	I.Co.Li di Li Destri	Decreto Affidamento Lavori	n. 128 - 26.03.2012	data contratto	04-apr
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività	30/05/2012	data presunta di termine lavori	29/05/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune a progettista esterno con Determina Sindacale n.22 del 28.04.2012.</p> <p>A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con Decreto n. 65 del 14.02.2012, si è finanziato l'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 del 26.03.2012 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il contratto è stato firmato in data 04/04/2012.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 30/05/2012 e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 29/05/2013. In data 21/12/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1, ed in data 10/04/2013 sono stati ripresi gli stessi.</p> <p>La I.Co.Li. di Li Destri, aggiudicataria dei lavori, in data 19/06/2013 con nota prot.n. 3715, comunica l'ultimazione dei lavori.</p>	SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	--	-----	-----------------




ME053	Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - C.da Jannello						Importo ApQ	€ 3.630.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	237 - 24/05/2012	Importo Finanziato	€ 3.630.000,00	Decreto di Impegno	547 del 19/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.813.578,07		
				Decreto di presa d'atto della PVS, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa	481 del 26/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 286.421,93		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	279 del 14/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.069,39		
				Decreto di Impegno Pagamento spese di pubblicazione	412 del 06/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 6.676,18		
				Decreto di Impegno pagamento GURI	439 del 04/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 874,28		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 3.630.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 3.110.219,85</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie	

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Mario Messina (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determina n.05 del 08/03/2011	Collaboratore Tecnico RUP	Geom. Adriano Giuseppe (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 140 del 28 giugno 2011	
	Ing. La Placa Giuseppe	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.47 del 06 febbraio 2012	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.346 del 11/07/2012	
Progettista	UTC Arch. Mario Messina	Incarico conferito tramite:	Atto n. 113/LL.PP. del 23.01.2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Geom. Carmelo Silvera (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 19 del 12 aprile 2011	
Geologo	Dott.ssa Geol. Caterina Cucinotta (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 14 del 21 marzo 2011	Ingegnere Geotecnico di supporto	Ing. Gianluca Coroneo	Incarico conferito tramite:	Nota di incarico prot.n.342 del 6 febbraio 2012	
Direttore Lavori	Ing. Basilio Ridolfo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 519 del 08.10.2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Carmelo Silvera	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 45 del 18/10/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Basilio Ceraolo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 05 del 08/01/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Basilio Ceraolo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 05 del 08/01/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:	TRIGEO Srl	Incarico conferito tramite:	Le indagini sono state seguite dall'amministrazione comunale	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori Geo Perforazioni srl	Decreto Affidamento Lavori	431 - 29/08/2012	data contratto	26-set
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività	22/10/2012	data presunta di termine lavori	31/10/2013



STATO DELL'ARTE	<p><i>La progettazione esecutiva è stata affidata dal Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 del 06.12.2010.</i></p> <p><i>Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. Con atto n. 113/LL.PP. del 23.01.2012 l'UTC ha nominato un nuovo progettista, che ritiene di dover apportare modifiche al progetto, chiedendo la nomina di un Ingegnere Geotecnico di supporto alla progettazione.</i></p> <p><i>L'Ufficio del Commissario, con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012, nomina il RUP e, con nota prot.n.343 del 06.02.2012, l'Ingegnere Geotecnico da affiancare al progettista.</i></p> <p><i>Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012.</i></p> <p><i>In sede di Conferenza Servizi del 24.04.2012 sono stati acquisiti i pareri degli enti coinvolti e si è provveduto a finanziare l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012 .</i></p> <p><i>Con D. C. n. 261 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n.431 del 29/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'impresa GEO PERFORAZIONI Srl.</i></p> <p><i>Il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012 ed i lavori avviati in data 22/10/2012.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 481 del 26/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la rimodulazione del quadro economico, l'integrazione dell'impegno di spesa e la proroga dell'ultimazione dei lavori di giorni 30.</i></p>	SAL	 AVVIATI LAVORI
--------------------	---	-----	---

ME056	Capri Leone	Opere di risagomatura e protezione versanti - Frazione Rocca						Importo ApQ	€ 550.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 96 del 08/03/2012	Importo Finanziato	€ 516.698,04	Decreto di Rimodulazione Impegno	Decreto n. 101 del 18/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 386.810,69		
				Decreto di Impegno e pagamento Progettazione, Coord. Sicurezza in fase di progettazione, rilievi	560 del 25/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 23.766,23		
				Decreto di Impegno pagamento Componente Commissione Gara	336 del 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 136,35		
				Decreto Impegno e pagamento AVCP	387 - 24/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 516.698,04</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 410.938,27</b>		
								Economie da finanziamento	€ 33.301,96
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Geom. Giuffrè Gaetano (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 34 del 13 ago 2010				
	Ing. Domenico Imbroglia		D. C. n. 339 del 28.11.2011				
	Arch. Giovanni Piero Di Magro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 72 del 01/02/2013	Supporto al RUP	Dott. Barranco	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 34 del 23 gennaio 2012
Progettista	Ing. Salvatore Russo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 44 del 12-10-10	Coord Sicurezza fase Progett.	Geom. Biagio Contiguglia (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 35 del 16 ago 2010
Geologo	Geol.Salvatore Armeli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina sindacale n°16 23/02/2011			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Russo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 303 del 28 giu 2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Russo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 303 del 28 giu 2012				
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - EUROVEGA COSTRUZIONI	Decreto Affidamento Lavori	n. 287 del 20/06/2012	data contratto	26/06/2012
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	19/07/2012	data di fine lavori	21/01/2013

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 44 del 12.10.2010.*

*Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva con nota assunta al prot. n. 136 del 18/01/2012 e, a seguito dell'acquisizione pareri, viene finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012.*

*Con Decreto n. 99 del 13/03/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 287 del 20/06/2012 sono stati aggiudicati i lavori.*

*Il contratto è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed i lavori consegnati il 19/07/2012.*

*Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 3438 del 12/09/2012, tra l'altro, ha comunicato che i lavori sono concretamente iniziati solo in data 11.09.12.*

*Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 11/12/2012, il RUP trasmette la Relazione di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 resasi necessaria durante lo svolgimento dei lavori.*

*Con nota prot. n. 897 del 11/02/2013 l'Ing. Salvatore Russo trasmette il certificato di ultimazione lavori del 21/01/2013.*

*Con Decreto Commissariale n. 101 del 18/02/2013 il Commissario prende atto dell'approvazione della PVS e della conseguente rimodulazione dell'impegno, e con Decreto n. 103 e 241 del 18/02/2013 e 29/03/2013 lo stesso Commissario dispone il pagamento del SAL n. 1 e 2.*

*Con nota acquisita al prot. n. 2775 del 13/05/2013 il D.L. ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e dell'art. 237 del Regolamento n. 207/2010.*

SAL

LAVORI ULTIMATI





ME057	Capri Leone	Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali - Caprileone Centro						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	252 - 03/10/2011	Importo Finanziato	€ 573.816,18	Decreto di Impegno	678 - 10/12/2012	Importo dell'impegno	€ 424.452,22		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	95 - 07/03/2012	Importo dell'impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	135 - 30/03/2012	Importo dell'impegno	€ 788,19		
				Decreto di Impegno pagamento progettista e geologo	138 - 02/04/2012	Importo dell'impegno	€ 33.809,99		
				Decreto di Impegno pagamento Indagini	232 - 18/05/2012	Importo dell'impegno	€ 13.609,74		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 573.816,18</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 472.885,14</b>		
							Economie da finanziamento	€ 26.183,82	
							Eventuali Economie da ribasso		

Figure Tecniche

RUP	Geom. Gaetano Giuffrè (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.233 del 21 settembre 2011	Supporto al RUP	Arch. Diego Mammo Zagarella	Ing. Salvatore Acampora Decreto Commissariale n.233 del 21 settembre 2011	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 28 del 23 gennaio 2012	
Progettista	Ing. Amalfi Maurizio (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 42 del 12/10/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Amalfi Maurizio (Figura Esterna)		Incarico conferito tramite:	Determina n. 42 del 12/10/2010	
Geologo	Geol. Michelangelo Napoli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina n. 43 del 12/10/2010				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Studio Tecnico Ing. Falzea (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 329 del 17/11/2011	Assistente al DL			Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Studio Tecnico Ing. Falzea (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 329 del 17/11/2011						
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Butera (Direttore Tecnico Beta Servizi Ingegneria S.r.l.)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 612 del 30/07/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo			Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	TRIGEO Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	Determina sindacale n. 58 del 7/12/2010	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l. con un ribasso 23,8878%	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 302 del 03/11/2011	data contratto	15/11/2011
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	17/12/2011	data presunta di termine lavori	25/04/2012

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 42 del 12.10.2010.*

*Lo stesso Comune ha provveduto ad affidare la realizzazione delle indagini preliminari con Determina Sindacale n. 58 del 07.12.2010.*

*A seguito del completamento delle indagini, in data 30.03.2011 è stato trasmesso il progetto esecutivo che, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 252 del 03.10.2011.*

*A seguito di espletamento delle procedure di Gara avviate con Decreto n. 268 del 10/10/2011, con Decreto n. 302 del 03.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla Bo.No. Costruzioni Srl e i lavori sono stati avviati in data 17/12/2011.*

*In data 03/07/2012 il D.L. ordina all'impresa Bo.No. Costruzioni Srl di sospendere i lavori e di riprenderli quando verrà approvata la perizia di Variante e Suppletiva.*

*Il RUP, con nota acquisita al prot.con n. 3301 del 03.09.2012, trasmette al Commissario copia dell'autorizzazione a redigere la PVS trasmessa al DL.*

*Con nota acquisita al prot.n. 3347 del 06/09/2012, il RUP trasmette gli elaborati della PVS. In data 10/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale Ripresa Lavori e con D.C. n. 678 del 10/12/2012 l'Ufficio del Commissario ha preso atto della PVS e della rimodulazione del quadro economico. Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 3346 del 06/09/2012, ha chiesto il finanziamento delle opere di completamento per una spesa pari ad € 70.000.*

SAL

AVVIATI LAVORI



ME058	Caronia	Consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 18 MAG 2012	note:	Nel Comitato del 18.05.2012 viene rimodulato l'importo dell'intervento (€ 750.000)	Importo Rimodulato	€ 3.653.083,31
Decreto di Finanziamento	31 - 1/3/2011	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di impegno	71 - 26/5/2011 come rimodulato dal Decr 92 del 02/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.903.083,31		
Decreto di Finanziamento importi aggiuntivi concessi dal Comitato	490 - 24/09/2012	Importo Finanziato	€ 653.083,31	Decreto di impegno	189 - 14/3/2013	Importo dell'Impegno	€ 709.268,27		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 3.653.083,31</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 3.612.351,58</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 10390 del 15 ottobre 2010	Supporto RUP		Incarico conferito tramite:	
				RUP Espropri	Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Caronia o in caso di carenza della suddetta qualifica, il Dirigente	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 540 del 16/10/2012
Progettista	DRPC Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 10390 del 15 ottobre 2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Geol. Giuseppe Basile (Serv. RIA).	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 10390 del 15 ottobre 2010	Supporti al Geologo	Arch. Marinella Panebianco e dell'Arch. Orsola Bonanno (SERV. RIA).	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 10390 del 15 ottobre 2010
Direttore Lavori	Ing. C. Marletta, Arch. F. Benedetti (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 539 del 16/10/2012	Assistente al DL	Ing. La Rocca, Nicolosi, Raciti, Geom. Di Bella (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 2733 del 29 aprile 2011
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. A. Ferraro (DRPC ME)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 561 del 26/10/2012				
Collaudatore Statico	Ing. Luigi Boeri (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n.1217 del 25 luglio 2011	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Luigi Boeri (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n.1217 del 25 luglio 2011

PER I LAVORI IL RUP HA DICHIARATO LA SOMMA URGENZA (art. 146 DPR 554/99)

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	PRESAL COSTRUZIONI SRL	Decreto Affidamento Lavori	Decreto di aggiudicazione def. n.38 del 31 marzo 2011 (€ 2.857.152,76)	data contratto	12/04/2011
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	01/04/2011	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata all'Ufficio del Commissario OPCM 3865/10. Il progetto, trasmesso in data 10.02.2011, a seguito di validazioni e approvazioni, è stato finanziato con Decreto n. 30 del 01.03.2011.*

*A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 38 del 31.03.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori che hanno avuto inizio il 01/04/2011.*

*Con Decreto n. 92 del 02/03/2012 il Commissario ha preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 con conseguente rimodulazione del Quadro economico dell'intervento.*

*In data 13.01.2012 i lavori sono stati sospesi in attesa di riscontro per un ulteriore finanziamento da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo per la realizzazione di lavori complementari.*

*In sede di Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento è stato incrementato di € 750.000 per lavori indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate.*

*Con nota acquisita al prot. n. 2598 del 10/07/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto di completamento dell'intervento.*

*Il Commissario, con nota prot.n. 2750 del 17.07.2012, ha autorizzato il RUP a procedere all'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti.*

*Al fine di procedere all'emissione del Decreto di finanziamento, propedeutico al contratto aggiuntivo dei lavori, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3046 del 06/08/2012, il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto e del verbale di Validazione completo di tutti gli atti a corredo necessari. In data 03/09/2012 è stato sottoscritto dall'impresa Presal e dal DL il Verbale di Ripresa Lavori principali ad oggi conclusi.*

*Con D.C. n. 490 del 24/09/2012 sono finanziati i lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato, e con D.C. n. 189 del 14/03/2013 è stato impegnato l'importo aggiuntivo degli stessi.*

*In data 22/08/2013, con D.C. n. 673, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 alla ditta Presal Costruzioni per i lavori complementari affidatele*

SAL

AVVIATI LAVORI





ME059	Casalvecchio Siculo	Consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 1.363.853,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 296 del 25/06/2012	Importo Finanziato	€ 1.363.853,00	Decreto di Impegno	n.38 del 22/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 954.358,27		
				Decreto di presa d'atto della PVS, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa	496 del 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 195.265,13		
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 662,26	Decreto di Impegno Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 662,26		
				Decreto di Impegno Studio Geologico e indagini	578 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 28.601,96		
				Decreto di Impegno Pubblicazione GURI	488 - 24/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 937,17		
				Decreto di Impegno Progettazione	524 - 08/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 45.931,60		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
				Decreto di Impegno Pubblicazione esiti di gara	615 - 15/11/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.560,90		
				rimodulazione QE ed impegno di spesa	545 del 11/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 118.319,40		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	€ 1.364.515,26			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	€ 1.346.011,69	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Geom. Romina Sparacino	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 73 del 01/02/2013	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.22 del 20 gennaio 2012
RUP	Ing. Domenico Imbroglia Geom. Carmelo Moschella (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n.394 del 01 agosto 2012 D. C. n.22 del 20 gennaio 2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.22 del 20 gennaio 2012
Progettista	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina del RUP n. 57 del 07 mag 2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina del RUP n. 57 del 07 mag 2012
Geologo	Dott. Geol. Fabio Ucchino (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina del RUP n. 56 del 07 mag 2012	Direzione Lavori di carattere geologico	Dott. Geol. Fabio Ucchino (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.400 del 04 giugno 2013
Direttore Lavori	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 550 del 23/10/2012	Assistenza Geologica alla DL	Geol. Fabio Ucchino (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 2626 del 08/05/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 550 del 23/10/2012				
Collaudatore Statico	Giuseppe Quattrocchi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 165 del 08/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Giuseppe Quattrocchi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 165 del 08/03/2013
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori ITINERA s.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 464 del 13/09/2012	data contratto
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività	10-dic	data presunta di termine lavori



STATO  
DELL'ARTE

*Il Comune ha affidato la progettazione a professionisti esterni con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 28.08.2007.*

*Lo stesso Comune, con nota prot.n. 54 del 12.01.2012, ha chiesto l'autorizzazione alla nomina di due consulenze esterne (Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Studio Geologico) a causa di mancanza di professionisti all'interno dell'Amministrazione.*

*Il Comune, con note acquisite ai prot.n. 689 del 01.03.2012 e 1374 del 23.04.2012, ha trasmesso i preventivi inerenti le consulenze esterne, ed il Commissario le ha autorizzate rispettivamente con nota prot. n. 1231 del 11/04/2012 e 1479 del 02.05.2012*

*A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione dell'intervento.*

*Con nota prot.n.2286 del 22.06.2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto esecutivo (con Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione dello stesso) finanziato  
Con Decreto n. 296 del 25.06.2012.*

*Con Decreto n. 397 del 1/08/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 464 del 13/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva*

*Con Decreto Commissariale n. 634 del 21/11/2012 il Commissario ha disposto l'occupazione anticipata d'urgenza ed individuato il dirigente dell'UTC quale responsabile delle attività espropriative.*

*La Consegna dei Lavori ha avuto luogo giorno 10/12/2012.*

*In data 20/03/2013 e 17/04/2013 il Coordinatore della Sicurezza ha effettuato i primi due sopralluoghi.*

*Con Decreto n. 394 del 03/06/2013 è disposto il pagamento del I SAL.*

*A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, e dei 7 gg per esprimersi concessi agli Enti, il Commissario.*

*Con Decreto n. 496 del 28/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la rimodulazione del quadro economico e l'integrazione dell'impegno di spesa.*

*In data 20/09/2013, con nota prot.n. 5635, il DL trasmette copia del Certificato di Ultimazione Lavori.*

SAL

LAVORI ULTIMATI




ME061	Castel di Lucio	Consolidamento via Durante e Via S. Lucia						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	note:		Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	32 - 7/3/2011 come modificato dal Decr. n. 91 del 14/06/2011	Importo Finanziato	€ 1.500.000,00	Decreto di Impegno	238 - 22/09/2011 come rimodulato dal Decreto 457 del 12/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.239.256,58		
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 453,31	Decreto di Impegno Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 453,31		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.500.453,31</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.239.709,89</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 69 del 25.5.11	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 69 del 25.5.11
Progettista	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina n. 51 del 3 dicembre 2010	Coord Sicurezza fase Progett.	S.T.I. Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina n. 51 del 3 dicembre 2010
Geologo	Dott. Pasquale Marenna (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.47 del 17.11.2010			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Studio Tecnico Associato Ing. Mineo e Scavaglieri (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 199 del 25 agosto 2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Studio Tecnico Associato Ingg. Mineo e Scavaglieri (Figura esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 199 del 25 agosto 2011				
Collaudatore Statico	Ing. Marcello D'Alia	Incarico conferito tramite:	D.C. 298 del 26.06.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Marcello D'Alia	Incarico conferito tramite:	D.C. 298 del 26.06.2012

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI				Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 163 del 1 agosto 2011	data contratto	10/08/2011
Contratto	data conclusione lavori		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	TORSTEN COSTRUZIONI SRL	Verbale inizio attività	23/09/2011 sospesi il 25/01/2012 ripresa lavori il 16/04/2012	data presunta di termine lavori	15/01/2013

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata redatta da progettisti esterni incaricati dal Comune con Determina n. 51 del 3/12/2010.</p> <p>Il progetto è stato acquisito in data 01.02.2011 e, a seguito della validazione, è stato finanziato con Decreto n.32 del 07.03.2011, come rimodulato dal Decreto 91 del 14/06/2011.</p> <p>A seguito di espletamento di procedure di gara è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori con Decreto n. 163 del 01.08.2011.</p> <p>I lavori sono stati avviati 23/09/2011 e sono stati sospesi in data 25/01/2012 per permettere l'esecuzione di indagini integrative nelle more della redazione di una perizia di variante.</p> <p>I lavori sono stati ripresi in data 16.04.2012.</p> <p>Con nota prot. 1966 del 01/06/2012 il D.L. chiede al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e suppletiva, concessa dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2054 del 07/06/2012 a condizione che non comporti modifiche sostanziali che alterino la sostanza del progetto e di trovare copertura nelle somme già impegnata per l'esecuzione dell'opera con D.C. n° 238 del 22/09/ 2011.</p> <p>Il DL ha trasmesso, con nota acquisita al prot.n. 2798 del 19.07.2012, copia della perizia di variante approvata dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2836 del 23/07/2012.</p> <p>Con Decreto n. 457 del 12/09/2012 si è preso atto della PVS con conseguente rimodulazione del Quadro Economico.</p> <p>Con nota protocollo n. 383 del 21/01/2013 la Torsten Costruzioni comunica che in data 15 Gennaio 2013 sono stati ultimati i lavori.</p> <p>Con Decreto n. 422 del 07/06/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 alla Torsten Costruzioni srl.</p>				SAL	 LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	--	--	--	-----	--

ME062	Castell'Umbe rto	Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore						Importo ApQ	€ 300.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	702 - 17/12/2012	Importo Finanziato	€ 300.000,00	Decreto di Impegno	772 - 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 223.185,12		
				Decreto di Impegno Commissione di Gara	215 - 25/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 333,06		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 300.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 223.743,18</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax))	Supporto al RUP	Arch. Carmelo Bianco	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax))
Progettista	DRPC (Arch. Francesco Benedetti)	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax))	Supporto alla progettazione	Ing. A. Ferraro - C. La Rocca - V. Nicolosi - E. Raciti - Geom. M. Di Bella	Incarico conferito tramite:	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax))
Geologo		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. A. Ferraro	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012
Direttore Lavori	Arch. Francesco Benedetti (DRPC)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012	Supporto alla DL	C. La Rocca - V. Nicolosi - E. Raciti - Geom. M. Di Bella	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. A. Ferraro	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012	Collaboratori Amministrativi	Geom. Fortunata Zingale e Geom. Claudio Bartolotta	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 5214 del 10/12/2012
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	A.B.M. Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	59 - 28/01/2013	data contratto	12/03/2013
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*In data 09.11.2010 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina, che ha trasmesso il progetto in data 24.05.2011.*

*A seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura Commissariale sono state richieste integrazioni al progetto trasmesso, inviate dal DRPC in data 24.11.2011 e 12.01.2012.*

*Con nota prot.n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale, analizzati gli allegati progettuali, ha sollecitato la consegna del progetto esecutivo, debitamente verificato e validato, tenendo conto delle osservazioni tecniche formulate.*

*Con nota prot. n. 2148 del 13/06/2012 il Commissario ha sollecitato il DRPC di Me a trasmettere il progetto rielaborato entro 7 giorni, debitamente verificato e validato, specificando che trascorso infruttuosamente tale termine, avrebbe attivato i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del D.L. 195/2009 .*

*A seguito di osservazione da parte del Commissario in merito alla difformità tra il Titolo del Progetto in corso di redazione e quello inserito nell'AdP, il Commissario 3865 trasmette la Con Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 28.06.2012 che conferma la riconducibilità del progetto di "Somma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento acque superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella Contrada Sfaranda - Comune di Castell'Umberto" all'intervento ME062.*

*Il progetto è stato trasmesso nel mese di novembre 2012 e finanziato con Decreto n. 702 del 17/12/2012.*

*Con D. C. n. 59 del 28/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della A.B.M. Costruzioni srl.*

*In data 12/03/2013 è stato stipulato il contratto.*

*Con Decreto n. 772 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.*

SAL

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI  
LAVORI



ME063	Castroreale	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento						Importo ApQ	€ 1.650.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'intervento transita dalla copertura finanziaria regionale a quella Ministeriale	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	564 del 26/10/2012	Importo Finanziato	€ 1.585.394,53	Decreto di Impegno	n. 113 del 21/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.166.313,41		
				Decreto di Impegno GURI	n. 730 del 20/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 1.021,04		
				Decreto di Impegno Progettazione	n. 11 del 09/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 89.096,45		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.585.394,53</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.256.430,90</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche								
RUP	Arch. Gaetano Buccheri (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 264 del 07/06/2012	Supporto al RUP	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 332 del 10.07.2012	
Progettista	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 11 del 16-02-2007	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Sutura Antonino (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 11 del 16-02-2007	
Geologo	Dott. Geol. Salvatore Sangiorgi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 11 del 16-02-2007	Assistenza Geologica alla DL	Geol. Salvatore Sangiorgi	Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 718 del 19/12/2012	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 718 del 19/12/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Lo Porto Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 615 del 30/07/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Lo Porto Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 615 del 30/07/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	C.N.T. srl	Decreto Affidamento Lavori	662 - 03/12/2012	data contratto	24-gen
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	02-apr	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni Con Determina Sindacale n.11 del 16.02.2007.*

*Con nota acquisita agli atti al prot. n. 903 del 17/06/2011 il Comune ha comunicato essere in corso l'aggiornamento del progetto esecutivo alla vigente normativa.*

*A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1950 del 31/05/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo.*

*Con Decreto n. 297 del 26.06.2012 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori dai progettisti incaricati precedentemente dal Comune.*

*A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/07/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che ha richiesto la trasmissione di elaborati integrativi.*

*In data 18.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste in sede di CdS ed il GC ha espresso il proprio parere con nota acquisita al prot. n. 2877 del 25/07/2012.*

*Il RUP, con nota acquisita al prot.n.3164 del 21.08.2012 ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del progetto.*

*Con Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori.*

*Con Decreto Commissariale n. 662 del 03/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della C.N.T. srl.*

*Con Decreto Commissariale n. 113 del 21/02/2013 si è provveduto ad impegnare le somme.*

*In data 02/04/2013 è avvenuta la formale Consegna dei Lavori.*

SAL

AVVIATI LAVORI



ME065	Ficarra	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne						Importo ApQ	€ 1.028.981,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	economie	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 1 del 23.11.2010	Importo Finanziato	€ 1.028.981,00	Decreto di Impegno	81 - 8/6/2011 così come modificato dal Decr 382 - 15/12/2011	Importo dell'Impegno	€ 873.488,22		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.028.981,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 873.488,22</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie	

CONVENZIONI	COMUNE
-------------	--------

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determina del Responsabile Area Tecnica n.300 del 04.11.2009	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	Comune: professionista esterno	ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - Associato Ing. Francesco Castelli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n.10 del 06.10.2009	Coord Sicurezza fase Progett.	ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - Associato Ing. Francesco Castelli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite: Determinazione del Sindaco n.10 del 06.10.2009
Geologo	Geol. Filippo Cappotto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n.7 del 16.09.2009			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Francesco Cappotto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Responsabile del Servizio n. 292 del 25.11.2010	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	ATP Capogruppo Ing. Vincenzo Messina - Associato Ing. Francesco Castelli (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n.10 del 06.10.2009				
Collaudatore Statico	Arch. Carmelo Fiorenzo Landro (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 169 del 23.02.2011	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Geo Sicilia	Affidamento INDAGINI	Determina del Responsabile Area Tecnica n.111 del 06.05.2009	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	EDILTECNICA COSTRUZIONI	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	12/01/2011
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	20/01/2011 sospesi il 30/08/2011 ripresi il 18/10/2011	data di finelavori	03/11/2011



**STATO  
DELL'ARTE**

*La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010.*

*Il progetto è stato finanziato con Decreto n.1 del 23.11.10.*

*I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11.*

*A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento è transitato alla lettera B (copertura finanziaria regionale) ma continuando ad essere gestito dal Commissario, in quanto i lavori erano già avviati.*

*I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011 a meno di lavori accessori, completati, come richiesto dal RU,P entro 60 gg e quindi il 03/01/2012*

*Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2367 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 ratifica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento.*

SAL

LAVORI ULTIMATI





ME066	Ficarra	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Rinella - San Noto						Importo ApQ	€ 1.450.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 44 del 7/4/2011	Importo Finanziato	€ 1.358.580,64	Decreto di Impegno (rimodulazione QE)	Decreto n. 161 del 07/03/2013		€ 1.089.005,82		
				Decreto di Impegno GURI	209 - 31/08/2011		€ 1.033,34		
				Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011		€ 375,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.358.580,64</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.090.414,16</b>		
								Economie da finanziamento	€ 91.419,36
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 232 del 21/09/2011	Supporto al RUP	Arch. Diego Mammo Zagarella	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 232 del 21/09/2011	
Progettista	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Ricciardo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 7 del 23/08/2010	Coord Sicurezza fase Progett.	ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Ricciardo (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 7 del 23/08/2010	
Geologo	Geol. Giuseppe Mario Pizzuto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.8 del 23/08/2010			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Francesco Cappotto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 231 del 21 settembre 2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Francesco Cappotto (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 231 del 21 settembre 2011					
Collaudatore Statico	ING. NUNZIO IMPELLIZZERI (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 353 del 1 dicembre 2011 a valle dell'accettazione dell'incarico conferito con nota prot. 2508 del 15/11/2011	Collaudatore Tecnico amministrativo	ING. NUNZIO IMPELLIZZERI (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 314 del 06.07.2012	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	RENZO COSTRUZIONI	Decreto Affidamento Lavori	D. C. n.198 del 25 agosto 2011 di aggiudicazione definitiva	data contratto	01/09/2011
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività	27/09/2011	data presunta di termine lavori	24/05/2012

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune di Ficarra a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 7 del 23.08.2010.</p> <p>Il progetto è stato consegnato in data 23.03.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 44 del 07.04.2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 198 del 25.08.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il Contratto è stato firmato in data 01/09/2011 ed i lavori hanno avuto inizio in data 27/09/2011</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3222 del 24/08/2012, ritenuto necessario eseguire lavori complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche preliminari, trasmettendo al contempo elaborati tecnici dei lavori complementari previsti, ma il Commissario, atteso la quasi ultimazione dei lavori, non ha ritenuto accettabili le richieste avanzate.</p> <p>Con D.C. n. 161 del 07/03/2013 è avvenuta la presa d'atto approvazione PVS e la rimodulazione del QE dell'intervento.</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	---	-----	----------------

<b>ME068</b>	<b>Forza d'Agrò</b>	<b>Opere di consolidamento del centro abitato</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.250.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 15 SETT 2011</b>	note:	Importo Rimodulato	<b>€ 414.163,28</b>	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
						<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 0,00</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

**Figure Tecniche**

RUP		Incarico conferito tramite:		Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori				verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2368 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2533 del 06/07/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>In data 20/07/2012 si è tenuto un tavolo tecnico con Commissario, Provincia, ARTA e Comune.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3359 del 07/09/2012 il Comune, come concordato nel tavolo tecnico del 20.07.2012, trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto oltre la documentazione amministrativa dello stesso.</p> <p>Con nota protocollo n. 3793 del 01/10/2012 Il DRPC di ME sentito il Commissario convoca una riunione operativa per il giorno 05/10/2012 al fine di esaminare la problematica dell'intervento.</p> <p>In data 20/02/2013, con nota prot.n. 1073, il Commissario trasmette all'ARTA (Serv. 3) copia del progetto necessario all'acquisizione del parere preventivo dello stesso.</p> <p>L'ARTA (Serv. 3), con nota prot.n. 1786 del 25/03/2013, invita il Comune ad integrare il progetto secondo specifiche indicazioni.</p>	SAL	<b>PROGETTAZIONE IN CORSO</b>
------------------------	--	-----	-------------------------------

ME071	Frazzanò	Progetto di consolidamento del centro abitato a monte della Via San Filippo di Fragalà in corrispondenza del Quartiere Serro						Importo ApQ	€ 300.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 15 SETT 2011	note:	valutazioni in merito alla possibilità di finanziare un progetto alternativo	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	N. 91 DEL 08-02-2013	Importo Finanziato	€ 286.765,17	Decreto di Impegno	656 - 08/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 242.164,33		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	41 - 26-01-2012	Importo Finanziato	€ 27.226,15	Decreto di Impegno e pagamento Commissione di Gara	323 - 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.978,55		
				Decreto di Impegno e pagamento indagini preliminari	n. 392 - 30/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 13.234,83		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 313.991,32</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 257.602,71</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA
--------------------	-----------

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.2 del 12.01.2012	Supporto al RUP	Geom. Piero Nicolicchia	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 33 del 23 gennaio 2012
Progettista	INVITALIA	Ing. Grassi ed Ing. Calogero	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.010 del 09.01.2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.608 del 29.07.2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Fabio Marino (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.608 del 29.07.2013				
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO PLANTS	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 61 del 13.02.2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Soc. SCANCARELLO GAETANO	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 275 del 15/04/2013	data contratto	
Contratto	16/02/2012	data conclusione lavori	28/03/2012			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*In data 09.01.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.*

*A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 61 del 13.02.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione.*

*In data 18.04.2012 sono stati acquisiti gli elaborati inerenti le indagini effettuate.*

*Come comunicato dal Commissario al Comune con nota prot. n. 3296 del 03/09/2012, in base alle indagini svolte ed agli studi effettuati sull'area, è emersa una criticità molto più ampia e complessa rispetto all'inquadramento dei bersagli di intervento e, pertanto, l'attività di progettazione dell'intervento, correlata alla disponibilità economica di finanziamento prevista in fase di progettazione preliminare, determina necessariamente una tempistica di studio maggiore di quella prevista.*

*In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4241, Invitalia trasmette copia del Progetto Esecutivo.*

*A seguito della CdS tenutasi in data 06/11/2012 e del parere di coerenza al PAI espresso dall'ARTA (Serv. 3) risultano acquisiti tutti i pareri necessari.*

*Con D.C. n. 91 del 08/02/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento.*

*Con Decreto Commissariale n. 178 del 11/03/2013 è stato Approvato lo schema lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell'art. 122 del d.lgs 163/2006*

*A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D.C. n. 275 del 15/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Società SCANCARELLO GAETANO (ribasso percentuale del 30,2430%), ed in data 12/06/2013 è stato sottoscritto il contratto.*

*Con Decreto n. 656 del 08/08/2013 è disposto l'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.*

SAL

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI  
LAVORI



ME072	Galati Mamertino	Disgaggiamento massi, messa in sicurezza versante - C.da Galini						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	15 - 17/01/2012	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	114 - 21/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 362.140,56		
				Decreto di Impegno integrativo somme	858 - 11/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 69.788,57		
				Decreto di Impegno Progettazione	675 - 07/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 41.870,79		
				Decreto di Impegno AVCP	387 - 24/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 474.024,92</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche							
RUP	Arch. Giuseppa Cavolo (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 14 del 17 gennaio 2012	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	Arch. Felice Testagrossa (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Det. Sind. n. 72 del 5-10-10	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Geol. Michele Orifici (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n. 63 del 28-5-10			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Arch. Felice Testagrossa (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Det. Sind. n. 72 del 5-10-10	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico	Ing. Luciano Taranto	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 1827/UC del 24/05/2012	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	D&D	Decreto Affidamento Lavori	n. 103 del 14.03.2012	data contratto	04/04/2012
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	22/05/2012	data presunta di termine lavori	19/09/2012

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto ad affidarla a professionisti esterni con Determina Sindacale n.72 del 05.10.2010.*

*Il progetto è stato acquisito in data 02.11.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 15 del 17.01.2012.*

*A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con decreto n.103 del 14/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori .*

*Il Contratto è stato firmato in data 04/04/2012 ed i lavori sono stati avviati in data 22/05/2012.*

*Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2258 del 21.06.2012, ha trasmesso copia del Decreto di Occupazione Temporanea.*

*Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3399 del 10.09.2012, ha autorizzato il DL a redigere perizia di variante.*

*A seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 12/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori .*

*Con nota prot. n. 5053 del 03/12/2012, il DL ha chiesto al RUP autorizzazione al fine di poter procedere alla redazione della PVS II.*

*Con D.C. n. 114 del 21/02/2013 è stato disposto l'impegno somme ed il pagamento del I SAL.*

*In data 18/04/2013 il RUP, con nota prot.n. 2317, trasmette copia dell'approvazione PVS n. 2 e Verbale di ripresa lavori datata 16/04/2013.*

*Con D.C. n. 351 del 16/05/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2.*

SAL

AVVIATI LAVORI



<b>ME073</b>	<b>Galati Mamertino</b>	<b>Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pileri</b>				importo AdQ	€ <b>1.100.000,00</b>	Importo Rimodulato	€ 1.100.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Nel Comitato del 18 maggio 2012 si è deciso di far rimanere l'intervento in lettera A	
Decreto di finanziamento	406 - 02/08/2012	Importo Finanziato	€ 1.100.000,00	Decreto di impegno	495 - 28/06/2013	importo dell'impegno	€ 767.340,53		
				Decreto di impegno Commissione di Gara	212 - 25/03/2013	importo dell'impegno	€ 555,15		
				Decreto di impegno Progettazione	150 - 01/03/2013	importo dell'impegno	€ 24.862,47		
				Decreto di impegno Indagini e Studi	673 - 06/12/2012	importo dell'impegno	€ 49.459,46		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.100.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 842.592,61</b>		
								eventuali economie	

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Giuseppa Cavolo	Incarico conferito tramite	D.C. n. 262 del 07/06/2012	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe Morganti (Dimessosi con nota prot.n. 611 del 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 348 del 11/07/2012	
Progettista	Comune Ing. Mario Saitta	Incarico conferito tramite	Determina Sindacale n.54 del 26/10/2010 (Acquisito dal Commissario con Decreto n. 153 del 03/04/2012)	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Dott. Salvatore Sangiorgi	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale del 03/08/2007 (Acquisito dal Commissario con Decreto n. 349 del 11/07/2012)			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Mario Saitta	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 527 del 10/10/2012	Direttore Operativo di Cantiere	Geom. Calogero Sirna	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 91 del 19/03/2013	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Mario Saitta	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 527 del 10/10/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Franchina Alberto	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 1131/UC del 21/02/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Franchina Alberto	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 1131/UC del 21/02/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ARCOBALENO 3000 srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 514 del 04/10/2012	data contratto
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	19-ott	data presunta di termine lavori

<b>ME073</b>	<b>Galati Mamertino</b>	<b>Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pileri</b>			importo AdQ	€ <b>1.100.000,00</b>	Importo Rimodulato	€ 1.100.000,00
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria APQ	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Nel Comitato del 18 maggio 2012 si è deciso di far rimanere l'intervento in lettera A	
STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n.54 del 26/10/2010.</p> <p>Con nota prot. 2770 del 5/12/2011 il Commissario ha trasmesso la documentazione dell'intervento all'ARTA al fine di provvedere al finanziamento su fondi europei PO FESR 2007-2013 destinati alla Regione Sicilia.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.234 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non possiede i requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento e restituisce tutta la documentazione perché il Commissario si faccia carico della realizzazione dell'intervento.</p> <p>Con Decreto n. 153 del 03.04.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto n. 349 del 11/07/2012 si è acquisito lo studio geologico e le indagini geognostiche effettuati dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</p> <p>Con D.C. n. 406 del 02.08.2012 è stato finanziato l'intervento, con Decreto n. 448 del 2/09/2012 sono state avviate le procedure di affidamento lavori e con D.C. n. 514 del 04/10/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori.</p> <p>In data 19/10/2012 è avvenuta la consegna dei Lavori.</p>				SAL	AVVIATI LAVORI		





ME078	Letojanni	Opere di difesa costiera						Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	686 - 11/12/2012	Importo Finanziato	€ 2.000.000,00	Decreto di Impegno	770 - 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.310.143,30		
				Decreto di Impegno e Pagamento GURI	64 - 30/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.083,94		
				Decreto di Impegno Progettazione	110 - 20/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 68.844,50		
				Decreto di Impegno Pagamento rata Polimi	198 - 15/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 79.860,00		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
				Decreto di Impegno spese di pubblicazione avviso di esito di gara	259 - 05/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 275,88		
				Decreto di Impegno spese di pubblicazione avviso di esito di gara	319 - 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 968,00		
				Decreto di Impegno e Pagamento Commissione giudicatrice di gara	515 - 08/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 989,47		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 2.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.462.765,09</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Francesca Usticano	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 657 del 08/08/2013	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 345 del 11/07/2012
RUP	Arch. Pietro Bonsignore (UTC) Richiesta sostituzione	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 124 del 26 marzo 2012	RUP	Geom. Giuseppe Runci	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 330 del 09/05/2013 <b>Dimessosi con nota prot.n. 4831 del 06/08/2013</b>
Progettista	Ing. Sascaro Agostino e Geom. Sascaro Sabrina (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Delibera di giunta n. 194 del 11.10.2002 (Acquisito dal Commissario con Decreto 120 del 23/03/2012)	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing Vadalà Lucio (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Deliberazione di Giunta Municipale n. 267 del 18-12-2002
Studio Sedimentologico mineralogico e modello idraulico	Geol. Randazzo, Prof. Triscari, Ing. Turbolente (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Delibera di giunta n.228 del 27.11.2002 (Acquisito dal Commissario con Decreto 327 del 10/07/2012)	Studio geologico meteomarinario geognostico	Dott Geol. S. Arancio e D.ssa K. Tribulato (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Delibera di giunta n.227 del 27.11.2002 (Acquisito dal Commissario con Decreto 327 del 10/07/2012)
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Zaccaro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 60 del 29/01/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Zaccaro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 60 del 29/01/2013				

Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:	Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:	
----------------------	--	-----------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	--

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Valori S.C.a R.L. Consorzio stabile	Decreto Affidamento Lavori	n. 34 del 21/01/13	data contratto	
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p><i>Il progetto è stato affidato dal Comune a progettista esterno con Delibera di Giunta n. 194 del 11.10.2002.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto 327 del 10/07/2012 si è acquisito lo studio geologico dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</i></p> <p><i>Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario ha preso atto di quanto richiesto dalle amministrazioni presenti ed ha disposto che il progettista integrasse gli elaborati progettuali con quanto richiesto.</i></p> <p><i>Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso al progettista il parere con prescrizioni della Soprintendenza del Mare per le opportune modifiche e integrazioni.</i></p> <p><i>Il Progettista, con nota acquisita al prot. n. 2682 del 12/07/2012 ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste, inoltrate dal Commissario, con nota prot.n. 2896 del 26/07/2012 all'ARTA Serv 3 per il parere di competenza.</i></p> <p><i>Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3393 del 10/09/2012 ha trasmesso gli atti di validazione del progetto.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 686 del 11/12/2012 è stato finanziato l'intervento.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 34 del 21/01/13 i lavori vengono aggiudicati definitivamente alla Valori S.C.a R.L. Consorzio stabile con ribasso percentuale offerto del 29,5000 %.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 770 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</i></p>	SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
-----------------	--	-----	--------------------------------------

ME079	Librizzi	Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale						Importo ApQ	€ 2.150.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	471 - 20/06/2013	Importo Finanziato	€ 2.128.085,55	Decreto di Impegno	838 - 09/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.587.238,81		
Decreto di Finanziamento somme plottaggio tavole grafiche	431 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 766,66	Decreto di Impegno somme plottaggio tavole grafiche	431 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 766,66		
Decreto di Finanziamento Indagini	473 - 17/09/2012	Importo Finanziato	€ 21.222,70	Decreto di Impegno Indagini	141 - 27/02/2013	Importo dell'Impegno	€ 21.147,79		
				Decreto di Impegno GURI	621 - 30/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.022,42		
				Decreto di Impegno e pagamento Commissione di Gara	Decreto n. 813 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.506,96		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 2.150.074,91</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.612.682,64</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Geom. Cilona Carmelo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 339 del 11.07.2012	Supporto al RUP	Arch. Giovanni Piero Di Magro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 175 del 11.03.2013	
Progettista	INVITALIA	Ing. Grassi, Pulizzi, Zumbè, Peligra e Geol. Sabatini	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n.2514 del 15 nov 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:		
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Basilio Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 669 del 21/09/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:						
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	GEO GAV Srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 521 del 08/10/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 596 del 25/07/2013	data contratto	24/09/2013
Contratto	10/10/2012	data conclusione lavori		Nuova costruzione siciliana srl	Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazione è stata affidata ad INVITALIA , il 15/11/2011 .*

*La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal DRPC ed i risultati sono stati trasmessi in data 23.02.2012.*

*L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), che, in data 16/02/2012, ha trasmesso i prodotti di restituzione dei voli aerei effettuati.*

*A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Basile, rivista a seguito delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC e secondo quanto discusso nel tavolo tecnico del 21/03/2012, il geologo della CGIAM, con nota acquisita al prot.n. 1157 del 04.04.2012, ha richiesto integrazioni alla relazione.*

*Con nota acquisita al prot. n.2041 del 07/06/2012 il geologo ha trasmesso la relazione finale di sintesi della campagna di indagini geognostiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale di Contrada Nasidi a Librizzi.*

*Con nota acquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012, la CGIAM ha trasmesso agli Uffici del Commissario le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini effettuate. Con D.C. n. 473 del 17/09/2012 sono state finanziate le indagini ed avviate le procedure per l'affidamento delle stesse.*

*A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di indagini Preliminari di cui l'Affidataria ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4781 del 19/11/2012.*

*CGIAM ha trasmesso in data 24/01/2013, con nota prot.n. 520, la relazione geologica dell'intervento.*

*In data 05/03/2013, con nota prot.n. 1361, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo dell'intervento.*

*A seguito della Conferenza dei Servizi del 22/05/2013, e dei 7 gg concessi agli Enti per esprimersi, il Commissario, con nota prot.n. 3451 del 10/06/2013, invita il RUP a procedere alla*

SAL

AVVIATI LAVORI






ME080	Librizzi	Opere di contenimento Librizzi centro						Importo ApQ	€ 150.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Intervento REVOCATO	Importo Rimodulato	€ 0,00
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'impegno			
						<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 0,00</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Geom. G. Adamo	Incarico conferito tramite:		Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
Contratto	data conclusione lavori		Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	INTERVENTO REVOCATO nel corso della riunione di Comitato del 24 febbraio 2011. Le risorse rese disponibili dalla mancata realizzazione delle opere, pari a € 150.000, sono state destinate all'intervento TP171 Salemi.	SAL	INTERVENTO REVOCATO
-----------------	---	-----	---------------------

ME081	Librizzi	Opere di consolidamento versante e sistemazione – Zona Ronco Marurà						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	707 - 17/12/2012	Importo Finanziato	€ 500.000,00	Decreto di Impegno	n.635 del 01/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 363.006,46		
Decreto di Finanziamento Indagini	106 - 28.06.2011	Importo Finanziato	€ 23.524,38	Decreto di Impegno Indagini	142 - 21/07/2011	Importo dell'Impegno	€ 16.912,60		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	468 del 20/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.177,64		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 523.524,38</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 381.321,70</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	INVITALIA	CGIAM
-------------	-----------	-------

**Figure Tecniche**

RUP	Geom. Santo di Perna (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 75 del 27 mag 11	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 75 del 27 mag 11
Progettista	INVITALIA Ing. Calogero, Ing. Morganti	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 254 del 08.03.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Mobilia Massimiliano	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 128 del 22/02/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Mobilia Massimiliano	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 128 del 22/02/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Filippo Gullo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 734 del 12/09/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	GIA EXPLORING SAS	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 142 del 22 lug 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	TEK Infrastrutture srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 32 del 17/01/2013	data contratto	
Contratto	26/07/2011	data conclusione lavori	08/08/2012			Verbale inizio attività	05-giu	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.*

*A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 142 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione, ad oggi concluse.*

*L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un rilievo topografico e una restituzione aerofotogrammetrica adeguata.*

*Con note assunte al prot. n. 498 del 16/02/2012, 1503 del 03/05/2012 e 2781 del 18/07/2010 la CGIAM ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.*

*Con nota acquisita al prot. n. 3724 del 27/09/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo.*

*A seguito della CdS tenutasi in data 10/10/2012, ed al parere espresso dall'ARTA (Serv. 3) con nota acquisita al prot. n. 4254 del 23/10/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri.*

*Con D.C. n. 707 del 17/12/2012 viene approvato e finanziato l'intervento*

*Il Commissario con D.C. n. 709 del 18.12.2012, approva la lettera d'invito ed avvio gara.*

*Con Decreto Commissariale n. 32 del 17/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della TEK Infrastrutture srl che ha offerto un ribasso del 29,8833%.*

*In data 09/04/2013 è stato redatto il verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3 Regolamento D.P.R. 207/2010.*

*In data 20/05/2013, con nota prot.n. 2951, il RUP autorizza il DL a procedere alla formale consegna dei lavori.*

*In data 05/06/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori.*

*Con Decreto Commissariale n. 635 del 01708/2013 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento.*

*In data 19/09/2013 è avvenuta la sospensione dei lavori.*

SAL

SOSPENSIONE LAVORI





ME087	Messina	Opere di consolidamento località Giampileri						Importo ApQ	€ 24.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno		Importo dell'Impegno			
							Eventuali Economie	€ 0,00	

**Figure Tecniche**

RUP		Incarico conferito tramite:		Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori		Decreto Affidamento Lavori		data contratto
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	l'intervento a seguito dell'OPCM 3886 del 9 luglio 2010, viene gestito dal Commissario Delegato di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009. I relativi fondi sono stati trasferiti nella contabilità speciale di cui al suddetto Commissario.				SAL	LAVORI ULTIMATI
-----------------	---	--	--	--	-----	-----------------






ME088	Messina	Opere di salvaguardia centro abitato in località Cumia e della strada di collegamento Bordonaro						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 15 SETT 2011	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	192 - 26/04/2012	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di Impegno	D.C. n. 169 del 08/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.239.939,74		
				Decreto di Impegno Pagamento GURI	230 - 18/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.146,92		
				Decreto di Impegno Pagamento Presidente Commissione di Gara	393 - 30/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 3.603,24		
				Decreto di Impegno Pagamento Progettazione	396 - 01/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 109.307,26		
				Decreto di Impegno Pagamento Pubblicazione estratto avviso gara	404 - 02/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 6.419,05		
				Decreto di Impegno Pagamento GURI	405 - 02/08/2012	Importo dell'Impegno	€ 874,28		
				Decreto impegno e pagamento publikompass	503 del 02/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 4.522,38		
				Decreto di impegno e pagamento Componenti	507 del 02/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 6.466,58		
				Decreto di impegno e pagamento RUP e personale UTC	516 del 04/10/2012	Importo dell'Impegno	€ 10.381,29		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
				Decreto di impegno e pagamento Studio geologico DL	725 del 20/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 64.089,67		
				Decreto di impegno PVS	372 del 21/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 16.144,30		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 2.464.494,71</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012	Supporto al RUP (Lavori)	Dott. Angelo Salvatore Nicastro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012	
RUP Espropri	Dirigente dell'Ufficio Espropri del Comune di Messina (Dott. Giovanni Bruno)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 562 del 26.10.2012	Supporto al RUP (Progettazione)	Riccardo Contestabile	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 186 del 30.05.2012	
Progettista	Comune Ing. Antonino Sutera	Incarico conferito tramite:	Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 97 del 22.02.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto	Incarico conferito tramite:	Deliberazione Giunta Comunale prot.n. 102 del 22.02.2011			Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Antonino Sutera	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012	Assistenza Geologica alla DL	Dott. Geol. Vincenzo Pinnizzotto	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 585 del 07/11/2012	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Antonino Sutera	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 328 del 10/07/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Sparacino	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 407 del 02.08.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Sparacino	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 407 del 02.08.2012	
INDAGINI preliminari affidate a:	SIGEO	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA	Pettinato Costruzioni	Decreto Affidamento Lavori	382 - 20.07.2012	data contratto

Contratto		<i>data conclusione lavori</i>	Esecuzioni Lavori	srl	<i>Verbale inizio attività</i>	31/07/2012	<i>data presunta di termine lavori</i>	25/10/2013
-----------	--	--	-------------------	-----	------------------------------------	------------	--	------------

STATO DELL'ARTE	<p><i>La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 22.02.2011</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.03.2012 è stato richiesto al Comune di rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3.</i></p> <p><i>Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 e finanziato con Decreto n. 192 del 26.04.2012.</i></p> <p><i>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 382 del 20.07.2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</i></p> <p><i>Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012, i lavori consegnati il 31.07.2012 e dovranno concludersi entro il 27/07/2013.</i></p> <p><i>Con D.C. n. 421 del 09.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del perfezionamento del procedimento espropriativo.</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n.169 del 08/03/2013 si dispone l'impegno delle somme pari ad € 2.239.939,74.</i></p> <p><i>Con D.C. n. 372 del 21/05/2013 viene notificata la presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa dei lavori.</i></p>	SAL	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
--------------------	---	-----	---

ME089_1	Messina	Opere di consolidamento località Galati S. Anna						Importo ApQ	€ 900.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	D.C. n. 593 del 08/11/2012	Importo Finanziato	€ 900.000,00	Decreto di Impegno	D. C. n.546 del 12/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 632.964,88		
				Decreto di Presa atto PVS e impegno aggiuntivo	D. C. n. 942 del 07/11/2013	Importo dell'Impegno	€ 46.551,60		
				Decreto di Impegno GURI	D. C. n. 26 del 15/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.000,07		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
				Decreto di Impegno Commissione di Gara	415 - 06/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 555,17		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 900.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 681.446,72</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	-
--------------------	---

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Antonino Amato (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 379 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligra (FINO AL 31/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 379 del 20.07.2012		
Progettista	Comune Geom. Currò	Incarico conferito tramite:	incarico interno con nota n. 57 del 13/02/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:			
Geologo	Comune	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta municipale n. 99 del 22/02/2011	supporto alla progettazione	Comune Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	incarico interno con nota n. 74 del 02/03/2012		
Direttore Lavori	Geom. Domenico Currò (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 23 del 15/01/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Domenico Currò (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 23 del 15/01/2013						
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	C&P srl	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 733 del 21/12/2012	data contratto	
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	06/03/2013	data presunta di termine lavori	02/09/2013

STATO  
DELL'ARTE

*Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B*  
*Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011*  
*l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci.*  
*Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.*  
*La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 444,*  
*trasmette la documentazione amministrativa.*  
*Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del*  
*Commissario copia del Progetto esecutivo.*  
*A seguito della CdS tenutasi in data 23.08.012 sono stati acquisiti tutti i pareri.*  
*Con Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 è stato finanziato l'intervento, e con Decreto*  
*n. 733 del 21/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della C&P*  
*srl (ribasso del 28,9554%).*  
*In data 06/03/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il termine utile per ultimare i lavori è*  
*stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire*  
*entro il 02/09/2013*  
*Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie*  
*alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 632.964,88.*  
*Con Decreto n. 725 del 11/09/2013 è disposto il pagamento del II SAL*

SAL



AVVIATI LAVORI

ME089_2	Messina	Opere di consolidamento località Mili San Marco						Importo ApQ	€ 1.390.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	
-------------	--

Figure Tecniche								
RUP	Ing. Antonino Amato (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. 381 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Giuseppe Morganti (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D. C. 381 del 20.07.2012	
Progettista	Comune	Arch. Teresa Donato	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta Comunale n. 1538 del 30/12/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Comune	Geol. Sergio Doffin	Incarico conferito tramite:	Delibera giunta Comunale n. 1543 del 30/12/2011	Supporto alla progettazione	Ing. Rossella Zumbè	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 464 del 14.02.2012
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B                  Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci                  Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.                  La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 446, ha trasmesso la documentazione amministrativa.                  Con nota prot.n. 464 del 14/02/2012 il Commissario, in riscontro alle richieste del Comune, ha nominato un tecnico interno a supporto della progettazione.                  Con nota prot.n. 2976 del 01.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della documentazione integrativa allo studio geologico.                  In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto rielaborato dal progettista in data 30/11/2012.                  A seguito della CdS tenutasi in data 20/02/2013, il Progettista trasmette, con nota prot.n. 1172 del 25/02/2013, le integrazioni richieste dall'ARTA Serv. 3, a cui sono concessi 7 gg per esprimere il parere di propria competenza.                  In data 27/03/2013, con nota prot.n. 1866, l'Ufficio del Commissario sollecita l'ARTA (serv. 3) al rilascio del parere.</p>	SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	---	-----	--


<b>ME089_4</b>	<b>Messina</b>	<b>Opere di consolidamento località Santa Margherita</b>						Importo ApQ	<b>€ 650.000,00</b>
	<b>ME089_4a</b>	<b>ME089_4a Opere di mitigazione del rischio idrogeologico sull'alveo del torrente Santo Stefano e realizzazione della bretella di collegamento in località Santa Margherita</b>						Importo	
	<b>ME089_4b</b>	<b>ME089_4b Lavori di rifioritura massi a protezione del tratto litorale prospiciente il complesso edilizio Marina Sud nel Vill. S.Margherita nel Comune di Messina</b>						Importo	
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011</b>	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B  Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci  Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento ME 089_4a	699 - 13/12/2012	Importo Finanziato	€ 395.650,00	Decreto di Impegno ME 089_4a	258 - 05/04/2013	Importo dell'impegno	€ 306.390,20		
Decreto di Finanziamento ME 089_4b	182- 12/03/2013	Importo Finanziato	€ 70.000,00	Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'impegno	€ 225,00		
				Decreto di impegno Commissione di Gara	516 - 08/07/2013	importo dell'impegno	€ 323,16		
				Decreto di Impegno ME 089_4b	535 del 10/07/2013	importo dell'impegno	€ 50.737,60		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 465.650,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 357.675,96</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**CONVENZIONI**

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Salvatore Bartolotta (ME089_4a) Ing. B. Manfrè (ME089_4b)	Incarico conferito tramite:	(ME089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012 (ME 089_4b) nota in entrata prot. n. 1155	Supporto al RUP (ME089_4a)	(ME089_4a) Dott.ssa Flavia Liistro (FINO AL 30/01/2013)  (ME 089_4b) Arch. Carmelo Bianco	Incarico conferito tramite:	(ME089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012; (ME 089_4b) nota in entrata prot. n. 1155
RUP (ME089_4a)	Geom. Marco Mancuso (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. 378 del 20.07.2012	RUP Espropri (ME089_4a)	Dirigente Ufficio Espropri del Comune	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 43 del 22/01/2013
Progettista (ME089_4a)	Comune Geom. Domenico Currò	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 650 del 27/11/2012	Collaboratore Tecnico alla Progettazione (ME089_4a)	Geom. Giacomo Giacobbe (UTC)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot.n. 283195 del 22/11/2012
Progettista (ME089_4b)	DRPC Ing. F. Bongiovanni	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot. n. 1155 del 22/02/2013	Collaboratori amministrativi (ME 089-4b)	Arch. M. Dagro, Geom. A. F. Zingale (DRPC Me)	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Comune Geol. Domenico Pontillo	Incarico conferito tramite:	Deliberazione giunta comunale n. 103 del 22/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori (ME089_4a)	(ME 089_4a) Geom. Domenico Currò Comune (ME089-4b) Ing. Fabio Bongiovanni DRPC	Incarico conferito tramite:	(ME 089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012 ME089_4b nota in entrata prot. n. 1155	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		<b>AFFIDATARIA</b> Esecuzioni Lavori	<b>ROMEEO COSTRUZIONI S.R.L (ME089_4aA)</b>	Decreto Affidamento Lavori	ME 089_4aA n. 20 del 14/01/2013 ME 089_4bA n. 336 del 10/05/2013	data contratto	ME 089_4aA 23/01/2013
Contratto	data conclusione lavori			<b>ECOAMBIENTE Soc. Coop. a r.l. (ME089_4bA)</b>	Verbale inizio attività	<b>20/04/2013</b>	data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B</i></p> <p><i>Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci</i></p> <p><i>Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.</i></p> <p><i>La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 443, ha trasmesso la documentazione amministrativa.</i></p> <p><i>A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il DRPC a trasmettere, entro 45 giorni, il progetto del rifioramento del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio in località Santa Margherita .</i></p> <p><i>A seguito della CdS tenutasi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.</i></p> <p><i>Il DRPC in data 10/12/2012, con nota assunta al prot.n. 5191, trasmette copia del progetto esecutivo di rifioritura massi.</i></p> <p><i>Il Commissario con Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012 approva e finanzia l'intervento</i></p> <p><i>Con Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME089_4aA_Messina, a favore della ROMEO COSTRUZIONI S.R.L ribasso percentuale del 29,2246 %.</i></p> <p><i>In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.</i></p> <p><i>A seguito della CdS dell'intervento ME 089_4b tenutasi in data 23/01/2013 il Commissario concede 7 giorni per esprimersi agli Enti che non hanno ancora comunicato il parere di propria competenza.</i></p> <p><i>L'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 874 del 08/12/2012, comunica che l'intervento ricade in aree non perimetrate nel PAI.</i></p> <p><i>Con D.C. n. 182 del 12/03/2013 è stato finanziato l'intervento ME089_4b, e con D.C. n. 258 del 05/04/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento ME089_4a.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 336 del 10/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori relativi</i></p>	<p>SAL</p>	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
----------------------------	---	------------	---



ME089_3	Messina	Opere di consolidamento località Mili San Pietro						Importo ApQ	€ 510.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n.383 del 20/07/2012	Importo Finanziato	€ 505.354,78	Decreto di Impegno	831 - 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 383.477,82		
				Decreto di Impegno Indagini	466 - 20/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 20.262,28		
				Decreto di Impegno Commissione di Gara	286 - 17/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 397,23		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 505.354,78</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 404.362,33</b>	Economie da finanziamento	<b>€ 510.000,00</b>
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI

Figure Tecniche

RUP	Geom. Marco Mancuso (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 226 del 17.05.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligra (FINO AL 31/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 226 del 17.05.2012	
Progettista	Comune	Ing. Angelo Ermes Di Dio	Incarico conferito tramite:	Determina giunta comunale n. 98 del 22/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:		
Geologo	Comune	Geol. Fabio Nicita	Incarico conferito tramite:	Determina giunta comunale n. 105 del 22/02/2011		Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori		Ing. Angelo Di Dio	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 21 del 14/01/2013	Assistente al DL	Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Ditta Projet s.r.l.	Decreto Affidamento Lavori	data contratto	24-set
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B                      Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011                      l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci                      Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.                      La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 445, ha trasmesso la documentazione amministrativa.                      Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1760 del 17.05.201, copia del progetto esecutivo aggiornato.                      A seguito della conferenza dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.                      In data 20/07/2012 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto.                      Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso al Commissario il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1.                      Con D. C. n. 831 del 08/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>						SAL	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI
-----------------	---	--	--	--	--	--	-----	--------------------------------------



ME089_5	Messina	Opere di consolidamento località Santo Stefano Briga						Importo ApQ	€ 550.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	note:	Nel Comitato del 21 ottobre 2010: Intervento transita da A a B Nel Comitato del 24 febbraio 2011: diviso in 5 stralci; Nel Comitato del 15 settembre 2011: transitano nuovamente in A	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	
-------------	--


Figure Tecniche									
RUP	Geom. Domenico Currò (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. 380 del 20.07.2012	Supporto al RUP	Ing. Alberto Peligra (FINO AL 31/01/2013)	Incarico conferito tramite:	D. C. 380 del 20.07.2012		
Progettista	Comune	Geom. Domenico Currò	Incarico conferito tramite:	nota interna n. 73 del 02/03/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Comune	Geol. Salvatore Maio	Incarico conferito tramite:	Deliberazione Giunta comunale n. 1544 del 30/12/2011	Supporto alla progettazione	Comune	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	incarico interno con nota n. 73 del 02/03/2012
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL			Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:						
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo			Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B                  Nel " Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci                  Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.                  La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 442, ha trasmesso la documentazione amministrativa.                  A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg.                  In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5006, il Commissario autorizza il Comune di Messina a procedere alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva dell'intervento.</p>	SAL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
-----------------	---	-----	----------------------------------

ME091	Mirto	Consolidamento centro abitato						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	531 - 08/07/2013	Importo Finanziato	€ 2.427.687,47	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari	116 - 05/07/2011	Importo Finanziato	€ 23.937,27	Decreto di Impegno Indagini preliminari	144 - 21/07/2011	Importo dell'Impegno	€ 20.430,35		
Decreto di Finanziamento Indagini preliminari integrative	205 - 08/05/2012	Importo Finanziato	€ 48.375,26	integrazione Decreto di Impegno Indagini preliminari	455 - 11/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 143,89		
				Decreto di Impegno GURI avviso di gara	592 - 23/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.086,77		
				Decreto di Impegno e Pagamento avviso di gara	782 - 26/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.894,32		
				Decreto di Impegno Indagini preliminari integrative	649 - 27/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 29.821,15		
				Decreto di Impegno GURI avviso di gara	839 - 09/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 854,69		
				Decreto di Impegno pubblicazione esito di gara	920 - 31/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.073,60		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 57.304,77</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA	CGIAM
--------------------	-----------	-------

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Giuseppe Nastasi (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 93 del 14 giugno 2011	Supporto al RUP	Ing. Federica Bottini	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 23 del 23 gennaio 2012		
Progettista	INVITALIA	Arch. Fabio Pulizzi, Ing. Fabio Ferla, Ing. Alberto Peligra, Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 646 del 09.05.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:			
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM	Collaboratore Amministrativo	Arch. Carmelo Blancato	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 681 del 28/08/2013		
Direttore Lavori	Ing. Antonio Sorge	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 681 del 28/08/2013	Direttore Operativo	Arch. Franco Benedetti Arch. Maurizio Venuti	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 681 del 28/08/2013		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Vincenzo Sorce	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 682 del 28/08/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Collaudatore Statico	Ing. Andronico Daniele	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6363 del 20/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Andronico Daniele	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6363 del 20/10/2013		
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL GEOMERID (Indagini preliminari integrative)	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 144 del 22 lug 2011 Indagini preliminari integrative D.C.. 50 del 30/05/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Colnisa Costruzioni srl	Decreto Affidamento Lavori	790 - 30/09/2013	data contratto	
Contratto	26/07/2011	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.*

*Con Decreto n. 144 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione ad oggi concluse.*

*In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche inerenti ulteriori indagini da effettuare sul sito di cui il RUP ha preso atto in data 27.04.2012.*

*Con Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 sono state approvate le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione e dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse.*

*Con Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari integrative.*

*Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 16/07/2012, con la trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 2754 in pari data.*

*Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della relazione geologico-tecnica.*

*Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo.*

*A seguito della CdS tenutasi giorno 06/03/2013 sono acquisiti tutti i pareri con esito positivo, ad eccezione di quelli di competenza dell'ARTA (Serv. 3) che, con nota prot.n. 1576 del 13/03/2013, ha espresso prescrizioni che occorrerà rispettare.*

*In data 07/06/2013 con nota prot.n. 3406, Invitalia trasmette le integrazioni richieste dall'ARTA.*

*In data 09/07/2013, con nota prot.n. 4104, il RUP trasmette al Commissario verifica e validazione del progetto esecutivo.*

*Con Decreto n. 531 del 09/07/2013 è stato finanziato l'intervento.*

*Con Decreto n. 675 del 26/08/2013 viene nominata la Commissione di Gara.*

*Con Decreto n. 790 del 30/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Colnisa Costruzioni srl.*

SAL

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI  
LAVORI




ME092	Mistretta	Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta – Torrente Santa Domenica						Importo ApQ	€ 800.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	586 - 07/11/2012	Importo Finanziato	€ 778.679,50	Decreto di Impegno	419 - 07/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 567.419,42		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 330 del 18/11/2011	Importo Finanziato	€ 21.320,50	Decreto impegno indagini preliminari	Decreto n. 367 del 12/12/2011	Importo dell'Impegno	€ 12.780,44		
				Decreto di pagamento e disimpegno parziale somme decreto 367/2011	Decreto n. 419 del 08/08/2012	Importo dell'Impegno	-€ 2,49		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 800.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 580.422,37</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Geom. Rosario Mazzurco (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 16.11.2011	Supporto al RUP	Arch. Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.326 del 16.11.2011
Progettista	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 746 del 07.03.2012	Supporto Tecnico, Geotecnico specialistico, e di Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Sebastiano Azzolina	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 313 del 04.05.2012
Geologo	Dr.ssa Mazzarella Grazia	Incarico conferito tramite:	Determina Dirigenziale n. 319 del 08.05.2012			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 181 del 12/03/2013	Assistente al DL	Ing. Sebastiano Azzolina	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 181 del 12/03/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Geom. Lucio Pani (UTC)	Incarico conferito tramite:	Determinazione n. 83 del 01/02/2013				
Collaudatore Statico	Arch. Angelo Cellura	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 384 del 24/05/2013 <b>Dimessosi con nota prot.n. 4840 del 06/08/2013</b>				
Collaudatore Statico	Ing. Basilio Ceraolo	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 663 del 19/08/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO RAS (IAP)	Decreto di affidamento INDAGINI	Prot. n. 806 del 29 novembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Geodesia srl	Decreto Affidamento Lavori	710 - 18/12/2012	data contratto	
Contratto	15/12/2011	data conclusione lavori	21/01/2012			Verbale inizio attività	03/04/2013	data presunta di termine lavori	

<p>STATO DELL'ARTE</p>	<p><i>Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, ha restituito i dati del rilievo aereo effettuato.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot.n. 1526 del 07.05.2012, il Comune ha comunicato che il progetto sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che verrà affiancato, per la progettazione specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di coprogettista, incarico già autorizzato con nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purchè eseguito ai sensi delle norme vigenti. Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012, ha trasmesso il progetto esecutivo.</i></p> <p><i>Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha revocato alla CGIAM l'incarico. A seguito della CdS tenutasi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/assensi dagli Enti interessati per l'approvazione del progetto.</i></p> <p><i>Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2012, ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.</i></p> <p><i>L'intervento è stato finanziato con D.C. n. 586 del 07/11/2012 e con D.C. n. 626 del 20/11/2012 sono state avviate le procedure di gara.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara con D. C. n. 710 del 18/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, e giorno 03/04/2013 ha avuto luogo la formale consegna dei lavori. Con Decreto n. 419 del 07/06/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</i></p> <p><i>In data 23/08/2013 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.</i></p>	<p>SAL</p>	<p>SOSPENSIONE LAVORI</p> 
----------------------------	---	------------	---

ME095	Naso	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	importo aumentato con le risorse derivanti dalla mancata realizzazione dell'intervento di Scaletta Zanclea ME117_3 (pari a € 1050.000)	Importo Rimodulato	€ 1.650.000,00
Decreto di Finanziamento	191 - 14/03/2013	Importo Finanziato	€ 1.635.000,00	Decreto di Impegno	Decreto n. 579 del 18/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.232.005,50		
				Decreto di Impegno e Pagamento spese di pubblicazione sulla GURI avviso esito di gara	363 - 17/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.083,94		
				Decreto di Impegno e Pagamento spese di pubblicazione avviso esito di gara	493 - 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 726,00		
				Decreto di Impegno e Pagamento Presidente Commissione di Gara	497 - 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 629,14		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.635.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.235.044,58</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Mario Sidoti Migliore (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012	Supporto al RUP	Ing. Rossella Zumbè (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012	
Progettista	UTC	Arch. Mario Messina	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n.37 del 1 giugno 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n. 42 del 28.06.2012
Geologo			Incarico conferito tramite:		Geotecnico	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Determinazione del Sindaco n. 42 del 28.06.2012
Direttore Lavori	Arch. Mario Messina	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 459 del 18/06/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:						
Collaudatore Statico	Ing. Giovanni Culici Amato	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 3686 del 18/06/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Giovanni Culici Amato	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 3686 del 18/06/2013	
INDAGINI preliminari affidate a:	Trigeo srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori <b>EVER GREEN SRL UNIPERSONALE</b>	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 341 del 13/05/2013	data contratto	16-lug
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	18-nov

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 37 del 01.06.2011.*

*Con nota acquisita al prot.n. 1293 del 16.04.2012 il Comune ha comunicato di voler affidare incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e tali incarichi sono autorizzati dal Commissario con nota prot. n. 1319 del 20/04/2012, purchè conferiti nei rispetti delle norme vigenti.*

*In riscontro alla nota di sollecito del Commissario, con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 del 14/01/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 copie del Progetto Esecutivo.*

*A seguito della CdS tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, ad eccezione del GC di Messina che, con nota prot.n. 1281 del 28/02/2013 richiede integrazioni.*

*In data 28/02/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.*

*Con D.C. n. 191 del 14/03/2013 è stato disposto il Finanziamento dell'intervento.*

*A seguito delle procedure di gara con D.C. n. 341 del 13705/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'Impresa EVER GREEN SRL*

*UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%.*

*Giorno 09/07/2013 è stato sottoscritto il contratto.*

SAL

AVVIATI LAVORI



ME099	Piraino	Opere di consolidamento – Zona Roda - S.Costantino, Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole						Importo ApQ	€ 1.100.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento Lavori S. Leonardo	Decreto n.493 del 25/09/2012	Importo Finanziato	€ 668.652,86	Decreto di Impegno	618 - 30-7-13	Importo dell'Impegno	€ 486.321,04		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari S. Leonardo	Decreto n 79del 07/06/2011	Importo Finanziato	€ 23.210,64	Decreto di Impegno Indagini preliminari S. Leonardo	Decreto n 79del 07/06/2011	Importo dell'Impegno	€ 16.707,42		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari integrative S. Leonardo	Decreto 306 del 04/11/2011	Importo Finanziato	€ 3.049,32	Decreto di pagamento e Impegno Indagini preliminari S. integrative Leonardo	Decreto n. 231 del 18/05/2012	Importo dell'Impegno	€ 2.868,62		
				Decreto di pagamento e Impegno GURI (S. Leonardo)	Decreto n. 25 del 15/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.083,94		
				Decreto di pagamento e Impegno esito gara (S. Leonardo)	Decreto n. 219 del 26/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089,00		
				Decreto di pagamento e Impegno esito gara (S. Leonardo)	Decreto n. 261 del 05/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 442,90		
				Decreto di pagamento e Impegno commissione di gara (S. Leonardo)	Decreto n. 398 del 04/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.158,07		
Decreto di Finanziamento S. Costantino	Decreto 478 del 25/06/2013	Importo Finanziato	€ 321.695,39	Decreto di Impegno S. Costantino	Decreto 767 del 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 239.234,04		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari S. Costantino	Decreto 221 del 16/05/2012	Importo Finanziato	€ 21.610,06	Decreto di Impegno Indagini preliminari S. Costantino	Decreto n. 696 del 18/12/2012	Importo dell'Impegno	€ 12.468,99		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari Torre delle Ciavole	Decreto 451 del 10/09/2012	Importo Finanziato	€ 17.981,87	Decreto di Impegno e Pagamento Indagini Preliminari	521 - 09/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 11.398,53		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.056.200,14</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 773.147,55</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Geom. Carmelo Leone (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 89 del 14 giugno 2011	Supporto al RUP	Ing. Adriano Grassi (IAP) (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 26 del 23 gennaio 2012
	Geom. Sarino Giuffrè (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto n. 680 del 28 agosto 2013		Ing. Federica Bottini	Incarico conferito tramite:	Nomina:Decreto n. 89 del 14 giugno 2011 Revoca: Decreto n.37 del 25/01/2012
Progettista	INVITALIA	Ing. Calogero, Morganti, Peligra e Geol. Sabatini	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 646 del 09.05.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	



Geologo (S. LEONARDO - S. COSTANTINO)	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA	Geologo (TORRE CIAVOLE)	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM
Direttore Lavori	Ing. Domenico Gaetano Alampi	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 89 del 07/02/2013				
Direttore Lavori	Ing. Domenico Gaetano Alampi	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 791 del 30/09/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico	Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 910 del 30/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Giuseppe Parasiliti Collazzo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 910 del 30/10/2013
Collaudatore Statico	Ing. Carmelo Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 911 del 30/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Carmelo Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 911 del 30/10/2013

INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID SRL GEO PLANTS (integrative) GEO GAV Srl (S. Costantino) TRIVELSICILIA (Torre delle Ciavole)	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto 79 del 7 giu 2011 Decreto 366 del 12 dic 2011 Decreto n. 256 del 04 giu 2012 Decreto n. 529 del 11/10/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Terramare srl (S. Leonardo)	Decreto Affidamento Lavori	735 - 27/12/2012	data contratto
Contratto	09/06/2011 14/12/2011 08/06/2012 GEO GAV	data conclusione lavori	30/07/2011			Verbale inizio attività	13-mag	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.</p> <p><b>SAN LEONARDO:</b></p> <p>- Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012;</p> <p>-A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri;</p> <p>Con nota assunta al prot. n.1952 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il progetto esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC.</p> <p>Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo da parte di RFI. A seguito di rinuncia da parte di RFI al riutilizzo, il Commissario, con nota prot. n. 2623 del 11/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il Quadro Economico dell'intervento in funzione del mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla riprofilatura degli argini del torrente Garofalo.</p> <p>Con nota prot.n. 3232 del 27.08.2012 Il RUP ha invitato il GdL a predisporre una variante al progetto, prevedendo la sistemazione del materiale proveniente dagli scavi nel tratto faciale del Torrente Garofalo o, in alternativa, nella medesima area d'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo", e con D. C. n. 660 del 03/12/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.</p> <p>Con Decreto n. 735 del 27/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Terramare srl, e giorno 14/02/2013 verrà stipulato il contratto..</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 784 del 05/02/2013 il RUP trasmette il verbale di cui all'art. 106</p>	SAL	AVVIATI LAVORI
STATO DELL'ARTE	<p><b>SAN COSTANTINO:</b></p> <p>Invitalia ha prodotto le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione.</p> <p>Con Decreto n. 256 del 04/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ed il contratto è stato sottoscritto in data 08/06/2012.</p> <p>Le indagini hanno avuto inizio in data 25/07/2012 e sono state completate con la trasmissione dei risultati con nota acquisita al prot.n. 3159 del 21/08/2012</p> <p>In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5110, Invitalia ha trasmesso copia del Progetto Esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi giorno 20/02/2013 risultano acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.</p> <p>Con Decreto n. 478 del 25/06/2013 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con D. C. n. 513 del 05/07/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso.</p> <p>Con D.C. n. 613 del 30/07/2013 è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla TECNO COSTRUZIONI S.r.l. a fronte di un ribasso percentuale pari al 31,4646.</p> <p>In data 10/09/2013 ha luogo la stipula del contratto.</p> <p>Con Decreto n. 767 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>In data 24/10/2013 ha avuto luogo la consegna dei lavori</p>		AVVIATI LAVORI
STATO DELL'ARTE	<p><b>TORRE DELLE CIAVOLE:</b></p> <p>Dopo diversi tentativi con ANAS per la ricerca di collaborazione per il cofinanziamento e la progettazione dell'intervento che interessava un tratto di strada di loro competenza e a seguito della loro mancata disponibilità, il Commissario ha deciso di procedere autonomamente.</p> <p>in virtù dell'Accordo Quadro del 29.11.2011, la CGIAM In data 10/07/2012 ha trasmesso il "Programma Operativo per l'esecuzione del piano di Indagini preliminari" in località Torre delle Ciavole.</p> <p>Con Decreto n. 451 del 10/09/2012 sono state approvate le specifiche tecniche afferenti il piano di indagini preliminari e avviate le procedure di gara.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 529 del 11/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ed in data 09/01/2013 l'aggiudicatario trasmette gli elaborati tecnici.</p>		PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO

ME100	Raccuja	Opere di consolidamento – Zona Centro abitato (c.da Zappa)						Importo ApQ	€ 5.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	Intervento REVOCATO	Importo Rimodulato	€ 0,00
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	INVITALIA	CGIAM
-------------	-----------	-------

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Marco Calogero (FINO AL 29/01/2013)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 173 del 18.04.2012	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	INVITALIA	Arch. Pulizzi, Ing. Peligra, Ing. Coroneo, Ing. Zumbè	Incarico conferito tramite:	nota n. 425 del 10/02/2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori			Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP (a seguito di rinuncia del DRPC di Messina precedentemente incaricato).</p> <p>Il DRPC, con nota acquisita al prot.n. 954 del 21.03.2012, ha trasmesso copia del piano delle indagini geognostiche e del monitoraggio strumentale geotecnico dell'intervento da loro stessi effettuate, in virtù dell'incarico precedentemente conferitogli.</p> <p>In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, la stessa ha trasmesso, con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo aereo effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1258 del 12 aprile 2012 la stessa ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare.</p> <p>Nel Corso del Comitato del 18/05/2012 è stato deciso di sospendere ogni attività.</p>	SAL	INTERVENTO REVOCATO
-----------------	---	-----	---------------------




<b>ME105</b>	<b>Rometta</b>	<b>Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare</b>						Importo ApQ	<b>€ 1.000.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 21 OTT 2010</b>	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Nicolò Cannata	Comune	Incarico conferito tramite:	decreto n. 578 del 18/07/2013	Supporto al RUP	Incarico conferito tramite:	
Progettista	ARTEC Associati srl		Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo			Incarico conferito tramite:			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori			Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione			Incarico conferito tramite:				
Collaudatore Statico			Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:		Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori		verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto <b>definitivo</b> generale delle opere e della documentazione amministrativa, e con nota prot.n. 4103 del 16/10/2012 il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere in tempi brevi copia del progetto esecutivo.</p> <p>In data 07/03/2013, con nota prot.n. 1381, l'UTC trasmette alla Struttura Commissariale il Progetto Definitivo dell'intervento.</p> <p>Con nota prot. n. 3503 del 12/06/2013 l'ARTA Serv.3 esprime positivamente il parere di propria competenza. A seguito della CdS di giorno 31/07/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento (progetto definitivo).</p> <p>In data 08/11/2013, con nota prot.n. 6724, la ARTEC srl trasmette copia del progetto esecutivo dell'intervento.</p>	SAL	<p>PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI</p> 
------------------------	---	-----	---

ME106	Sant'Alessio Siculo	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato						Importo ApQ	€ 5.000.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	Comitato 21 OTT 2010	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di acquisizione e finanziamento progetto esecutivo	n. 187 del 26/04/2012	Importo Finanziato	€ 191.864,80	Decreto di Impegno competenze di progettazione	n. 340/13 del 10/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 191.864,80		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	660 - 09/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.149,68		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	785 - 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.028,85		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione GURI	869 - 17/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 903,73		
				Decreto di Impegno e pagamento spese pubblicazione affidamento DL	932 - 05/11/2013	Importo dell'Impegno	€ 3.959,12		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 191.864,80</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 200.906,18</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

CONVENZIONI

Figure Tecniche

RUP	Arch. Gaetano Faranna (Responsabile dell'UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 239 del 24.05.2012	Supporto al RUP	Geom. Giuseppe Ferrante	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 239 del 24.05.2012
Progettista	Comune: Ing. Francesco Giordano	Incarico conferito tramite:	Delibera di Giunta Municipale N.167 del 15/07/1997	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Ugo Piacentini	Incarico conferito tramite:	Delibera di Giunta Municipale N.250 del 05/11/1997	Geotecnico	Ing. Calogero Valore	Incarico conferito tramite:	Delibera di Giunta Municipale N.249 del 05/11/1997
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ATI - Angelo De Cesaris srl	Decreto Affidamento Lavori	837 - 09/10/2013	data contratto	
contratto	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 21/10/2010 con nota prot. N.629 del 17/11/2010 l'intervento è stato trasmesso all'ARTA.*

*L'ARTA Serv. 3, con nota acquisita al prot. N. 996 del 23/03/2012, ha comunicato al Commissario essere l'ente beneficiario dell'intervento e lo invita a raccordarsi con il Comune di S.Alessio Siculo.*

*Con nota acquisita al prot. n. 1069 del 29/03/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al - 3° Lotto Funzionale Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato I- STRALCIO ESECUTIVO*

*Con Decreto Commissariale n. 187 del 26/04/2012 è stata acquisita la progettazione definitiva eseguita da progettisti incaricati dal Comune.*

*In sede di conferenza dei servizi del 15/05/2012 sono state richieste integrazioni al fine di ottemperare alle prescrizioni formulate dagli Enti.*

*A seguito dell'adeguamento del progetto, con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso all'ARTA Serv.3 copia del progetto munito di tutti i visti di approvazione e tutta la documentazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'emissione del Decreto di finanziamento.*

*In data 30-05-2013 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo.*

*Con nota acquisita al prot. n. 4065 del 08/07/2013 il RUP dichiara che gli elaborati di progetto in formato PDF, messi a gara, sono conformi agli elaborati in formato cartaceo, debitamente sottoscritti da tutti i soggetti interessati.*

*Con Decreto n. 627 del 31/07/2013 si prende atto del DDG n. 126 del 11/03/2013 dell'ARTA di finanziamento dell'intervento, approvazione bando e disciplinare di gara.*

*Con Decreto n. 837 del 09/10/2013 viene comunicata alla Angelo De Cesaris srl l'aggiudicazione definitiva dei lavori.*

SAL

Affidamento Lavori



ME109	San Pier Niceto	Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	734 - 21/12/2012	Importo Finanziato	€ 552.953,81	Decreto di Impegno	364 - 20/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 429.593,24		
Decreto di Finanziamento indagini preliminari	Decreto n. 313 del 11/11/2011	Importo Finanziato	€ 47.046,19	Decreto di pagamento e impegno indagini preliminari	Decreto n. 374 del 19/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 33.639,73		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 600.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 463.457,97</b>		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA
--------------------	-----------

Figure Tecniche							
RUP	Geom. Francesco Maio (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale N. 301 del 31 ott 2011	Supporto al RUP	Arch. Giovanni Piero Di Magro	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale N. 301 del 31 ott 2011
Progettista	INVITALIA	Ing. Imbroglia, Ing. Coroneo, Arch. Pulizzi, Ing. Peligra, Ing. Zumbè	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 425 del 10 feb 2012	Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. G. Sabatini	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE INVITALIA			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 76 del 01/02/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Cono Galipò	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 76 del 01/02/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Alongi Ugo Maria	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 200 del 18/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante) (IAP)	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 345 del 30 novembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Gresy Appalti srl	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 33 del 21/01/2013	data contratto	12/03/2013
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	03-lug	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.  
A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 345 del 30.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari, ad oggi concluse.*

*Con nota acquisita al prot. n. 4359 del 26/10/2012 Invitalia ha trasmesso il progetto esecutivo.  
A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari.  
Con D.C. n. 734 del 21/12/2012 è stato finanziato l'intervento.*

*A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 33 del 21/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un ribasso percentuale pari a 29,9559%.*

*In data 04/03/2013 il RUP e la Gresy Appalti srl sottoscrivono Verbale di Accertamento permanenza condizioni per immediata esecuzione dei lavori.*

*In data 20/05/2013, con Decreto n. 364 è stato disposto l'impegno delle somme.*

*In data 03/07/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.*

SAL

AVVIATI LAVORI



ME113	Santa Marina Salina	Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro						Importo ApQ	€ 2.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento rilievi batimetrici	Decreto n. 123 del 26/03/2012	Importo Finanziato	€ 22.464,00	Decreto di impegno e pagamento rilievi batimetrici	Decreto n. 123 del 26/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 22.464,00		
Decreto di Finanziamento Plottaggio Tavole Grafiche	432 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 494,77	Decreto di Impegno Plottaggio Tavole Grafiche	432 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 494,77		
Decreto di Finanziamento pubblicazione Avviso pubblico VIA	Decreto n. 630 del 01/08/2013	Importo Finanziato	€ 1.439,90	Decreto di Impegno pubblicazione Avviso pubblico VIA	Decreto n. 630 del 01/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.439,90		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 24.398,67</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 24.398,67</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	Prov.to Int.le OO.PP.
--------------------	-----------------------

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.460 del 27.10.2010	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:	
Progettista	Prov. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.460 del 27.10.2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Bellomo Sebastiano	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1527 del 07.05.2012			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
Contratto	data conclusione lavori		Verbale inizio attività	data presunta di termine lavori

STATO DELL'ARTE	<p>In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Prov. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria. A seguito della riunione del 21/09/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa costiera da via Nero a Punta Lingua.</p> <p>Con nota prot.n. 2234 del 20.06.2012, il Prov. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in corso la rimodulazione delle scelte progettuali.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/02/2013.</p> <p>Con nota prot. n. 1493 del 11/03/2013 il Provveditorato trasmette il Progetto Generale Definitivo per un importo pari ad € 3.700.000,00 ed il Progetto Esecutivo 1°Stralcio per un importo di € 2.000.000,00.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi del 10/05/2013, si resta in attesa dei pareri non ancora pervenuti.</p>	SAL	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI
-----------------	--	-----	--



ME115_1	Sant'Angelo di Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011		note: Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 interventi.	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	151 - 27/7/2011	Importo Finanziato	€ 3.000.000,00	Decreto di Impegno	24 - 15/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.675.342,21		
				Decreto di Impegno AVCP	95 - 07/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
				Decreto di Impegno GURI	178 - 04/08/2011	Importo dell'Impegno	€ 2.170,62		
				Decreto di Impegno PUBLIKOMPASS	229 - 20/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 3.528,00		
				Decreto di Impegno MANZONI	247 - 28/09/2011	Importo dell'Impegno	€ 2.520,00		
				Decreto di Impegno GURI	299 - 27/10/2011	Importo dell'Impegno	€ 895,23		
				Decreto di Impegno MANZONI	362 - 05/12/2011	Importo dell'Impegno	€ 1.452,00		
				Decreto di Impegno Commissione gara	372 - 13/12/2011	Importo dell'Impegno	€ 4.375,37		
				Decreto di Impegno PUBBLICAZIONI	86 - 29/02/2012	Importo dell'Impegno	€ 7.175,50		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 2.698.058,93</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche

RUP	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 170 del 17/04/2012	Supporto al RUP		Incarico conferito tramite:			
Progettista	DRPC	Ing. A. Sorge, Arch. F. Benedetti	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot. n. 10523 del 19/10/2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. A. Sorge, Arch. F. Benedetti (DRPC)	Incarico conferito tramite: nota in entrata prot. n. 10523 del 19/10/2011		
Geologo	Geol. Giuseppe Basile (Serv. RIA)	Incarico conferito tramite:	nota in entrata prot. n. 10523 del 19/10/2011			Incarico conferito tramite:			
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico	Ing. Mariagrazia Mafodda	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.291 del 31.01.2012	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Mariagrazia Mafodda	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.291 del 31.01.2012		
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. Sri	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	A.T.I. MONDELLO COSTRUZIONI S.R.L (Capogruppo) - AN.CA.MA. S.R.L. (Mandante)	Decreto Affidamento Lavori	Decreto n. 295 del 26/10/2011	data contratto	15/11/2011
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	29/11/2011	data presunta di termine lavori	24/08/2012

STATO  
DELL'ARTE

*L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.*

*In data 19.10.2011 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.*

*A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 26/10/2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 15/11/2011.*

*I lavori sono stati avviati il 29/11/2011.*

*Con nota prot.n. 281/65 del 08.08.2012 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della Perizia di Variante e Suppletiva, per l'autorizzazione di competenza.*

***In data 08.08.2012 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.***

*Il Commissario, data l'ugenza delle attività previste nell'ambito della PVS ai lavori, ha convocato il 11.09.2012 un tavolo tecnico, in base agli esiti della quale, con nota prot. n. 3456 del 12/09/2012 sono state richieste integrazioni alla PVS presentata, successivamente acquisite al prot.n. 4017 del 12/10/2012.*

*In data 19/11/2012, con D.C. n. 624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili siti nel Comune.*

*Con Decreto Commissariale n. 24 del 15/01/2013 è stato rimodulato l'impegno, prendendo atto della PVS approvata dal RUP.*

*In data 01/03/2013, con nota prot.n. 1308, il RUP trasmette copia del Verbale di Ripresa Lavori*

SAL



AVVIATI LAVORI

ME115_2	Sant'Angelo di Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 interventi. Il Comitato del 18/05/2012 prende atto dei finanziamenti rimodulati a seguito della riunione del 03/04/2012	Importo Rimodulato	€ 2.930.000,00
Decreto di Finanziamento	n. 301 del 28/06/2012	Importo Finanziato	€ 2.930.000,00	Decreto di Impegno	n. 15 del 11/01/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.412.808,79		
				Decreto di Impegno GURI	N. 368 del 17.07.2012	Importo dell'Impegno	€ 1.964,56		
				Decreto di Impegno GURI (esito gara)	N. 554 del 24.10.2012	Importo dell'Impegno	€ 895,23		
				Decreto di Impegno e Pagamento Publikompass	n. 500 del 27/09/2012	Importo dell'Impegno	€ 5.000,33		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	577 - 06/11/2012	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 2.930.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 2.421.268,91</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche								
RUP	Geom. Vittorio Ricciardi (Comune)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 171 del 17/04/2012	Supporto al RUP	Arch. Francesco Giuseppe Fricano	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 278 del 15/04/2013	
Progettista	DRPC	Ing. A. Sorge, Ing. C. La Rocca, Ing. V. Nicolosi, Ing. E. Raciti	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 6051 del 06.07.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing.C.La Rocca (DRPC)	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 6051 del 06.07.2011
Geologo	Geol. Filippo Cappotto, Dott. Geol. Davide Siragusano (Figure Esterne)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.324 del 16.03.2011				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Sandro Orlando	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 638 del 21/11/2012	Assistente al DL			Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Sandro Orlando	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 638 del 21/11/2012					
Collaudatore Statico	Ing. Carlevaro Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 177 del 11/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Carlevaro Giuseppe	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 177 del 11/03/2013	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	ATI AVENI SRL - GUGLIOTTA TRIVELLAZIONI	Decreto Affidamento Lavori	532 - 15/10/2012	data contratto	
Contratto		data conclusione lavori			Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.</p> <p>La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 955 del 21/03/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto esecutivo I Stralcio. A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2</p> <p>A seguito delle Conferenza dei Servizi del 16/04/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti e a seguito di validazione del RUP il progetto è stato finanziato con Decreto n. 301 del 28.06.2012.</p> <p>Con Decreto n. 532 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il Contratto è stato stipulato in data 25/10/2012</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 è stato disposto l'impegno della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera.</p> <p>In data 29/01/2013, con nota prot.n. 561, il DL invita l'aggiudicataria dei lavori alla formale consegna parziale dei lavori che avrà luogo giorno 01/02/2013.</p> <p>In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1584, l'Ufficio del Commissario autorizza il DL a redigere Perizia di Variante Strutturale.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 31/10/2013, si è in attesa dell'approvazione della PVS da parte del RUP</p>					SAL	AVVIATI LAVORI
-----------------	--	--	--	--	--	-----	----------------

ME119	Sinagra	Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Faranò						Importo ApQ	€ 3.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 764 del 24/09/2013	Importo Finanziato	€ 2.972.159,55	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di definanziamento	n. 764 del 24/09/2013	Importo defanziato di cui al D.C. n. 437 del 03/09/2013	€ 15.997,61	Decreto di Impegno GURI avviso di gara	840 - 09/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.023,97		
Decreto di Finanziamento Indagini	437 - 03/09/2012	Importo Finanziato	€ 43.838,06	Decreto di Impegno e Pagamento somme per plottaggio	914 - 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 287,50		
				Decreto di Impegno Plottaggio	914 - 30/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 287,50		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 3.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 2.311,47</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	INVITALIA	CGIAM
-------------	-----------	-------

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Cappotto (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.27 del 23.02.2011	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicolichchia	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.27 del 23.02.2011
Progettista	INVITALIA Ing. Marco Calogero, Ing. Fabio Ferla, Ing. Giuseppe Morganti, Ing. Alberto Peligra	Incarico conferito tramite:	nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO PLANTS Sr	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	26/09/2012	data conclusione lavori			Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011  
In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM , con note acquisite ai prott. n. 753 del  
07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.  
Con nota acquisita al prot. n. 1900 del 29/05/2012, la CGIAM ha trasmesso le specifiche  
tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, vistato dal RUP in data  
10/07/2012.*

*Con D.C. n. 437 del 03/09/2012 sono state finanziate e approvate le specifiche tecniche afferenti  
il piano di indagini preliminari .*

*A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 486 del 24/09/2012 il Commissario ha disposto  
l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluse.*

*In data 04/03/2013, con nota prot.n. 1326, la CGIAM trasmette relazione geologica provvisoria  
ed i relativi elaborati.*

*A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2013 risultano acquisiti tutti i  
pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo.*

*Con Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013 è stato finanziato l'intervento.*

SAL



PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA

ME115_3	Sant'Angelo di Brolo	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano						Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	note:	Nel Comitato del 24/02/2012 l'intervento originario di € 8.000.000,00 viene stralciato in 3 interventi.  Il Comitato del 18/05/2012 prende atto dei finanziamenti rimodulati a seguito della riunione del 03/04/2012	Importo Rimodulato	€ 2.070.000,00
Decreto di Finanziamento	456 - 18/06/2013	Importo Finanziato	€ 2.069.505,23	Decreto di Impegno	843 - 10/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.580.612,53		
Decreto di Finanziamento Plottaggio Tavole Grafiche	433 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 494,77	Decreto di Impegno Plottaggio Tavole Grafiche	433 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 494,77		
				Decreto di Impegno e pagamento commissione di gara	Decreto n. 647 del 05/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.721,94		
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 693 del 05/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 980,49		
				Decreto di Impegno e Pagamento spese di pubblicazione	788 - 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 617,10		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	€ 2.070.000,00			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	€ 1.584.426,83	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI INVITALIA CGIAM

Figure Tecniche

RUP	Geom. Tindaro Pino Scaffidi (Comune)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 172 del 17/04/2012	Supporto al RUP	Dott. Geol. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 362 del 17/05/2013
Progettista	INVITALIA Arch. Pulizzi, Ing. Imbroglia, Ing. Grassi, Ing. Calogero	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.425 del 10.02.2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Gianluca Coroneo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 714 del 10/09/2013	Direttore Operativo	Ing. Rossella Zumbè	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 714 del 10/09/2013
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Giuseppe Morganti	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 714 del 10/09/2013				
Collaudatore Statico	Ing. Fortunato Lo Presti	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6039 del 08.10.2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Fortunato Lo Presti	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6039 del 08.10.2013

INDAGINI preliminari affidate a:	ME.TE.RO	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	DIVA srl	Decreto Affidamento Lavori	679 - 28/08/2013	data contratto	24-set
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività		data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle derminazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi.*

*Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia.*

*In data 21.03.2012 il DRPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche effettuate propedeutiche alla progettazione.*

*In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.*

*A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115\_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115\_2  
Con nota prot. 2394 del 28/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha chiesto al DRPC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi non pervenute.*

*A seguito di riscontro negativo alle integrazioni richieste, il Commissario, con nota prot.3332 del 06/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Cappotto a fornire supporto al gruppo di progettazione per la stesura del progetto esecutivo.*

*Il Dott. Geol. Filippo Cappotto, con nota prot.n. 4808 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del Commissario le integrazioni geologiche richiestegli.*

*In data 02/05/2013, con nota prot.n. 2514, Invitalia trasmette copia del Progetto esecutivo.*

*A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, sono stati acquisiti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.*

*Con Decreto n. 456 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con D. C. n. 505 del 02/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito alla procedura negoziata.*

*Con D.C. n. 679 del 28/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Diva srl.*

*In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.*

SAL

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI  
LAVORI






ME120	Sinagra	Opere di regimentazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini						Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-		Importo dell'Impegno	-	
Decreto di Finanziamento Attività di RUP	326 - 08/05/2013	Importo Finanziato	€ 364,03	Decreto di Impegno Attività di RUP	326 - 08/05/2013		Importo dell'Impegno	€ 364,03	
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 364,03</b>				<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 364,03</b>	Economie da finanziamento
									Eventuali Economie da ribasso

<b>CONVENZIONI</b>	CGIAM
--------------------	-------

**Figure Tecniche**

RUP	Dott. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale 28 del 23-02-2011	Supporto al RUP	Geom. Ferrante	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale 28 del 23-02-2011
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:	nota prot. N. 156 del 26/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori	data contratto
Contratto	data conclusione lavori		Verbale inizio attività	-

STATO DELL'ARTE	In data 26.02.2011 la progettazione è stata affidata al Comune. Con nota prot. 975 del 28/06/2011 è stato sollecitato il Comune alla trasmissione del progetto esecutivo. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.	SAL	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO
-----------------	---	-----	----------------------------------



<b>ME121</b>	<b>Sinagra</b>	<b>Drenaggi e gabbioni - C.da Mulinazzo</b>						Importo ApQ	<b>€ 2.500.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>A</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
							Economie da finanziamento		
							Eventuali Economie da ribasso		

<b>CONVENZIONI</b>	
--------------------	--

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Giuseppe La Placa	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 26 del 23.2.2011	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicolichia	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n.26 del 23.02.2011
Progettista	Comune	Incarico conferito tramite:	nota prot. N.156 del 26/02/2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	SGM srl	Decreto di affidamento INDAGINI	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto		data conclusione lavori		Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO DELL'ARTE	<p>In data 26.02.2011 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune.                  Il comune, con nota prot. 1216 del 25/07/2011, ha richiesto autorizzazione per conferimento incarico di revisione dello studio geologico.                  L'Ufficio del Commissario ha richiesto al Comune con nota prot.n. 594 del 22.02.2012, apposita relazione attestante gli adempimenti posti in essere al fine di realizzare i lavori il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2946 del 31/07/2012, ha trasmesso al RUP copia delle specifiche tecniche relative alle indagini geognostiche per la convalida di competenza.                  Le indagini sono state affidate dallo stesso Comune in data 04/10/2012.                  In data 14/06/2013, con nota prot.n. 3574, il Comune trasmette n. 5 copie del Progetto Esecutivo. A seguito della cdS tenutasi in data 08/07/2013 sono concessi 7 gg ai progettisti per adeguare il progetto a quanto richiesto dall'ARTA (Serv. 3) e dalla Soprintendenza BB.CC.AA.</p>	SAL	ADEGUAMENTO DEL PROGETTO IN CORSO
-----------------	--	-----	-----------------------------------

ME124	Terme Vigliatore	Ripascimento scogliere – Zona Terme Marchesana						Importo ApQ	€ 3.823.875,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	L'INTERVENTO TRANSITA DALLA LETTERA A ALLA B	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento attività specialistiche	Decreto n. 690 del 11/12/2012	Importo Finanziato	€ 116.233,51					Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno Campionamento ed Analisi	Decreto n. 731 del 20/12/2012	Importo Finanziato	€ 23.760,00	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno Rilievi	Decreto n. 233 del 27/03/2013	Importo Finanziato	€ 12.584,00	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno Studio Geologico	Decreto n. 304 del 19/04/2013	Importo Finanziato	€ 26.693,51	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno DHI Italia	Decreto n. 746 del 17/09/2013	Importo Finanziato	€ 13.189,00	Economie da finanziamento	
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Messina	Decreto n. 779 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 9.075,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Catania	Decreto n. 777 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 22.800,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	€ 116.233,51			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	€ 108.101,51		
								Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	Prov.to Int.le OO.PP.
--------------------	-----------------------

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 489 del 03/11/2010	REO (CARONTE)	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	
Progettista	Prov. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 489 del 03/11/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Pacos Srl	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	16/11/2012	data presunta di termine lavori	14/07/2013

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2011  
Con nota acquisita al prot.n.3021 del 30/12/2011 il Provv Interregionale OO.PP. ha trasmesso  
il progetto primo stralcio esecutivo e successivamente, in data 08.03.2012, ha trasmesso il  
progetto primo stralcio esecutivo rielaborato secondo quanto richiesto dall'ARTA Serv.1 in sede di  
Conferenza Servizi del 09.02.2012.*

*Il Commissario con nota prot. 962 del 22/03/2012, ha trasmesso il progetto all'ARTA serv. 3 al fine  
dell'emissione del Decreto di finanziamento. In*

*data 11-09-2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con cui è stato  
modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento del progetto  
esecutivo.*

*Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. di finanziamento al  
Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria invitandolo ad attivare, in tempi brevi l'iter  
di affidamento dei lavori .*

*In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4275, il RUP comunica l'aggiudicazione dei lavori a  
favore della Pacos srl (ribasso del 10,21%).*

*I lavori sono stati consegnati il giorno 16/11/2012 ed avranno una durata di circa di 240 giorni.  
Con Decreto n. 852 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Pacos srl.*

SAL

AVVIATI LAVORI




ME125	Tortorici	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche – Zona Lembo-Pellizza						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	n. 592 del 08/11/2012	Importo Finanziato	€ 1.452.238,14	Decreto di Impegno	784 - 27/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.019.259,96		
Decreto finanziamento progettazione DL e sicurezza	121 del 07/07/2011	Importo Finanziato	€ 124.161,88	Decreto di Impegno PROGETTAZIONE - DL	182 - 09/08/2011	Importo dell'Impegno			
Decreto finanziamento indagini preliminari	220 del 09/09/2011	Importo Finanziato	€ 47.761,86	Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
Decreto di revoca decreto n. 121 del 07/07/2012 finanziamento progettazione DL e sicurezza	n. 592 del 08/11/2012	Importo Revocato	€ 124.161,88	Decreto di Impegno e pagamento INDAGINI	110 - 16/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 31.730,78		
				Decreto di impegno e pagamento commissione gara progettazione	338 - 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 136,35		
				Decreto di impegno e pagamento pubblicazione GURI	296 - 18/04/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.021,04		
				Decreto di impegno e pagamento Commissione gara	393 - 03/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.118,87		
				Decreto di impegno e pagamento Progettazione	473 - 20/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 43.959,61		
				Decreto di impegno e pagamento Avviso pubblicazione esito di gara	494 - 28/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.089,00		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 600,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.624.161,88</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 1.098.945,61</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Giampiero Di Magro (limitatamente all'assegnazione dell'incarico Progettazione)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 120 del 7 luglio 2011	RUP (Lavori)	Geom. Calanni R. Carmelo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 143 del 02.04.2012	nota del serv.3° Tecnico Lavori Pubblici prot.n. 10552 del 28.07.2010
				Supporto al RUP	Ing. Giampiero Di Magro		Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 143 del 02.04.2012
Progettista	Ing. Mario Saitta (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Mario Saitta (Figura Esterna)		Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011
Geologo	Geol. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 2271 del 26.10.2011				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori	Ing. Mario Saitta (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011	Assistente al DL			Incarico conferito tramite:	
Resp Sicurezza fase Esecuzione	Arch. Diego Mammo Zagarella	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 290 del 18.04.2013					
Collaudatore Statico	Ing. Salvatore Bartolotta	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 909 del 30.10.2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Salvatore Bartolotta		Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 909 del 30.10.2013

INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID s.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 250 del 3 ottobre 2011	AFFIDATARIA	Decreto Affidamento Lavori	n. 271 del 11/04/2013	data contratto	
----------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------------------	-----------------------	----------------	--

Contratto	04/10/2011	<i>data conclusione lavori</i>	15/11/2011	Esecuzioni Lavori	ITAL PROGET S.R.L.	<i>Verbale inizio attività</i>	-	<i>data presunta di termine lavori</i>	
-----------	------------	--------------------------------	------------	-------------------	--------------------	--------------------------------	---	--	--

STATO DELL'ARTE	<p><i>A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011 ad un professionista esterno.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 250 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.</i></p> <p><i>Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.</i></p> <p><i>Con nota acquisita al prot. n.943 del 21/03/2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo.</i></p> <p><i>In sede di Conferenza di Servizi del 29/05/2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con prescrizioni ed il progetto rielaborato in ottemperanza alle stesse è stato acquisito al prot. n. 2351 in data 27/06/2012.</i></p> <p><i>A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 592 del 08/11/2012.</i></p> <p><i>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Società ITAL PROGET S.R.L. (ribasso pari al 30,1982%).</i></p> <p><i>In data 31/05/2013 si provvederà alla formale consegna dei lavori.</i></p> <p><i>Con Decreto n. 784 del 27/09/2013 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</i></p>	SAL	<p>AVVIATI LAVORI</p> 
-----------------	---	-----	---

ME126	Tortorici	Muri su pali e raccolta acque – Zona S. Antonio-Sciortino						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	573 - 06/11/2012	Importo Finanziato	€ 473.375,06	Decreto di Impegno	769 - 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 363.140,93		
Decreto finanziamento progettazione DL e sicurezza	decreto n. 119 del 07/07/2011	Importo Finanziato	€ 73.473,07	Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
Decreto finanziamento indagini preliminari	decreto n. 307 del 04/11/2011	Importo Finanziato	€ 26.624,94	Decreto di Impegno e pagamento INDAGINI	273 - 11/06/2012	Importo dell'Impegno	€ 14.738,78		
				Decreto di impegno e pagamento commissione gara progettazione	337 - 11/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 90,90		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	518 del 08/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 861,74		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 573.473,07</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 379.087,35</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

Figure Tecniche									
RUP (Progettazione)	Ing. Giampiero Di Magro (limitatamente all'assegnazione dell'incarico Progettazione)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 118 del 7 luglio 2011	RUP (Lavori)	Geom. Calanni R. Carmelo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 144 del 02.04.2012	nota del serv.3° Tecnico Lavori Pubblici prot.n. 10546 del 28.07.2010	
				Supporto al RUP	Ing. Giampiero Di Magro		Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 144 del 02.04.2012	
Progettista	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)		Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011	
Geologo	Dott. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.2741 del 02.12.2011				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011	Assistente al DL			Incarico conferito tramite:		
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1561 del 25.08.2011						
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo			Incarico conferito tramite:		
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL	Decreto di affidamento INDAGINI	decreto n. 334 del 24 novembre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Matina Geom. Giovanni	Decreto Affidamento Lavori	D.C. n. 242 del 02/04/2013	data contratto	
Contratto	30/11/2011	data conclusione lavori	26/12/2011			Verbale inizio attività	06-giu	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a professionista esterno.*

*Con Decreto n. 334 del 24.11.2011, è stata affidata la realizzazione del piano di indagini preliminari ad oggi completato.*

*Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.*

*Con nota acquisita al prot.n. 1303 del 18.04.2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo.*

*In sede di Conferenza di Servizi del 11.07.2012 il RUP si è impegnato a portare a termine il procedimento finalizzato alle procedure espropriative.*

*Con nota acquisita al prot. n. 2672 del 12/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha richiesto documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza.*

*In data 19/09/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo.*

*Con Decreto n. 573 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.*

*Con Decreto Commissariale n. 242 del 02/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Matina Geom. Giovanni*

*In data 06/06/2013 è avvenuta la formale consegna dei lavori.*

*Con Decreto n. 769 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.*

SAL

AVVIATI LAVORI





<b>ME127</b>	<b>Tortorici</b>	<b>Muri e paratie monte valle e opere idrauliche – Zona S.Paolo</b>					Importo ApQ	<b>€ 2.300.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	<b>COMITATO 24 FEB 2011</b>	note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell’Impegno	-	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Geom. Calanni Carmelo (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 489 del 27/06/2013	Supporto al RUP	Incarico conferito tramite:	
Progettista	-	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Geol. Filippo Cappotto	Incarico conferito tramite:			Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL	Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:				
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo	Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	GEO PLANTS S.r.l	Decreto di affidamento INDAGINI	n. 563 del 15/07/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
contratto		data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

<b>STATO DELL'ARTE</b>	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 09/07/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario di averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2565 del 09/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 2761 del 17.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura Commissariale tutta la documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.</p> <p>Con nota prot.n. 3197 del 23.08.2012 il RUP ha chiesto al Commissario la disponibilità di figure professionali a cui affidare la redazione dello studio geologico e quant'altro di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva. Il Commissario, con nota prot. n.3293 del 03/09/2012, ha comunicato al RUP il nulla osta all'immediato avvio delle procedure per il conferimento del nuovo incarico.</p> <p>In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5106, il RUP ha trasmesso al Commissario richiesta di integrazioni al piano di indagini originario ricevuta dalla RTI Dinamica srl - Studio Colonna srl.</p> <p>In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1577, il RUP trasmette alla Struttura Commissariale il preventivo del programma delle indagini geognostiche integrative.</p> <p>Con Decreto n. 491 del 27/06/2013 sono state approvate le specifiche tecniche del piano di indagini preliminari</p> <p>Con Decreto n. 563 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini integrative a favore della GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale pari al 47,2125%.</p> <p>In data 06/08/2013 viene sottoscritto il Verbale di Consegna delle Aree alla Geo Plants srl, ed in data 04/09/2013 sono state ultimate le attività della stessa.</p>	SAL	PROGETTAZIONE IN CORSO
------------------------	--	-----	------------------------





ME128	Tortorici	Muri e barriere paramassi – Zona Batana-Pagliara-S.Leone						Importo ApQ	€ 500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato			note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	574 - 06/11/2012	Importo Finanziato	€ 476.038,45	Decreto di Impegno	n. 547 del 12/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 344.390,16		
Decreto finanziamento progettazione DL e sicurezza	decreto n. 122 del 07/07/2011	Importo Finanziato	€ 72.795,49	Decreto di Impegno PROGETTAZIONE - DL	181 - 09/08/2011	Importo dell'Impegno			
Decreto finanziamento indagini preliminari	decreto n. 219 del 09/09/2011	Importo Finanziato	€ 23.961,55	Decreto di Impegno AVCP	312 - 09/11/2011	Importo dell'Impegno	€ 30,00		
				Decreto di Impegno e pagamento INDAGINI	111 del 16/03/2012	Importo dell'Impegno	€ 16.766,30		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	318 del 06/07/2012	Importo dell'Impegno	€ 90,90		
				Decreto di Impegno AVCP	202 - 19/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 225,00		
				Decreto di Impegno pagamento Commissione gara	467 del 20/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 333,06		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 572.795,49</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 361.835,42</b>		
								Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Ing. Giampiero Di Magro (limitatamente all'assegnazione dell'incarico Progettazione)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 117 del 7 luglio 2011	RUP (Lavori)	Geom. Buttafarro Carmelo (UTC)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012	nota del serv.3° Tecnico Lavori Pubblici prot.n. 10547 del 28.07.2010	
				Supporto al RUP	Ing. Giampiero Di Magro		Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012	
Progettista	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Coord Sicurezza fase Progett.	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011		
Geologo	Dott. Giuseppe Lombardo	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n.2271 del 26.10.2011			Incarico conferito tramite:			
Direttore Lavori	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 181 del 09 Agosto 2011						
Collaudatore Statico	Ing. Ignazio Cusmano (Figura Esterna)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 1810 del 25/03/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:	GEOMERID s.r.l.	Decreto di affidamento INDAGINI	Decreto n. 251 del 3 ottobre 2011	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	AVENI SRL	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	10/01/2013
Contratto	04/10/2011	data conclusione lavori	08/11/2011			Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

STATO  
DELL'ARTE

*A seguito di procedure di gara la progettazione è stata affidata con Decreto Commissariale n. 181 del 09.08.2011 a professionista esterno.*

*Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività. In data 10.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.*

*Con nota acquisita al prot. n.2048 del 07/06/2012 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo.*

*A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2758 del 17/07/2012 ha trasmesso il verbale di verbale di verifica e validazione e l'attestazione del Direttore dei lavori in merito alla immediata eseguibilità degli stessi.*

*Con Decreto n. 574 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con Decreto n. 645 del 27/11/2012 è stato approvato lo schema lettera d'invito alla Procedura di gara.*

*Con nota prot.n. 5465 del 20/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Aveni srl.*

*In data 10/01/2013 è avvenuta la stipula del contratto.*

*Con Decreto Commissariale n. 547 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 344.390,16.*

*Con Decreto n. 926 del 31/10/2013 è decretata la presa atto l Perizia di Variante, rimodulazione quadro economico ed impegno somme.*

SAL

AVVIATI LAVORI



ME130	Castel di Tusa	Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni – Zona Castel di Tusa (viale Europa Unità)						Importo ApQ	€ 1.500.000,00
Lettera ATTUALE	B*	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	COMITATO 24 FEB 2011	note:	transitato dalla Lettera A alla Lettera B nel corso del Comitato di Coordinamento e Controllo del 24 febbraio	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento		Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-		
Decreto di Finanziamento	Decreto n. 11 del 27 gennaio 2011	Importo Finanziato	€ 280.137,46	Decreto di Impegno	Decreto n. 11 del 27 gennaio 2011	Importo dell'Impegno	€ 280.137,46	LAVORI DI SOMMA URGENZA	
Decreto di Finanziamento attività specialistiche	Decreto n. 689 del 11/12/2012	Importo Finanziato	€ 104.160,82	Decreto di Impegno Campionamento ed Analisi	Decreto n. 235 del 28/03/2013	Importo Finanziato	€ 17.820,00		
				Decreto di Impegno e pagamento DHI Italia	Decreto n. 749 del 17/09/2013	Importo Finanziato	€ 27.830,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Messina	Decreto n. 776 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 9.075,00		
				Decreto di Impegno e pagamento Università di Catania	Decreto n. 778 del 26/09/2013	Importo Finanziato	€ 21.600,00		
Decreto di Finanziamento Integrativo ed Impegno per la Relazione Geologica	Decreto n. 424 del 07/06/2013	Importo Finanziato	€ 3.117,38	Decreto di Finanziamento Integrativo ed Impegno per la Relazione Geologica	Decreto n. 424 del 07/06/2013	Importo Finanziato	€ 20.953,20	Economie da finanziamento	
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 387.415,66</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 377.415,66</b>	Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	Provv.to Int.le OO.PP.
--------------------	------------------------

Figure Tecniche							
RUP	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 491 del 03/11/2010	REO (CARONTE)	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Incarico conferito tramite:	
Progettista	Provv. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Incarico conferito tramite:	Nota in uscita prot.n. 491 del 03/11/2010	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:	
Geologo		Incarico conferito tramite:				Incarico conferito tramite:	
Direttore Lavori		Incarico conferito tramite:		Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:					
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI preliminari affidate a:	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	Costruzioni Bruno Teodoro spa	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
Contratto	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	16-nov	data presunta di termine lavori	14/07/2013

STATO  
DELL'ARTE

La progettazione è stata affidata al Provv. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2010.  
In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria ha trasmesso il progetto I Stralcio esecutivo.

In sede di Conferenza del 29/02/2012 sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni ed il Provv. Interr. OO.PP., con nota acquisita al prot.n. 1000 del 23.03.2012, ha trasmesso il progetto rielaborato inoltrato dal Commissario all'ARTA, con nota prot.n. 1023 del 27.03.2012, ai fini dell'emissione del Decreto di Finanziamento.

In data 11/09/2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo.

Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmette i D.D.G. al Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria invitandolo ad attivare, in tempi brevi, i l'iter di affidamento dei lavori .

In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4276, il RUP ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori.

I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2012 ed avranno una durata di circa 240 giorni.

Con DDG n. 577 viene finanziata la Perizia di Variante dell'intervento.

Con Decreto n. 847 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Costruzioni Bruno Teodoro spa.

SAL

AVVIATI LAVORI






<b>ME131</b>	<b>Ucria</b>	<b>Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile - Belvedere</b>					Importo ApQ	€ <b>1.261.000,00</b>
Lettera ATTUALE	<b>B*</b>	Lettera Originaria APQ	B	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	-	Importo Finanziato		Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
							Economie da finanziamento	
							Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>							
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

**Figure Tecniche**

<b>RUP</b>	Geom. Gianfranco Vinciullo	Decreto di incarico		<b>Supporto al RUP</b>		Decreto di Incarico	
<b>Progettista</b>	Ing. Cosentini Matteo	Nota di Incarico	Delibera di G.M. n. 329 del 15/10/1985	<b>Coord Sicurezza fase Progett.</b>		Nota di Incarico	
<b>Geologo</b>		Incarico conferito tramite:					
<b>Direttore Lavori</b>		Nota di Incarico		<b>Assistente al DL</b>		Nota di Incarico	
<b>Coord Sicurezza fase Esecuzione</b>		Nota di Incarico					
<b>Collaudatore Statico</b>		Decreto di Incarico		<b>Collaudatore Tecnico amministrativo</b>		Nota di Incarico	

<b>INDAGINI preliminari affidate a:</b>	Decreto di affidamento INDAGINI		<b>AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori</b>	Decreto Affidamento Lavori		data contratto	
<b>contratto</b>	data conclusione lavori			verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	

<p><b>STATO DELL'ARTE</b></p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2847 del 23/06/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato al Commissariodi averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Con nota prot. n. 2904 del 27/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota prot. n. 3039 del 03/08/2012 il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto esecutivo, datato 05/07/2010, e di tutti atti amministrativi richiesti. In data 23/04/2013, con nota prot.n. 2370, l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA copia del progetto, affinché lo stesso possa procedere all'emissione del parere di propria competenza.</p> <p>Con nota prot.n. 4879 del 08/08/2013 l'ARTA comunica che il progetto ricevuto non ha i requisiti di G.P.1.</p>	<p>SAL</p>	<p>PROGETTAZIONE IN CORSO</p> 
--	------------	---

ME132	Ucria	Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – Zona via Annunziata					Importo ApQ	€ 2.500.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato		note:	Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	458 - 18/06/2013	Importo Finanziato	€ 959.845,87	Decreto di Impegno	-	Importo dell'Impegno	-	
				Decreto di Impegno e pagamento componente commis. Gara	Decreto n. 640 del 05/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.276,56	
				Decreto di Impegno e pagamento Indagini	Decreto n. 651 del 06/08/2013	Importo dell'Impegno	€ 31.809,03	
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	Decreto n. 694 del 05/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.001,45	
				Decreto di Impegno e pagamento Commissione di Gara	Decreto n. 811 del 08/10/2013	Importo dell'Impegno	€ 2.320,59	
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione esito di Gara	Decreto n. 933 del 05/11/2013	Importo dell'Impegno	€ 617,10	
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 959.845,87</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 37.024,73</b>	
							Economie da finanziamento	
							Eventuali Economie da ribasso	

<b>CONVENZIONI</b>	INVITALIA	CGIAM
--------------------	-----------	-------

Figure Tecniche									
RUP	Ing. Sidoti Pinto Benedetto	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 563 del 26/10/2012	Supporto al RUP	Geom. Domenico Rigoli	Incarico conferito tramite:	Decreto Commissariale n. 563 del 26/10/2012		
Progettista	INVITALIA	Ing. Giuseppe Morganti, Ing. Marco Calogero, Ing. Gianluca Coroneo	Incarico conferito tramite:	Nota in entrata prot.n. 652 del 09.05.2011	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:		
Geologo	Dott. Geol. Alessio D'Urso	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM				Incarico conferito tramite:		
Direttore Lavori	Ing. Antonino Sciotteri	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 683 del 28/08/2013	Direttore Operativo	Geom. Roberto Coppola	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 683 del 28/08/2013		
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:		Ispettore di Cantiere e RSE	Geom. Michele Quarto	Incarico conferito tramite:	D. C. n. 683 del 28/08/2013		
Collaudatore Statico	Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 915 del 30/10/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo	Ing. Adriano Grassi	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 915 del 30/10/2013		
INDAGINI preliminari affidate a:	S.G.M.srl	Decreto di affidamento INDAGINI	D.C. n. 129 del 26/03/2012	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori <b>Geo Drilling Srl</b>	Decreto Affidamento Lavori	n. 676 del 27/08/2013	data contratto		
Contratto	04/04/2012	data conclusione lavori			Verbale inizio attività	30-ott	data presunta di termine lavori	28-apr	

STATO  
DELL'ARTE

*La progettazione è stata affidata a INVITALIA in data 09.05.2011.*

*In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari.*

*Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari ed il contratto è stato firmato in data 04/04/2012 .*

*In data 23/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CGIAM ha trasmesso la Relazione Geologica dell'intervento.*

*Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.*

*A seguito della CdS del 08/03/2013, e del parere espresso dal GC di Me, con nota prot.n. 1790 del 25/03/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.*

*In data 06/06/2013 i Progettisti, con nota prot.n. 3457. trasmettono il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo rimodulato.*

*Con Decreto n. 458 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.*

*Con Decreto n. 676 del 27/08/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Geo Drilling Srl (ribasso del 32,9999%).*

SAL

AVVIATI LAVORI



ME177	Brolo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati C.da Iannello Alto						Importo ApQ	€ 600.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:		Importo Rimodulato	
Decreto di Finanziamento	502 - 02/07/2013	Importo Finanziato	€ 599.808,08	Decreto di Impegno	766 - 25/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 432.876,41		
Decreto di Finanziamento Plottaggio Tavole Grafiche	434 - 13/06/2013	Importo Finanziato	€ 191,12	Decreto di Impegno Plottaggio Tavole Grafiche	434 - 13/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 191,12		
				Decreto di Impegno e pagam. Inagin. Prelimin.	D.C. n. 537 del 10/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 13.096,79		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 599.999,20</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 446.164,32</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

CONVENZIONI	CGIAM	INVITALIA
-------------	-------	-----------

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Mario Messina (UTC)	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 357 del 17.07.2012	Supporto al RUP	Dott. Francesco Barranco	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 357 del 17.07.2012		
Progettista	INVITALIA Ing. Morganti Ing. Imbroglia Ing. Coroneo	Incarico conferito tramite:	Nota prot. n. 1336/UC del 19/04/2012	Coord Sicurezza fase Progett.		Incarico conferito tramite:			
Geologo	Dott. Geol. Giacomo Anselmo	Incarico conferito tramite:	CONVENZIONE CGIAM			Incarico conferito tramite:			
Direttore Lavori	Ing. Basilio Ridolfo	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 685 del 30/08/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:			
Coord Sicurezza fase Esecuzione		Incarico conferito tramite:							
Collaudatore Statico	Ing. Basilio Ceraolo	Incarico conferito tramite:	nota in uscita prot.n. 5123 del 30/08/2013	Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:			
INDAGINI preliminari affidate a:	Geo Plants srl	Decreto di affidamento INDAGINI		AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	AEMME Srl	Decreto Affidamento Lavori	620 - 30/07/2013	data contratto	10/09/2013
Contratto	04/03/2013	data conclusione lavori				Verbale inizio attività	-	data presunta di termine lavori	





*L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo.*

*In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota assunta al prot. n. 498 del 16/02/2012, ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati.*

*Con nota prot. n. 1336 del 19/04/2012 il Commissario ha affidato la progettazione a INVITALIA. In data 31/01/2013, con nota prot.n. 659, CGIAM trasmette le specifiche tecniche ed i relativi elaborati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione delle indagini.*

*Con D. C. n. 140 del 27/02/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano d'indagini, che hanno avuto luogo da giorno 12/03/2013, e sono state portate a termine il 29/03/2013.*

*In data 23/05/2013, con nota prot.n. 3066, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo.*

*A seguito della CdS tenutasi giorno 06/06/2013 e dei pareri acquisiti, con nota prot.n. 3586 del 17/06/2013 il RUP trasmette Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo.*

*Con Decreto n. 502 del 02/07/2013 è stato finanziato l'intervento, e con D.C. n. 522 del 09/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito.*

*Con Decreto n. 620 del 30/07/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla AEMME S.r.l., risultata aggiudicataria a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 31,7373%. In data 10/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.*

*Con Decreto n. 766 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.*

STATO  
DELL'ARTE

SAL

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
DEI LAVORI



ME178	Capri Leone	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)						Importo ApQ	€ 1.000.000,00
Lettera ATTUALE	A	Lettera Originaria (APQ)	A	Eventuali variazioni determinate dal Comitato	AdP Integrativo	note:	Importo Rimodulato		
Decreto di Finanziamento	n. 79 del 06/02/2013	Importo Finanziato	€ 1.000.000,00	Decreto di Rimodulazione Impegno	723 - 11/09/2013	Importo dell'Impegno	€ 672.617,55		
				Decreto di Impegno Progettazione	204 - 20/03/2013	Importo dell'Impegno	€ 116.735,60		
				Decreto di Impegno e pagamento pubblicazione GURI	321 - 07/05/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.104,91		
				Decreto di Impegno Pubblicazione Avviso di Gara	403 - 05/06/2013	Importo dell'Impegno	€ 1.539,12		
				Decreto di Impegno pagamento AVCP	572 del 17/07/2013	Importo dell'Impegno	€ 375,00		
		<b>TOTALE Finanziamenti</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>			<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>€ 792.372,18</b>	Economie da finanziamento	
								Eventuali Economie da ribasso	

**Figure Tecniche**

RUP	Arch. Gianpiero Di Magro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 376 del 19.07.2012	Supporto al RUP	Geom. Piero Nicolicchia	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 376 del 19.07.2012
Progettista	pH3 Engineering s.r.l	Incarico conferito tramite:		Coord Sicurezza fase Progett.	pH3 Engineering s.r.l	Incarico conferito tramite:	
Geologo	Geol. Salvatore Armeli	Incarico conferito tramite:	Determina Sindacale n° 13 del 02/02/2012	Assistenza Geologica alla DL	Dott. Geol. Salvatore Armeli	Incarico conferito tramite:	nota prot.n. 6210 del 16/10/2013
Direttore Lavori	Ing. Salvatore Zaccaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 373 del 21/05/2013	Assistente al DL		Incarico conferito tramite:	
Coord Sicurezza fase Esecuzione	Ing. Salvatore Zaccaro	Incarico conferito tramite:	D.C. n. 373 del 21/05/2013				
Collaudatore Statico		Incarico conferito tramite:		Collaudatore Tecnico amministrativo		Incarico conferito tramite:	

INDAGINI affidate a:	Biosurvey	Decreto di affidamento INDAGINI	487 - 27/06/2013	AFFIDATARIA Esecuzioni Lavori	C.T.F. srl	Decreto Affidamento Lavori	D. C. n. 272 del 11/04/2013	data contratto	
Contratto		data conclusione lavori				Verbale inizio attività	28/06/2013	data presunta di termine lavori	25/11/2013

STATO  
DELL'ARTE

*Il progetto è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune. Il Comune con nota prot. n. 1273 del 13/04/2012 ha trasmesso la documentazione relativa al conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.*

*Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 il progettista incaricato ha trasmesso progetto esecutivo dell'intervento.*

*A seguito della CdS tenutasi giorno 30/10/2012 e dei pareri conseguentemente acquisiti, si è in attesa dell'adeguamento del progetto a quanto richiesto dall'ARTA Serv. 3 in data 14/12/2012, con nota prot.n. 5356.*

*A seguito del Tavolo Tecnico tenutosi in data 09/01/2012 e del parere espresso dall'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 321 del 17/01/2013, si intendono acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento.*

*Con Decreto Commissariale n. 79 del 06/02/2013 è stato finanziato l'intervento.*

*Con nota prot.n. 1912 del 29/03/2013, il Commissario invia ai vari Enti richiesta di autorizzazione all'occupazione temporanea del tratto di costa oggetto dell'intervento.*

*A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D. C. n. 272 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori a favore della Società C.T.F. S.R.L. (ribasso percentuale del 29,8728%).*

*Il RUP e l'aggiudicataria dei lavori giorno 06/05/2013 sottoscrivono l'art. 106 c. 3 Regolamento DPR 207/2010.*

*In data 28/06/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.*

*Con Decreto n. 617 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.*

SAL

AVVIATI LAVORI





**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
176	AG	002	Caltabellotta	Interventi di consolidamento del centro abitato "Consolidamento a Monte e a Valle della Via Colonello Vita-2°stralcio funzionale esecutivo"	€ 600.000,00	Emesso nuovo Decreto di Finanziamento nell'agosto del 2011, il Primo Decreto è stato annullato a seguito di un rilievo della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per l'approvazione tecnica. I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. - San Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985%. In data 02/05/2012 è avvenuta la consegna dei lavori	Avviati Lavori	Anzalone Luigi & Co.	
	AG	003	Cammarata	Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia	€ 1.050.000,00	La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 20/1/2011 affidate indagini geognostiche. Nel corso del comitato del 24 febbraio l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B. I lavori sono stati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 26,5087%.	Affidamento Lavori	Panepinto Costruzioni s.r.l.	
965	AG	004	Cattolica Eraclea	Opere di consolidamento - Zona Eraclea Minoa	€ 1.480.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	AG	005	Cianciana	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante ovest del centro abitato	€ 855.618,05	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 1/4/2011 per un importo di euro 855.618,05. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 06/09/2011 con un ribasso del 23,2603% alla Torsten Costruzioni. Contratto sottoscritto il 30/03/2012. LAVORI avviati in data 31/05/2012 In data 29/10/2012 sono stati ultimati i lavori	LAVORI ULTIMATI	Torsten Costruzioni	31/05/2012
176	AG	008	Montallegro	Consolidamento della parete Est del Monte Lupo sovrastante il centro abitato	€ 1.435.536,03	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 236 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.435.536,03. A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla BCS COSTRUZIONI S.R.L. C/da Cicè Mistretta. Il Contratto è stato stipulato in data 06/06/2012 e i lavori avviati in data 19/06/2012.	Avviati Lavori	BCS COSTRUZIONI S.R.L.	19/06/2012
176	AG	009	Ravanusa	Consolidamento zona Est Centro abitato 1° stralcio	€ 996.908,73	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/2/2011 per un importo di euro 996.908,73. Lavori aggiudicati con un Ribasso pari a al 22,597%. Sono in corso le attività necessarie per la stipula del contratto	Affidamento Lavori	Leenker Srl	
965	AG	012	Sambuca di Sicilia	Opere di consolidamento delle cavità sotterranee con sostegni metallici e in c.a. - chiodature - Quartiere "Saraceno"	€ 1.025.000,00	Nel corso del comitato del 20 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B. L'intervento è stato finanziato e sono completate le procedure di affidamento. Lavori aggiudicati dalla ATI DAMIGA srl. con un ribasso pari a al 26,6066%. In data 14/01/2013 è avvenuta la consegna dei lavori	Avviati Lavori	ATI DAMIGA s.r.l.	
176	AG	013	San Giovanni Gemini	Opere di consolidamento del centro abitato Viale Alessi	€ 2.474.826,76	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 55 del 10/2/2011 per un importo di euro 2.474.826,76. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara l'Idea Costruzioni è risultata aggiudicataria dei lavori in data 27/02/2012, con un ribasso del 53,1311%. In data 30/08/2012 hanno avuto inizio i lavori, ultimati in data 13/06/2013.	LAVORI ULTIMATI	Idea Costruzioni Srl	
965	AG	014	Santo Stefano di Quisquina	Opere di consolidamento e rifacimento regimazione idrica zona a valle villa comunale	€ 2.360.195,11	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		



**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
AP VERB. 24/3/2011	AG	174	Cattolica Eraclea	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa	€ 1.170.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
454	AG	174_int	Naro	Area Via Vannelle	€ 1.067.000,00	L'intervento è stato finanziato con DDG.n. 211 del 11/05/2012	Predisposizione atti di gara		
454	AG	175_int	Palma di Montechiaro	Lavori di rinaturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano	€ 1.800.000,00	L'intervento è stato finanziato con DDG.n. 160 del 09/03/2012	AdP integrativo		
176	CL	016	Acquaviva Platani	Consolidamento della parete rocciosa a monte della Via Marino Mistretta	€ 986.525,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 185 del 29/3/2011 per un importo di euro 986.525,06. I lavori sono stati aggiudicati alla CGP srl con un ribasso del 24,0495 ed in data 26/07/2012 sono stati avviati i lavori	Avviati Lavori		
176	CL	017	Butera	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
965	CL	018	Butera	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	€ 800.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Beneficiario Commissario Straordinario		
AP VERB. 15/2/2011	CL	019	Caltanissetta	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della Collina S. Anna, Centro Storico e quartiere Saccara, con opere di ingegneria	€ 4.160.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
AP VERB. 15/9/2011	CT	021	Acicatena	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Vampolieri	€ 4.500.000,00	Istruttoria progetto	Progetto ancora non pervenuto		
176	CT	028	Licodia Eubea	Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 880.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	CT	029	Maniace	Consolidamento Sponda sinistra T.te Martello	€ 1.500.000,00	Progetto ancora non pervenuto. In attesa procedure ambientali.	Progetto ancora non pervenuto		
965	CT	030	Maniace	Opere di regimazione idraulica e consolidamento delle scarpate - C/da Galatese-	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 38 del 31/01/2013	Intervento finanziato		
176	CT	032	Motta Sant'Anastasia	Opere di consolidamento del centro abitato: Area Nord Est	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG.n. 440 del 09/08/2012	Intervento finanziato		
965	CT	035	Raddusa	Trincea drenante a monte del centro abitato e paratie di pali	€ 2.500.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di euro 2,389.815,78. I lavori sono stati aggiudicati dalla Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali che ha offerto un ribasso del 22,5624.	Affidamento Lavori		
176	CT	038	Santa Venerina	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	€ 1.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	CT	039	Sant'Agata Li Battiati	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi	€ 1.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		




## ELENCO INTERVENTI B

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
176	CT	040	Trecastagni	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 446.849,79	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 446.849,79. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 12/12/2011 con un ribasso del 24,0415%. Il contratto è stato sottoscritto in data 24/04/2012 e i lavori sono stati avviati il 03/05/2012	Avviati Lavori	ATI Conticello Luigi-Rinaudo Costruzioni	03/05/2012
454	CT	176_int	Sant'alfio	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	€ 1.900.000,00	Progetto non pervenuto	AdP integrativo		
176	EN	041	Barrafranca	Mitigazione del rischio zona Bivio Catena	€ 1.608.973,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.608.973,06.	Intervento finanziato		
176	EN	043	Gagliano Castelferrato	Consolidamento centro abitato	€ 1.557.285,46	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 235 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.557.285,46. La gara è stata indetta in data 19/09/2011. a seguito dell'espletamento delle procedure i lavori sono stati affidati al CONSORZIO ESSEGI con il quale è stato stipulato il contratto in data 16/04/2012	Contratto stipulato		
965	EN	45_1	Leonforte	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante scuola Verga	€ 400.000,00	Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio relativo alla scuola Verga.	Progetto ancora non pervenuto		
	EN	45_2	Leonforte	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante la via Trieste	€ -	Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralcio relativo alla scuola Verga.	Progetto ancora non pervenuto		
176	EN	046	Piazza Armerina	Interventi nel quartiere Itria	€ 1.130.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 1.130.000. I lavori sono stati affidati alla Consorzio Galile S.c.a.r.l.- Esec. Kimissa costr. S.r.l.. I lavori hanno avuto inizio il 5 settembre 2011 e sono stati conclusi il 27/10/2012	LAVORI ULTIMATI	Consorzio Galile S.c.a.r.l.- Esec. Kimissa costr. S.r.l. Piazza Armerina	05/09/2011
176	ME	048	Alcara Li Fusi	Consolidamento costone roccioso sovrastante Centro Abitato	€ 1.880.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 1.880.000,00. I lavori sono stati aggiudicati in data 31/11/2011 all'impresa Sidoti Costruzioni Srl- che ha offerto un ribasso del 53,731% . I lavori sono stati consegnati in data 07/03/2012	Avviati Lavori	Sidoti Costruzioni Srl-	07/03/2012
176	ME	050	Ali	Opere di salvaguardia centro abitato 1° stralcio	€ 900.000,00	Intervento finanziato con D.D.G 161 del 12/03/2012	Intervento finanziato		
176	ME	054	Capizzi	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.192.623,56	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 16/3/2010 per un importo di euro 1.192.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Torsten Costruzioni che ha offerto un ribasso del 23,4255% . Il contratto è stato firmato in data 26/03/2012. i lavori sono iniziati in data 09/05/2012.	Avviati Lavori	Torsten Costruzioni	09/05/2012



**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
176	ME	055	Capo d'Orlando	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		
176	ME	060	Castel di Lucio	Completamento degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Calvario per la S.P. 176 e per il Centro Abitato - Via S.	€ 999.676,87	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 646 del 22/9/2010 per un importo di euro 999.676,87. In data 19/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "PI.SA.NI srl - Mussomeli" con un ribasso del 21,8864%. I lavori hanno avuto inizio il 5 luglio 2011 e sono stati completati in data 12/07/2012 con certificato di ultimazione del 16/07/2012.	LAVORI ULTIMATI	PI.SA.NI srl - Mussomeli	05/07/2011
176	ME	064	Cesarò	Consolidamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del Centro Abitato in zona Castello Colonna-Rocca a Sud dell'Abitato	€ 965.547,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 965.547,00. I lavori sono stati assegnati alla B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME). I lavori hanno avuto inizio il 7 settembre 2011	Avviati Lavori	B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME)	07/09/2011
AP VERB. 15/2/2011	ME	065	Ficarra	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne	€ 1.028.981,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010. Il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n.1 del 23.11.10. I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11. A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento transita alla lettera B (copertura finanziaria regionale). I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011.	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	EDILTECNICA COSTRUZIONI s.r.l.	20/01/2011
176	ME	067	Fondachelli Fantina	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a € 927.337,42. A seguito delle procedure di gara, con un ribasso del 30,3548%, l'aggiudicataria dei lavori risulta essere la Pullara Calogero.	Affidamento Lavori		
AP VERB. 15/9/2011	ME	068	Forza D'Agrò	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 414.163,28	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
965	ME	069	Frazzanò	Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Fragalà - Zona	€ 1.165.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 54 del 06/02/2012. Risulta aggiudicataria dei lavori la ATI Malfitano srl - Renzo Costruzioni	Affidamento Lavori		
965	ME	070	Frazzanò	Opere di consolidamento ad est del centro abitato	€ 2.500.000,00	La ATI ALAK srl - Costrubo risulta l'aggiudicataria dei lavori, dopo aver offerto un ribasso del 22,7777% ed è in corso di stipula il contratto	Affidamento Lavori		
965	ME	074	Giardini Naxos	Consolidamento versante - Località Orto Grande	€ 2.200.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 9 del 18/01/2012. Aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Consolidamenti Speciale srl, ribasso del 26,6305%. In data 27/02/2013 hanno avuto inizio i lavori	Avviati Lavori		
176	ME	075	Gualtieri Sicaminò	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	€ 1.651.041,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 273 del 22/4/2011 per un importo di euro 1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. in corso di aggiudicazione	Affidamento Lavori		
965	ME	076	Itala	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Frazione Borgo	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 10 del 18/01/2012	Intervento finanziato		
965	ME	077	Leni	Opere di difesa costiera a difesa del centro abitato	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 792 del 26/10/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla Chiofalo Costruzioni srl ed in data 28/09/2012 è avvenuta la consegna dei lavori	Avviati Lavori		
176	ME	082	Limina	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.666.000,00	Intervento finanziato con DDG.n. 301 del 30/05/2012. L'Aggiudicataria dei lavori, a seguito di gara, risulta essere la D.L.M. Costruzioni srl (ribasso del 28,4166%). I lavori hanno avuto inizio il 19/07/2013	Avviati Lavori		



**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
176	ME	083	Longi	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.474.985,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 153 del 18/3/2011 per un importo di euro 1.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un ribasso del 24,16354%. In data 08/02/2012 hanno avuto inizio i lavori.	Avviati Lavori	Demetra Lavori Srl	
176	ME	084	Malfa	Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Torricella della Frazione Capo	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 846 del 22/11/2011.	Intervento finanziato		
176	ME	085	Malvagna	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un ribasso d'asta pari al 23,44. I lavori sono stati consegnati in data 30/12/2011.	Avviati Lavori	MICHELANGELO MAMMANA - Castel di Lucio (ME)	30/12/2011
176	ME	086	Mandanici	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.149.942,49	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA con un ribasso d'asta pari al 22,832 ed affidati alla stessa in data 20/10/2011	Avviati Lavori	ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA	20/11/2011
176	ME	090	Miltello Rosmarino	Consolidamento all'interno del centro abitato in c/da Ramisi	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG.n. 584 del 29/10/2012	Intervento finanziato		
176	ME	093	Monforte San Giorgio	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.200.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 360 del 6/6/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. In data 22/11/2012 è stato stipulato il contratto con il Consorzio Cooperativo Costruzioni che ha offerto un ribasso del 11,754%.	Affidamento Lavori		
176	ME	094	Motta Camastra	Completamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Mancusa	€ 993.521,35	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 993.521,35. I lavori sono stati affidati alla Vertical Project srl ed in data 12/03/2012 è avvenuta la consegna dei lavori.	Avviati Lavori	VERTICAL PROJECT s.r.l. - Cesarò (ME)	12/03/2012
176	ME	096	Novara di Sicilia	Consolidamento del centro abitato	€ 399.110,40	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 1/4/2011 per un importo di euro 399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chiofalo Group con un ribasso d'asta pari al 23,9471%, ed in data 25/11/2011 sono stati avviati.	Avviati Lavori	CHIOFALO GROUP srl - San Filippo del Mela	25/11/2011
176	ME	097	Pagliara	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 163 del 12/03/2012. Con un ribasso del 33,0927 risulta essere l'aggiudicataria dei lavori la MEDI Appalti srl	Affidamento Lavori		
176	ME	098	Patti	Consolidamento frazione Sorrentino	€ 1.085.544,63	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 18/3/2011 per un importo di euro 1.085.544,63. I lavori sono stati aggiudicati dalla ATI Co.I.V. di Rachieli S. - G.F. Costruzioni srl - Patti Sorrentini srl con un ribasso del 24,05%. In data 24/07/2012 sono stati avviati i lavori	Avviati Lavori		
176	ME	101	Reitano	Opere di consolidamento centro abitato	€ 980.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 849 del 22/11/2011	Intervento finanziato		






**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
176	ME	102	Roccalumera	Consolidamento del centro abitato	€ 850.000,00	I lavori sono stati consegnati in data 12/10/2012 alla Consorzio Artek - Roma (Giada Costruzioni) che ha offerto in gara un ribasso del 26,6166%.	Avviati Lavori		
176	ME	103	Roccalvaldina	Consolidamento centro abitato	€ 1.885.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 726 del 14/10/2010 per un importo di euro 1.885.000,00. I lavori sono stati affidati alla Sidoti Costruzione con un ribasso d'asta pari a 47,731%. Il Contratto è stato stipulato in data 26/03/2012 e i lavori sono stati avviati il 14/06/2012	Avviati Lavori	SIDOTI COSTRUZIONI srl- Montagnarea le (ME)	14/06/2012
176	ME	104	Roccella Valdemone	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 875.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/6/2011 per un importo di euro 875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2011, a favore della Di Maria Costruzioni. In data 01/12/2011 hanno avuto inizio i lavori, terminati in data 12/11/2012	LAVORI ULTIMATI		
965	ME	105	Rometta	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
965	ME	106	S. Alessio Siculo	Barriera soffolta e radente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario		
176	ME	108	San Pier Niceto	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.550.000,00	Intervento finanziato con DDG. 619 del 06/11/2012	Intervento finanziato		
AP VERB. 15/2/2011	ME	110	San Piero Patti	Opere di consolidamento e regimazione idraulica del centro abitato	€ 1.850.000,00	Il Comune con nota del 10 feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, R4P4 GP1, dalla lettera A alla lettera B, cioè di inserirlo nel PO FESR 2007/2013; Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanza del Comune nel corso della seduta del 24 febbraio 2011. Il progetto è stato finanziato con DDG.n. 127 del 11/03/2013	Intervento finanziato		
176	ME	111	Santa Lucia del Mela	Consolidamento centro abitato	€ 1.300.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 31/8/2010 per un importo di euro 1.300.000,00. In data 20/4/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. - Aci Castello" con un ribasso del 21,3808%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011	Avviati Lavori	UNICOS srl Aci Castello	18/08/2011
176	ME	112	Santa Lucia del Mela	Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologico perimetro urbano in Contrada Grazie in prossimità del Viale dei Pini	€ 1.200.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 88 del 1/3/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIOFALO COSTR. S.R.L.-S.Filippo del Mela (ME) con un ribasso d'asta pari al 23,2012. I lavori hanno avuto inizio il 21/11/2011	Avviati Lavori	CIOFALO COSTR. S.R.L.- S.Filippo del Mela (ME)	21/11/2011
176	ME	114	Sant'Agata di Militello	Intervento di difesa idraulica del centro abitato	€ 1.710.000,00	Intervento finanziato con DDG. 881 del 25/11/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla Amata Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 30,00%	Affidamento Lavori		
176	ME	116	Savoca	Consolidamento centro abitato	€ 1.195.875,88	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadore Asfalti s.p.a. Belluno con un ribasso d'asta pari al 23,1. Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2012	Contratto stipulato	Cadore Asfalti s.p.a. Belluno	




**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
176	ME	117_1	Scaletta Zanclea	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz.	€ 2.700.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 36 del 31/01/2013	Intervento finanziato		
176	ME	117_2	Scaletta Zanclea	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz.	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 37 del 31/01/2013	Intervento finanziato		
965	ME	118	Scaletta Zanclea	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torrente Divieto Codice PAI 102-	€ 1.400.000,00	Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il finanziamento dell'intervento ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi è il	Progetto ancora non pervenuto		
176	ME	122	Spadafora	Consolidamento centro abitato	€ 1.327.891,32	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 571 del 31/8/2010 per un importo di euro 1.327.891,32. I lavori sono stati affidati alla ATI Imp. Rubino s.r.l. Castell'Umberto - Imp- Trovato Torregrotta con un ribasso d'asta pari al 22,2222. La consegna dei lavori è avvenuta il 29/11/2011	Avviati Lavori	ATI Imp. Rubino s.r.l. Castell'Umberto - Imp- Trovato	29/11/2011
965	ME	123	Spadafora	Consolidamento dell'area - Fraz. S. Martino	€ 1.500.000,00	lavori sono stati affidati alla PMP costruzioni srl con un ribasso d'asta pari a 26,178%.	Affidamento Lavori	PMP costruzioni srl	
AP VERB. 15/2/2011	ME	124	Terme Vigliatore	Ripascimento scogliere - Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario		
AP VERB. 15/2/2011	ME	127	Tortorici	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona S.Paolo	€ 2.300.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Istruttoria Progetto		
965	ME	129	Tortorici	Opere di consolidamento, regimazione idraulica e drenaggi - Zona via Zappulla Prosecuzione della barriera soffolta a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 4.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n.393 del 09/07/2012.	Intervento finanziato		
AP VERB. 15/2/2011	ME	130	Tusa	Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile-Belvedere	€ 1.500.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario		
176	ME	131	Ucria	Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	€ 1.261.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	ME	133	Valdina	Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	€ 2.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 211 del 6/4/2011 per un importo di euro 2.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 24,3987.	Contratto stipulato	ATIN ASC srl	
176	ME	134	Venetico	Consolidamento del centro abitato	€ 1.554.100,81	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 492 del 7/7/2011 per un importo di euro 1.554.100,81. L'Impresa Renzo Costruzioni srl è risultata aggiudicataria dei lavori, che hanno avuto inizio in data 07/06/2013	Avviati Lavori		
AP VERB. 24/3/2011	ME	176	Giardini Naxos	Erosione costiera	€ 1.400.000,00	Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto		



**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI		
								impresa	data inizio lavori	
AP VERB. 15/9/2011	176	PA	135	Altofonte	Consolidamento centro abitato	€ 789.270,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Cangemi con un ribasso d'asta pari al 23,8727. Il Contratto è stato stipulato in data 29/02/2012 e la consegna lavori è avvenuta l'11/04/2012	Avviati Lavori	Geom. Carmelo Cangemi	11/04/2012
	176	PA	138	Caltavuturo	Consolidamento centro abitato	€ 793.690,51	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 252 del 18/4/2011 per un importo di euro 793.690,51. I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 23,2553. Il Contratto è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è avvenuta l'02/02/2012	Avviati Lavori	Torsten Costruzioni Srl	02/02/2012
	965	PA	139	Campofelice di Roccella	Opere di consolidamento - C/da Belvedere	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG.n. 39 del 31/01/2013	Intervento finanziato		
	176	PA	140	Camporeale	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 15 settembre 2011 dalla lettera A alla lettera B. Progetto ancora non pervenuto	Progetto ancora non pervenuto		
	176	PA	144	Castronovo di Sicilia	Opere di consolidamento del centro abitato: versante Est a difesa della Scuola Elementare di Via Mazzini, ecc.	€ 1.600.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 29/3/2011 per un importo di euro 1.600.000,00. I lavori sono stati affidati a SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'asta pari al 23,0625%. Il Contratto è stato stipulato in data 17/05/2012 e la consegna lavori è avvenuta il 22/06/2012	Avviati Lavori	CF Costruzioni s.r.l.	22/06/2012
	965	PA	145	Castronovo di Sicilia	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.344.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 22/06/2012	Predisposizione atti di gara		
	176	PA	146	Geraci Siculo	Progetto di consolidamento della zona nord orientale	€ 1.057.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 1.057.000,00. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San Giuseppe di Lanza Vincenzo s.a.s" con un ribasso del 22,4650%. In data 24/6/2011 riapertura gara a seguito ricorso della seconda classificata. nuova aggiudicazione alla Impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 22,4622%. Lavori avviati il 13/04/2012	Avviati Lavori	Di Maria Costruzioni srl	13/04/2012
	176	PA	147	Marineo	Consolidamento centro abitato	€ 2.257.528,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 2.257.528,00. I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,9653. I lavori sono stati avviati il 29/12/2011	Avviati Lavori	ATI Costr. San Giuseppe di Lanza Vincenzo e C s.a.s Catalano Francesco	29/12/2011
965	PA	148	Mezzojuso	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario			
AP VERB. 15/2/2011	176	PA	150	Palermo	Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli	€ 4.300.000,00	In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo. I lavori sono stati aggiudicati dalla ICM che ha offerto un ribasso del 25,3627	Affidamento Lavori	I.C.M. - Impresa Costruzioni Moderne -	
176	PA	151	Partinico	Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	€ 950.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario			




**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
	PA	152	Petralia Sottana	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello	€ 1.200.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Intervento finanziato Ente Beneficiario Commissario		
176	PA	153	Polizzi Generosa	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 908.469,01	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 753 del 25/10/2010 per un importo di euro 908.469,01. I lavori sono stati aggiudicati alla QUADRIFOGLIO s.r.l. - Polizzi Generosa con un ribasso offerto pari a 21,7273%. I lavori hanno avuto inizio il 10 giugno 2011	Avviati Lavori	QUADRIFOGLIO s.r.l. - Polizzi Generosa	10/06/2011
176	PA	155	Termini Imerese	Intervento di monitoraggio del centro abitato	€ 198.196,38	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 754 del 25/10/2010 per un importo di euro 198.196,38. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Bellino Costruzioni S.r.l. - Cammarata" con un ribasso del 21,8288% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).	Affidamento Lavori	Bellino Costruzioni srl Cammarata	
454	PA	182	Corleone	Messa in sicurezza costone roccioso Contrada S. Giovanni	€ 1.578.183,23	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 358 del 22/06/2012	Intervento finanziato		
454	PA	183	Pollina	consolidamento della rupe S. Pietro	€ 800.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 624 del 12/09/2012	Intervento finanziato		
176	RG	158_1	Modica	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	€ 2.000.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	RG	158_2	Modica	Consolidamento e messa in sicurezza collina Giacanta e Monserrato	€ 1.000.000,00	L'intervento previsto in APQ è stato suddiviso in 2 stralci e lo stralcio da 1000.000,00 è stato finanziato con decreto n.804 del 20/11/2011	Intervento finanziato		
176	RG	160	Ragusa	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.674.051,32	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 106 del 7/3/2011 per un importo di euro 1.674.051,32. i lavori sono stati affidati alla "PRESAL COSTR. S.R.L.- S.Agata di Militello (ME)" con un ribasso del 23,2118% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).	Affidamento Lavori	PRESAL COSTR. S.R.L.- S.Agata di Militello (ME)	
176	SR	164	Portopalo di Capo Passero	Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	€ 719.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 642 del 18/09/2013	Intervento finanziato		
176	SR	166	Rosolini	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
176	TP	170	Poggioreale	Consolidamento versante orientale dell'abitato	€ 1.500.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 493 del 7/7/2011 per un importo di euro 1.500.000,00. i lavori sono stati affidati alla Spallina Costruzioni con un ribasso del 24,1644%	Affidamento Lavori	Spallina Costruzioni	



**ELENCO INTERVENTI B**

DDG	PROV	COD	COMUNE	TITOLO	IMPORTO rimodulato	Stato dell'arte	SAL	AFFIDAMENTO LAVORI	
								impresa	data inizio lavori
AP VERB. 15/2/2011	TP	171	Salemi	Sistemazione del costone roccioso Monte Rose a monte della via Marsala – Zona C.da Monte Rose	€ 1.650.000,00	In Ottemperanza alle determinazioni del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 il finanziamento relativo all'intervento viene aumentato, attraverso l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla mancata realizzazione dell'intervento ME79A_Librizzi pari a € 150,000€, passando da 1.500.000,00 a 1.650.000,00 euro. Nella stessa seduta del Comitato si stabilisce di far transitare l'intervento dalla lettera A alla Lettera B. I lavori sono stati aggiudicati dalla LeC srl che ha offerto un ribasso del 26,9699%. In data 21/03/2013 hanno avuto inizio i lavori	Avviati Lavori		
	TP	173	Trapani	Opere di regimazione idraulica – Zona Salinagrande	€ 4.000.000,00	L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 24 feb 2011 dalla lettera A alla lettera B. Pertanto Con nota prot. 510 del 15 apr 2011 si comunica all'ARTA l'avvenuta variazione e si trasmette tutta la documentazione. In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Trapani.L'intervento è stato finanziato con DDG n. 959 del 23/12/2011.	Intervento finanziato		
454	TP	190	San Vito Lo Capo	Erosione costiera	€ 1.350.000,00	Ente Beneficiario Commissario Straordinario	Ente Beneficiario Commissario Straordinario		
					€ 160.226.986,15				




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento							Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																			
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL				
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo							
AG	001	Agrigento	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di messa in sicurezza del centro abitato	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Agrigento il quale, a seguito di gara del 25/11/2011, ha affidato i lavori relativi alle indagini preliminari, finanziati con Decreto Commissariale n. 394 del 21/12/2011 e ad oggi conclusi. Con nota acquisita al prot. n. 1455 del 30/04/2012, il GC AG, a seguito di sprofondamenti a ridosso del marciapiede in Via Empedocle (Area di progetto), in corrispondenza dell'antica chiesa di S. Lucia, ha richiesto un sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi e pianificare gli interventi da realizzare. Con nota acquisita al prot. n. 4468 del 05/11/2012, il GC di Ag ha comunicato all'Ufficio del Commissario che, a seguito del violento nubifragio del 24/10/2012, è stato necessario rivedere la scelta progettuale, nonché adeguarla alla nuova situazione determinatasi. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4622 del 09/11/2012, il GC ha trasmesso copia del progetto. Con Decreto Commissariale n. 639 del 22/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori di somma urgenza. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 680 del 10/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori di estrema urgenza per il consolidamento della parete muraria prospiciente la via delle Torri a favore della CO.GE.MA.LA. S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 29,8866%. Il Contratto è stato stipulato in data 11/12/2012. In data 12/12/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che dovranno concludersi in giorni 150 naturali e consecutivi pertanto l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 07/05/2013. Con Decreto Commissariale n. 243 del 03/04/2013 è stata impegnata la somma di € 511.376,29 Con nota acquisita al prot. n. 2532 del 03/05/2013 il D.L. propone una proroga di giorni 28 naturali e consecutivi, per cui il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al 04/06/2013. Il GC di Agrigento con nota prot. n. 4279 del 16/07/2013 trasmette la relazione a struttura ultimata redatta ai sensi dell'art. 6 della Legge 1086/71. Con Decreto Commissariale n. 576 del 17/07/2013 si procede alla presa d'atto della PVS e rimodulazione impegno somme.	SOSPENSIONE LAVORI	GC	GC AG	GEOMERID SRI	CO.GE.MA.LA. S.r.l. (Lavori di estrema urgenza)	12/12/2012	€ -	€ -	€ -	€ -	n. 576 del 17/07/2013	€ 534.077,76	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC AG)	n.1344/UC del 01/08/2011	Genio Civile AG				
AG	002	Caltabellotta	B	B	Regione		Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 600.000,00	€ 600.000,00	Emesso nuovo Decreto di Finanziamento nell'agosto del 2011, il Primo Decreto è stato annullato a seguito di un rinvio della Corte dei Conti relativo ai certificati emessi per l'approvazione tecnica. I lavori sono stati aggiudicati in data 02.04.2012 all'impresa Anzalone Luigi & Co. - San Cataldo che ha offerto un ribasso del 24,7985%. In data 02/05/2012 è avvenuta la consegna dei lavori	Avviati Lavori				Anzalone Luigi & Co.	2-mag-2012	N. 624 DEL 18/08/2011	€ 600.000,00											
AG	003	Cammarata	A	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento parete calcarea quartiere Santa Lucia	€ 1.050.000,00	€ 1.050.000,00	La Progettazione è affidata al Genio Civile di Agrigento. Il 20/1/2011 affidate indagini geognostiche. Nel corso del comitato del 24 febbraio l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B. I lavori sono stati aggiudicati all'impresa Panepinto Costruzioni s.r.l. con un ribasso del 26,5087%.	Affidamento Lavori		Genio Civile				159 DEL 9 MARZO 2012	€ 1.050.000,00				3/11- Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC AG)							
AG	004	Cattolica Eraclea	A	B*	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Mitigazione Rischio Idrogeologico - Crolli Costone Roccioso Eraclea Minoa	€ 1.480.000,00	€ 1.480.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2373 del 22/06/2012, L'ARTA Serv. 3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato che è stato individuato come Ente Beneficiario del finanziamento relativo all'intervento. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2815 del 20/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha trasmesso due copie del progetto e la relativa documentazione amministrativa inviata dal Comune. Con Decreto Commissariale n. 143 del 27/02/2013 è stato nominato l'ing. Lorenzo Calamo RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Croce Rita di Caro Collaboratore Amm.vo. Con Decreto Commissariale n. 231 del 27/03/2013 è stata acquisita la progettazione definitiva ed esecutiva redatta dall'ing. Attilio Santini e dal Dott. Geol. Matteo Vento. Con nota acquisita al prot. n. 6723 del 08/11/2013 il RUP trasmette l'elenco degli Enti preposti a salvaguardia dei vincoli insistenti sull'area di intervento.	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI		Esterna												Arch. Caterina Stampone GC Ag	Decreto Commissariale n. 482 del 26/06/2013	Geom. Francesco Mirabelli GC Ag		
AG	005	Cianciana	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico del versante ovest del centro abitato	€ 942.838,00	€ 855.618,05	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 194 del 1/4/2011 per un importo di euro 855.618,05. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 06/09/2011 con un ribasso del 23,2603% alla Torsten Costruzioni. Contratto sottoscritto il 30/03/2012. Lavori avviati in data 31/05/2012 In data 29/10/2012 sono stati ultimati i lavori	LAVORI ULTIMATI					Torsten Costruzioni	31-mag-2012	N. 194 DEL 01/04/2011	€ 855.618,05										
AG	006	Favara	A	A	Ministero		Opere di consolidamento tra le vie De Gasperi e De Pretis	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La progettazione è stata affidata al Genio Civile di AG che, con nota acquisita al prot. n. 2000 del 5/10/2011, ha trasmesso il Progetto Definitivo dell'intervento. In sede di Conferenza dei Servizi del 10 /02/2012 sono stati acquisiti i pareri necessari per l'approvazione del progetto. Con nota acquisita al prot. n. 1112 del 03/04/2012, il GC di Ag ha trasmesso il progetto esecutivo. Con Decreto Commissariale n. 175 del 18 aprile 2012 si è provveduto a finanziare l'intervento. Con Decreto Commissariale n. 251 del 30/05/2012 si sono aggiudicati definitivamente i lavori a favore della BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop. Con nota acquisita agli atti al prot. n.2050 del 07/06/2012, il GC di Ag ha comunicato che in data 06/06/2012 sono stati redatti il verbale di immissione in possesso delle aree da espropriare nonché il verbale sulle verifiche per l'immediata esecuzione dei lavori. In data 03/07/2012 è stato stipulato il contratto con l'impresa Bollita Costruzioni Soc. Coop. In data 21/08/2012 sono stati consegnati i lavori, che dovranno concludersi entro il 21/08/2013. Con Decreto Commissariale n. 732 del 20/12/2012 è stato disposto il pagamento del SAL n. 1 e del SAL n. 2 alla Bollita Costruzioni, e con Decreto n. 671 del 22/08/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 3. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 5335 del 09/09/2013 trasmette la perizia di variante dei lavori. Con nota acquisita al prot. n. 5982 del 07/10/2013 l'impresa Bollita Costruzioni, comunica che in data 04/10/2013 sono stati ultimati i lavori.	LAVORI ULTIMATI	GC	GC Ag	IMGA s.a.s	BOLLITA COSTRUZIONI Soc. Coop.	21/08/2012	n.175 del 18/04/2012	€ 1.500.000,00	€ -	n. 581 del 06/11/2012	€ 1.192.811,88	Ing. Domenico Armenio (Ing. Capo GC Ag)	n. 369/UC del 12/10/2010	Genio Civile					
AG	007	Lucca Sicula	A	A	Ministero		Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La Progettazione è stata affidata al Comune di Lucca Sicula. Con Decreto Commissariale n.34 del 28/11/2011 è stato nominato RUP per le procedure espropriative il Dirigente dell'UTC del Comune di Lucca Sicula. Ad oggi sono in corso le procedure di esproprio e la determinazione dell'indennità di Espropriazione per la definizione della quale il Comune, con nota prot. n. 169 del 12/01/2012, acquisita al prot. n. 101 del 17/01/2012, ha richiesto alla Commissione per la Determinazione dell'indennità di Espropriazione il parere ai sensi dell'art. 41 DPR 327/2011, già pervenuto al Comune di Lucca Sicula. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 286 del 16/01/2013 il progettista, geom. Silvestre Giarratano, trasmette n. 2 copie del progetto esecutivo. A seguito della CdS del 30/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1328 del 04/03/2013 il Geom. Silvestre Giarratano, responsabile delle procedure espropriative, trasmette copia delle comunicazioni di avvio del procedimento, per l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle ditte presenti nel piano particellare di esproprio.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE		Comune Geom. Silvestre Giarratano (resp UTC)													Dott. Giuseppe Lombardo	D.C. n. 29 del 23-02-2011	Geom. Ferrante Geom. Nicolichia Dott. Barranco	
AG	008	Montallegro	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento della parete Est del Monte Lupo sovrastante il centro abitato	€ 2.407.326,00	€ 1.435.536,03	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 236 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.435.536,03. A seguito di procedura di gara i lavori sono stati affidati alla BCS COSTRUZIONI S.R.L. C/da Cicè Mistrretta. Il Contratto è stato stipulato in data 06/06/2012 e i lavori avviati in data 19/06/2012.	Avviati Lavori					BCS COSTRUZIONI S.R.L.	19-giu-2012	N. 236 DEL 13/04/2011	€ 1.435.536,03										
AG	009	Ravanusa	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento zona Est Centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 996.908,73	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 28 del 2/2/2011 per un importo di euro 996.908,73. Lavori aggiudicati con un Ribasso pari a 22,597%. Sono in corso le attività necessarie per la stipula del contratto	Affidamento Lavori					Leenker Srl		N. 28 DEL 02/02/2011	€ 996.908,73										



ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento								Stato Intervento		Stato avanzamento Intervento																					
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL						
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo	n. e data		importo										
AG	010	Ribera	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Completamento consolidamento centro abitato secca grande	€ 2.600.000,00	€ 2.600.000,00	<p>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Ribera.</p> <p>A seguito di richiesta del Commissario, in data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha dato indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali.</p> <p>A seguito di vari incontri e colloqui, con Decreto Commissariale n. 350 del 11/07/2012 è stata effettuata l'acquisizione del progetto dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune.</p> <p>Il progetto è stato trasmesso dai progettisti ed acquisito agli atti al prot. n. 2903 del 27/07/2012</p> <p>A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP de' Ing. Giuseppe La Pica e del Supporto Ing. Rossella Zumbè, con Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013 è stato nominato il Geom. Giuseppe Ferrante RUP dell'intervento, con il Supporto dell'Arch. Giovanni Piero Di Magro.</p> <p>Con nota prot. n. 5236 del 05/09/2013 il Commissario comunica i nominativi del gruppo di verifica del progetto esecutivo.</p> <p>Il RUP geom. Giuseppe Ferrante con nota prot. n. 5841 del 30/09/2013 trasmette la documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 870 del 18/10/2013 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 888 del 22/10/2013 è stato approvato il bando e disciplinare di gara.</p>	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		Ing. M.Vella Arch. L. Federà (Arch. Antonuccio: Delibera di G.M. n.152 del 25/05/2012 presa d'atto della sopravvenuta mancanza di partecipazione alla progettazione esecutiva)								n. 870 del 18/10/2013	€ 2.467.663,33	€ 132.336,67		€			Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto Commissariale n. 75 del 01/02/2013	Arch. Giovanni Piero Di Magro	
AG	011	Ribera	A	A	Ministero		Opere di consolidamento centro urbano	€ 939.021,00	€ 939.021,00	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di AG.</p> <p>Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 33 del 08/03/2011 e, a seguito delle procedure di gara, la realizzazione dei lavori è stata affidata alla Gattopardo Costruzioni s.r.l., giusto Decreto n.237 del 21/09/2011.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 26/10/2011.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 163 del 11 aprile 2012 è stata disposta la revoca del provvedimento di aggiudicazione, risoluzione del contratto e la sospensione immediata dei lavori alla Soc. Gattopardo Costruzioni s.r.l. a seguito della nota della Prefettura di Agrigento prot. n. 0013013 del 26/03/2012, acquisita al prot.n. 1192 del 10/04/2012.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 200 del 03.05.2012 è stata disposta pertanto l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa successiva in graduatoria C&amp;P srl.</p> <p>Con nota prot. n. 32160 del 08/05/2012 acquisita al prot. n. 1570 del 09/05/2012 il DRPC di Agrigento ha trasmesso gli atti relativi alla consistenza dei lavori a tutto il 16/04/2012 e delle scorte a tutto il 27/04/2012.</p> <p>In data 26/06/2012 è stato sottoscritto il contratto con la C&amp;P Srl.</p> <p>In data 28/06/2012 è avvenuta la consegna dei lavori che avrebbero dovuto concludersi concludersi entro 120 giorni naturali e pertanto entro il 26/10/2012.</p> <p>Il RUP, tenuto conto delle speciali circostanze segnalate dall'impresa C&amp;P Srl, visto il parere del D.L., con nota acquisita agli atti al prot. n. 4612 del 08/11/2012 trasmette la concessione di proroga richiesta di giorni 30 per l'ultimazione dei lavori.</p> <p>In data 31/01/2013 sono stati ultimati i lavori.</p> <p>Con nota prot. n. 2263 del 16/04/2013 il RUP trasmette al Commissario i certificati di ultimazione lavori e di avvenuta efficacia del certificato di ultimazione lavori.</p>	LAVORI ULTIMATI		DRPC Ag	C. & P. SRL	28-giu-2012	n.33 - 8/3/2011	€ 939.021,00	€	n.280 del 14/06/2012	€ 640.129,86			Arch. Gesua Palumbo (a seguito revoca dell'Ing.Cimino)	n. 39459 del 9 settembre 2010 del Dirigente Generale del DRPC	Collaboratore amministrativo al RUP Coll. "B" Giovanna Chianetta			Ing. Carmelo Arcieri DRPC			
AG	012	Sambuca di Sicilia	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento delle cavità sotterranee con sostegni metallici e in c.a.- chiodature - Quartiere "Saraceno"	€ 1.025.000,00	€ 1.025.000,00	<p>Nel corso del comitato del 20 ottobre 2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B. L'intervento è stato finanziato e sono completate le procedure di affidamento. Lavori aggiudicati dalla ATI DAMIGA srl. con un ribasso pari a al 26,6066%. In data 14/01/2013 è avvenuta la consegna dei lavori</p>	Avvii Lavori				ATI DAMIGA srl	14-gen-2013	965 6-feb-12	€ 973.600,83													
AG	013	San Giovanni Gemini	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 2.500.000,00	€ 2.474.826,76	<p>L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 55 del 10/2/2011 per un importo di euro 2.474.826,76. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara l'idea Costruzioni è risultata aggiudicataria dei lavori in data 27/02/2012, con un ribasso del 53,1311%. In data 30/08/2012 hanno avuto inizio i lavori, ultimati in data 13/06/2013.</p>	LAVORI ULTIMATI			Idea Costruzioni Srl	30-ago-2012	N. 55 DEL 10/02/2011	€ 2.474.826,76														
AG	014	Santo Stefano di Quisquina	A	B*	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento e regimazione idrica a valle della Villa comunale	€ 2.360.195,11	€ 2.360.195,11	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2370 del 27/06/2012 l'ARTAServ.3 comunica al Comune di Santo Stefano di Quisquina che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a raccordarsi urgentemente con l'Ufficio sopradetto e a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3119 del 09.08.2012, trasmette agli Uffici del Commissario tutta la documentazione in suo possesso.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p>	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI		Esterna															0			
AG	015	Sciacca	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011	Opere di consolidamento parete Coda di Volpe	€ 800.000,00	€ 800.000,00	<p>Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti incaricati dal Comune di Sciacca. In sede di Conferenza di Servizi del 12/05/2008, convocata dallo stesso Comune, sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni da parte degli Enti intervenuti. A seguito della revisione del progetto, in adempimento alle prescrizioni formulate in sede di CdS, da parte dei progettisti, il C.S. ha ritenuto opportuno, considerate le notevoli variazioni introdotte, chiedere nuovamente il parere dell'ARTAServ.3.</p> <p>Acquisito il parere dell'ARTAServ.3, al prot 1785 del 19/09/2011, il Commissario ha chiesto al Comune l'adeguamento del progetto alle prescrizioni formulate. Gli elaborati aggiornati e la stesura finale del progetto, sono stati trasmessi dal Comune con note acquisite agli atti con prot. n.460 del 14/02/2012 e con prot. n.1561 del 08/05/2012.</p> <p>A seguito della CdS del 01.08.2012, l'UTC, con nota acquisita al prot. n. 3091 del 08.08.2012, comunica l'impossibilità di rielaborare il progetto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3416/LC del 11/09/2012 il Genio Civile di Agrigento si dichiara disponibile, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione del 10.11.10, a collaborare per la definizione del progetto, così come richiesto dal Commissario con nota prot. n. 3292 del 03/09/2012.</p> <p>Con nota prot. n. 5455 del 19/12/2012, il Commissario autorizza il GC di Ag a procedere celermente alle attività tecniche richieste.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6636 del 05/11/2013 il GC di Ag trasmette il progetto esecutivo.</p> <p>Al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento il Commissario invita gli Enti a partecipare alla CdS per il giorno 19/11/2013.</p>	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI		GC Ag																		




ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	Descrizione Intervento				Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																					
			FONDI ORIGINALI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL						
			impresa	data inizio lavori	n. e data	importo	n. e data	importo																							
AG	174	Cattolica Eraclea	B	B*	Regione	COMITATO 24 MAR 2011	Crolli costone roccioso Eraclea Minoa (Loc. Zagarella)	€ 1.170.000,00	€ 1.170.000,00	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2366 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota prot. n. 2537 del 06/07/2012 di sollecito da parte del Commissario al Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa, l'UTC comunica, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4203 del 19/10/2012, di non essere in condizione di redigerlo, demandandolo al Commissario.</p> <p>Con nota prot. n. 4251 del 23/10/2012, il Commissario trasmette alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, aggiungendo l'intervento AG 174 Cattolica Eraclea B* "Crolli costone roccioso centro abitato - Loc. Zagarella" importo € 1.170.000,00</p> <p>Con nota prot. n. 4279 del 23/10/2012, il Commissario comunica al Comune che, nella qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, procederà alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera.</p> <p>Con nota prot. n. 4263 del 23/10/2012, il Commissario incarica la Soc. IAP, in base alla convenzione del 18/02/2011, delle attività di progettazione dell'intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4309 del 24/10/2012 IAP comunica i nominativi del GdL. Con Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013 è stato nominato l' Arch. Caterina Stampone RUP dell'intervento con il Supporto del Geom. Francesco Mirabelli e la Sig.ra Carmelina Scifo collaboratore amministrativo.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 281 del 16/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari a favore della Impresa GEO GAV S.r.l. (ribasso percentuale pari al 51,0001%). In data 13/05/2013 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3880 del 27/06/2013 la GEOGAV ha trasmesso gli elaborati. Con nota acquisita al prot. n. 5166 del 02/09/2013 la CGIAM trasmette l'approvazione della relazione geologica.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 6157 del 11/10/2013, il Gruppo di Progettazione IAP trasmette gli elaborati araoettuali.</p>	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	CGIAM INVITALIA GC	INVITALIA	GEO GAV S.r.l.	-	-	0-Jan-00	-	0	-	Arch. Caterina Stampone	Decreto Commissariale n. 144 del 27/02/2013	Geom. Francesco Mirabelli								
AG	174_Int	Naro	B	B	Regione	AdP Integrativo	Lavori di consolidamento a salvaguardia e protezione del centro abitato	€ 1.067.000,00	€ 1.067.000,00	L'intervento è stato finanziato con DDG.n. 211 del 11/05/2012	Predisposizione atti di gara																				
AG	175_Int	Palma di Montechiaro	B	B	Regione	AdP Integrativo	Lavori di rinaturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	L'intervento è stato finanziato con DDG.n. 160 del 09/03/2012	AdP Integrativo																				
CL	016	Acquaviva Platani	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento della parete rocciosa a monte della Via Marino Mistretta	€ 1.000.000,00	€ 986.525,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 185 del 29/3/2011 per un importo di euro 986.525,06. I lavori sono stati aggiudicati alla CGP srl con un ribasso del 24,0495 ed in data 26/07/2012 sono stati avviati i lavori	Avviati Lavori			CGP srl	26-lug-2012	N. 185 DEL 29/03/2011	€ 986.525,06														
CL	017	Butera	B	B*	Regione		Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2364 del 27/06/2012, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3086 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto corredato della documentazione amministrativa.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013</p>	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI		Comune												Geom. Filippo Trainiti						
CL	018	Butera	A	B*	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento pendici del centro Storico	€ 800.000,00	€ 800.000,00	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.2365 del 27/06/12, l'ARTA Serv.3 comunica al Comune di Butera che l'Ufficio del Commissario Delegato è stato individuato come Ente Beneficiario, invitandolo pertanto a trasmettere al C.S. tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>A seguito della nota di sollecito da parte del Commissario, il Comune, con nota acquisita al prot.n.3085 del 08.08.2012, trasmette copia del progetto, corredato della documentazione amministrativa.</p> <p>Sono state tenute delle riunioni presso la Struttura Commissariale, alle quali sono stati invitati sia l'amministrazione comunale che i progettisti incaricati per affrontare le criticità che si sono presentate nel corso dell'istruttoria del progetto.</p> <p>Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 19/06/2013</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi di giorno 10/07/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.</p>	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE		Comune																		
CL	019	Caltanissetta	A	B*	Regione	COMITATO 24 MAR 2011	Consolidamento, bonifica e canalizzazione del versante sud della colline Sant'Anna, centro storico e quartiere Sacchara, con opere di ingegneria naturalistica, rimodellamento e inerbimento dei versanti dell'abitato	€ 4.160.000,00	€ 4.160.000,00	<p>La progettazione è affidata al Comune.</p> <p>In ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 marzo 2011, l'intervento transita all'ARTA (B).</p> <p>Durante la riunione del 07/05/2012, si forniscono indicazioni al Comune in merito ad alcuni adeguamenti del progetto.</p> <p>L'ARTA, con nota acquisita al prot. n.1939 del 31/05/2012, trasmette al Commissario, individuato come Ente Beneficiario, tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'intervento.</p> <p>Con note prot. n. 1258 del 13/06/2012 e n.2334 del 26/06/2012, il Commissario sollecita il Comune alla trasmissione degli elaborati progettuali, adeguati alle richieste di cui alla riunione del 07/05/12.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2873 del 25/07/2012, trasmette il progetto stralcio funzionale dell'intervento di importo pari a quanto previsto dall'AdP.</p> <p>Il progetto generale è trasmesso dal Comune, sia all'ARTA (Serv. 1) che all'Ufficio del Commissario (acquisito al prot. n.2997 del 02/08/2012).</p> <p>Il RUP, in data 19/09/2012, trasmette all'Ufficio del Commissario copia dell'estratto della pubblicazione sulla G.U.R.S. n. 35 del 31.08.2012 della verifica di assoggettabilità a V.I.A.</p> <p>A seguito della CdS del 07/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari relativi al progetto generale, ad eccezione del parere dell'ARTA Serv.3, che si riserva di produrre entro 7gg il parere su problematiche attinenti il concetto di pericolosità geologica per cause profonde, per il quale si rende necessario uno studio investigativo e di monitoraggio.</p> <p>In data 14/11/2012, con nota prot.n. 4696, l'Arta (Serv. 3) esprime parere favorevole, con prescrizioni, di coerenza al PAI.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 4970 del 27/11/2012 trasmette il progetto di 1° stralcio esecutivo.</p> <p>A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri ad eccezione del parere ARTA Serv.3 che ha richiesto le integrazioni al progetto stralcio esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni per l'emissione del parere di competenza.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 1340 del 04/03/2013 trasmette gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS e in data 13/03/2013 con nota prot. n. 1571 l'ARTA Serv. 3 trasmette il parere favorevole di coerenza al PAI.</p>	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE		Comune													Arch. Armando Amico Dirigente dell'UTC	D.C. n. 556 del 24/10/2012	Geom. Nicola Giovanni Buffone (UTC Caltanissetta)			
CL	020	Serradifalco	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Progetto per lo studio ed il monitoraggio dell'area a rischio "R4" interessata da cavità sotterranee e perimetrata con il dissesto 063-25R-082 nel comune di Serradifalco (CL)	€ 1.700.000,00	€ -	<p>Nel corso della riunione del 15/09/2011 il Comitato, su proposta del Commissario, dispone la revoca del finanziamento e contestualmente incarica il Commissario della predisposizione di un piano di monitoraggio, da sottoporre all'ARTA per il relativo finanziamento a gravare sulla linea 2.3.1.3 PO FERS 2007-2013. Il Comitato si riserva la possibilità di rivalutare il progetto a seguito dell'avvenuto monitoraggio.</p> <p>Il Commissario, con nota prot 1829 del 21 set 2011, incarica INVITALIA della redazione e realizzazione del piano di monitoraggio dell'area R4 ricadente nel centro abitato del Comune di Serradifalco.</p> <p>Con nota prot n. 2360 del 27/06/2012 il Commissario affida le attività di consulenza geologica necessaria all'attività di progettazione dello studio e monitoraggio dell'intervento ad un funzionario della Struttura.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot.n.2782 del 18/07/2012, IAP trasmette gli elaborati progettuali per lo "STUDIO ED IL MONITORAGGIO DELL'AREA A RISCHIO "R4" INTERESSATA DA CAVITA' SOTTERRANEE E PERIMETRATA CON IL CODICE DI DISSESTO PAI 063-25R-082 NEL COMUNE DI SERRADIFALCO", trasmessi dal Commissario all'ARTA Serv.3 con nota prot. n. 2807 del 20/07/2012</p>	INTERVENTO REVOCATO	INVITALIA	INVITALIA										Arch. Giampiero Di Magro	D.C. n. 299 del 27.06.2012							






ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento										Stato Intervento				Stato avanzamento Intervento																	
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINALI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL						
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo									
CT	021	Acicatena	B	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Vampolieri	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	Istruttoria progetto	Progetto ancora non pervenuto												Ing. Alfio Grassi	Decreto Commissariale n. 72 del 26 mag 11							
CT	022	Bronte	A	A	Ministero		Consolidamento frana	€ 1.092.500,00	€ 1.092.500,00	<p>Con nota prot. n. 559 del 10/11/2010 il Commissario autorizza il Comune a redigere il progetto esecutivo.</p> <p>Il Comune trasmette il Progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al n. 2892 del 15/12/2011.</p> <p>A seguito di incontri e colloqui, il Commissario, con nota protocollo n. 2182 del 14/06/2012, sollecita il comune a trasmettere il progetto esecutivo, debitamente munito dei pareri e documenti economici.</p> <p>Il RUP, con nota assunta al protocollo con n. 2377 del 27/06/2012, trasmette copia del progetto esecutivo con le integrazioni richieste, già inviato dallo stesso all'ARTA Serv. 3 per il relativo parere di competenza in quanto l'area oggetto dell'intervento è stata classificata R4, giusta Decreto n. 296/41 del 04/07/2000 (prot. n. 2376 del 27/06/2012).</p> <p>In sede della Conferenza dei Servizi del 18/07/2012, essendo stati acquisiti tutti i pareri e/o atti autorizzativi per la realizzazione dell'intervento, il Comune comunica di aver già avviato le procedure espropriative, come da documentazione trasmessa con nota acquisita al prot/UC n. 195 del 11/01/13.</p>	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		COMUNE															Geom. Santo Saitta (UTC)	Decreto Commissariale n.326 del 10/07/2012	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	
CT	023	Calatabiano	A	A	Ministero	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti Lapide-Pasteria	€ 250.000,00	€ 250.000,00	<p>A seguito del Comitato del 21/10/2011 l'intervento diventa di competenza dell'ARTA, alla quale si trasmette tutta la documentazione;</p> <p>Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale.</p> <p>A seguito della rinuncia del Comune, la Progettazione viene affidata ad INVITALIA con nota prot. n.667 del 28/02/2012.</p> <p>Con nota protocollo n. 5295 del 12/12/2012 la Società Invitalia trasmette all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo.</p> <p>A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 07 febbraio 2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del parere ambientale dell'ARTA Serv. 1 VIA/VAS.</p> <p>Con nota prot. n. 2485 del 30/04/2013 L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica che non è necessario attivare le procedure ambientali ai sensi del D.Lgs. n. 152/06, poiché le opere previste non ricadono tra quelle elencate negli allegati n. III e IV del suddetto decreto.</p> <p>L'Ufficio del Commissario con nota 2705 del 10/05/2013 comunica al RUP che alla data odierna non risulta ancora pervenuto il parere dell'ARTA Serv. 3, pertanto, in ossequio ai poteri di deroga del Commissario, lo stesso si intende acquisito favorevolmente e lo invita a redigere il verbale di verifica e validazione dell'intervento.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 2930 del 20/05/2013 trasmette al Commissario la verifica e validazione dell'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 374 del 22/05/2013 viene approvato e finanziato l'intervento per un importo pari ad € 249.978,03.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 508 del 04/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Società 'G.C. COSTRUZIONI S.R.L. (ribasso percentuale del 31,7898%), in data 23/07/2013 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 619 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.</p> <p>In data 06/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale Consegnare Lavori.</p> <p>Con nota prot. n. 5457 del 16/09/2013 il RUP trasmette tutta la documentazione inerente la verifica e validazione del progetto esecutivo.</p>	AVVIATI LAVORI	INVITALIA	INVITALIA	G.C. COSTRUZIONI S.R.L.	6-ago-13	Decreto n. 374 del 22/05/2013	€ 250.000,00	€			619 - 30/07/2013	€ 189.722,07	Dott. Gaetano Cani	Decreto Commissariale n. 356 del 17/07/2012	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 29/01/2013)	Ing. Salvatore Faro					
CT	024	Castel di Iudica	A	A	Ministero		Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	<p>La progettazione è stata affidata al Comune, che con nota prot. n.984 del 23/03/2012 trasmette copia del progetto esecutivo.</p> <p>Il Comune ha attivato le procedure ambientali, al termine delle quali si è tenuta, in data 18/07/2012, la Conferenza di Servizi finalizzata ad ottenere il rilascio di tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>Il Comune, con nota prot.n. 7557 del 08.08.2012, trasmette al GC copia del progetto opportunamente modificato ed integrato, così come richiesto, ai fini del rilascio di apposito parere, dal GC di CT, con nota acquisita al prot. n. 2778 del 18/07/2012</p> <p>Con nota prot. n.3144 del 14/08/2012, l'ARTA Serv. 3 comunica di non poter esprimere il parere di competenza in quanto l'area d'intervento non ricade in zone a pericolosità identificata nel vigente PAI e per assenza di adeguata relazione idraulica per la definizione delle interferenze con le opere da realizzare.</p> <p>Le relazioni idrauliche vengono inviate all'ARTA dal Commissario con nota prot. n. 3387 del 10/09/2012.</p> <p>L'intervento viene finanziato con Decreto n. 640 del 22/11/2012 e con Decreto n.251 del 04/04/2013 viene disposta l'Aggiudicazione Definitiva a favore della ATI Mammana Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl, eredi di Anello Andrea srl che hanno offerto un ribasso percentuale pari al 29,6650%.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 492 del 28/06/2013 si provvede ad impegnare la somma di € 2.227.552,38 necessaria per la realizzazione dell'intervento.</p>	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI		COMUNE	ATI Mammana Michelangelo, Pettinato Costruzioni srl		n. 640 del 22/11/2012	€ 3.000.000,00	€			Decreto n. 490 del 27/06/2013	€ 2.227.552,38	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto Commissariale n.476 del 24/06/2013	Geom. Domenico Faranda						
CT	025	Giarre	A	A	Ministero		Opere di regimazione idraulica e consolidamento versanti - Fraz. S. Maria la Strada	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	<p>Il Comune, con nota prot. 2823/UC del 7/12/2011, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, trasmette il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071/UC del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti.</p> <p>Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti interessati.</p> <p>Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2136/UC del 12.06.2012, adempimento cui il Comune attempa, informandone il Commissario con nota prot. n. 4024 del 12/10/12 e fornendo successivamente, con nota prot. n. 5159/UC del 6/11/12, i chiarimenti richiesti dall'ARTA Serv. 1 VAS/VIA. L'avviso pubblico per la consultazione degli elaborati progettuali relativamente alla verifica ambientale è stato pubblicato sulla GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS con nota prot. n. 5085 del 28/08/2013 comunica al Comune che l'intervento non necessita della procedura di assoggettabilità ambientale.</p> <p>Con nota prot. n. 5372 del 10/09/2013 il RUP chiede ai progettisti di procedere alla validazione del progetto avendo già ottenuto tutti i pareri necessari, al fine di consentire l'emissione del Decreto Commissariale di finanziamento e la relativa gara d'appalto.</p>	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE		COMUNE				€	€						Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della 111A Area	Decreto Commissariale n. 294 del 25/06/2012	Ing. Antonino Cancelliere					



ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento								Stato Intervento		Stato avanzamento Intervento																			
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL				
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo	n. e data		importo								
CT	026	Giarre	A	A	Ministero		Realizzazione di un canale di gronda per la captazione delle acque a monte del centro abitato di Giarre - Zona Codavolpe	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	<p>Il Comune, con nota prot. 2824 del 7/12/2011, trasmette, alla luce delle determinazioni del Tavolo Tecnico del 17/11/2011, il progetto adeguato ed integrato con le modifiche richieste, ivi compreso l'inserimento di un progettista qualificato per l'acquisizione del parere di coerenza al PAI.</p> <p>L'ARTA Serv. 3, con nota prot. n. 1071 del 29/03/2012, informa il Comune che non può rilasciare il parere di competenza, restando a disposizione per ulteriori chiarimenti. Nella Conferenza dei Servizi del 13/06/2012 vengono acquisiti pareri degli enti.</p> <p>Il Commissario invita il Comune ad attivare la procedura di Verifica di Assoggettabilità Ambientale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, così come richiesto dal Servizio 1 VAS/VIA dell'ARTA con nota prot. n. 2135/UC del 12.06.2012, prescrizione cui il Comune ottempera, informandone il Commissario con nota prot. n. 4026/UC del 12/10/12. Le pubblicazioni sono state effettuate sullo GURS n. 41 parte II del 12/10/2012.</p> <p>L'ARTA Serv. 1 VIA/VAS comunica con nota acquisita al prot. n. 4811 del 20/11/2012 che il progetto non deve essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 del D.Lgs. 152/2006, dettando tuttavia delle prescrizioni.</p> <p>Il Comune, con nota prot. n. 5257/UC del 11/12/2012 trasmette il progetto esecutivo. Con Decreto n. 695 del 13/12/2012 il Commissario approva e finanzia l'intervento per un importo pari a € 1.000.000,00.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 270 del 11/04/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della società Operae srl che ha offerto un ribasso percentuale pari ad € 30,2283%.</p> <p>Con Decreto n. 444 del 14/06/2013 vengono impegnate le somme per un importo pari ad € 734.344,35.</p>	AVVIATI LAVORI	-	COMUNE	-	Soc. Operae srl	17-mag-13	Decreto n. 695 del 13/12/2012	€ 1.000.000,00	€ -	Decreto n. 446 del 14/06/2013	€ 734.670,35	Geom. Sebastiano D'Anna Capo Servizio Progettazione della 11A Area	Decreto Commissariale n. 293 del 25/06/2012	Ing. Enrico Foti	Ing. Leonardi Giuseppe Rita				
CT	027	Grammichele	A	A	Ministero		Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Completamento consolidamento del versante ed opere di sostegno della scarpata sottostante la via B.Buozzi	€ 700.000,00	€ 700.000,00	<p>La progettazione è stata affidata al Comune che trasmette il progetto esecutivo nell'aprile del 2011. Da una prima visione del progetto sono emerse delle criticità.</p> <p>Con nota prot. n. 1870 del 28/05/2012 il Commissario ha richiesto un adeguamento del progetto, rielaborato con integrazioni richieste.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot.n. 2120 del 11/06/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato con le integrazioni richieste.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 10/07/2012 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, tra i quali il parere dell'ARTA serv 3 che prescrive un piano di monitoraggio dell'intervento.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4875/UC del 22/11/2012, trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza dei Servizi.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012 è stato finanziato l'intervento.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 27 del 15/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della GLOBALGEO S.R.L. che ha offerto un ribasso percentuale del 23,7999 % ed il contratto è stato stipulato in data 10/04/2013.</p> <p>In data 24/06/2013 sono stati avviati i lavori.</p>	AVVIATI LAVORI	-	COMUNE	-	GLOBALGEO S.R.L.	24/06/2013	Decreto Commissariale n. 684 del 10/12/2012	€ 700.000,00	€ -	Decreto Commissariale n. 303 del 19/04/2013	€ 549.978,26	Geom. Michele Iudica UTC	Decreto Commissariale n.325 del 10/07/2012	Ing. Rossella Zumbà (FINO AL 29/01/2013)	Ing. Biagio Ventura				
CT	028	Licodia Eubea	B	B*	Regione		Consolidamento Via Duca degli Abruzzi	€ 880.000,00	€ 880.000,00	<p>La progettazione è in capo al Comune.</p> <p>Con nota prot. n.2293/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario, in quanto Ente Beneficiario il progetto, la documentazione tecnica e amministrativa relativa all'intervento, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario.</p> <p>Con nota prot. n. 3442/UC del 12/09/2012, il Comune trasmette al Commissario copia del verbale di sopralluogo congiunto con il DRPC CT ed il GC CT, in cui si considera prioritario l'intervento sul "Versante Duca degli Abruzzi".</p> <p>Con nota protocollo n. 5073 del 03/12/2012, il RUP trasmette il progetto esecutivo aggiornato. In sede di CdS del 19/12/2013 vengono acquisiti tutti i necessari pareri, tranne quello dell'ARTA serv. 3 che il Commissario, con nota prot. n. 409 del 22/01/13, considera comunque acquisito positivamente, stante la mancata ricezione nel termine assegnato di 7 gg.</p> <p>Il Comune, con nota protocollo n. 90 del 08/01/2013, trasmette la documentazione integrativa richiesta in sede di CdS del 19/12/2013.</p> <p>Il RUP con nota prot. n.912 del 12/02/2013 trasmette il verbale di verifica e validazione dell'intervento.</p>	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	-	COMUNE	-	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	-	Arch. Salvatore Lentini	Decreto Commissariale n. 587 del 07/11/2012	Sig.ra Stefania Vallone						
CT	029	Maniace	B	B	Regione		Consolidamento Sponda sinistra T.te Martello	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Progetto ancora non pervenuto. In attesa procedure ambientali.	Progetto ancora non pervenuto																		
CT	030	Maniace	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di regimazione idraulica e consolidamento delle scarpate - C/da Galatée-Petrosino	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 38 del 31/01/2013	Intervento finanziato																		
CT	031	Misterbianco	A	A	Ministero		Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Poggio Lupo	€ 500.000,00	€ 500.000,00	<p>A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 249 del 03/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il Contratto è stato stipulato il 15/11/2011. I lavori sono stati consegnati il 7/11/2011 e sono stati ultimati in data 25/05/2012.</p> <p>Durante lo svolgimento delle attività si è resa necessaria una Perizia di Variante e Suppletiva e di conseguenza una rimodulazione del quadro economico dell'intervento. Il Commissario ha preso atto della perizia con Decreto Commissariale n. 371 del 18/07/2012. Con Decreto n. 494 del 26/09/2012 è ulteriormente modificato il D.E. a seguito dell'impegno della somma aggiuntiva di € 1.157,59 relativo alla voce B/5 (Collaudo Statico e prove su materiali).</p> <p>Con nota protocollo n. 3036 del 03/08/2012 l'ing. Giovanna Baratta trasmette la relazione-certificata di collaudo statico.</p> <p>A seguito dell'invito del Commissario a relazionare sull'attività svolta, di cui alla nota prot. n. 4792 del 19/11/12, il RUP Espropri comunica, con nota n. 5355 del 14/12/12, di aver eseguito lo stato di consistenza ed occupazione temporanea delle aree oggetto di espropriazione nonché di aver calcolato l'indennità di espropriazione, di occupazione e di servitù da corrispondere ai proprietari delle aree espropriate</p>	LAVORI ULTIMATI	DRPC	DRPC CT (Dott. Aldo Bonina, Arch. Fabio Borzi, Arch. Paolo Licandri)	SGM srl	Pippo Pizzo	7-nov-2011	Decreto Commissariale n. 130 del 13/7/2011	€ 500.000,00	€ -	Decreto Commissariale n. 331 del 21/11/2011 come modificato dal Decreto n. 371 del 18/07/2012	€ 387.388,21	Dott. Aldo Bonina(DRPC)	nota n. 53823 del 14.12.2010	Ing. Gioacchino Marino Geom. Antonino Sciuto	Arch. Fabio Borzi(DRPC) Arch. Paolo Licandri				
CT	032	Motta Sant'Anastasia	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato: Area Nord Est	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG.n. 440 del 09/08/2012	Intervento finanziato																		
CT	033	Piedimonte Etneo	A	A	Ministero		Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Fraz. Presa	€ 500.000,00	€ 500.000,00	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di CT che ha trasmesso il progetto in data 22/08/2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 303 del 03/11/2011 è stato disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il Contratto è stato stipulato in data 18/01/2012.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 25/12/2012 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto, era fissata entro il 22/07/2012; tuttavia, con nota acquisita al prot. n. 2921 del 31/07/2012, il DRPC di Catania ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva redatta dal direttore dei lavori ed il parere favorevole del RUP.</p> <p>Con nota prot. n. 3014 del 02.08.2012, il Dirigente del Servizio del DRPC di Catania ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia degli Ordini di Servizio del Direttore Lavori e del Verbale di Consegna della Perizia di Variante e Suppletiva n.1, approvato con Decreto Commissario n. 409 del 02/08/2012.</p> <p>Con nota prot. n. 3265/UC del 30/08/2012, il RUP comunica l'ultimazione dei lavori, come accertato dal direttore dei lavori in data 09/08/2012.</p> <p>Il DRPC CT con nota prot. n. 5141 del 30/08/2013 trasmette la documentazione inerente lo Stato Finale e l'attestazione e certificato di regolare esecuzione.</p>	LAVORI ULTIMATI	DRPC	DRPC CT	GEOMERIS srl	ARCHAS s.r.l.	25-gen-2012	Decreto n. 265 del 07/10/2011	€ 500.000,00	€ -	Decreto n. 36 del 25/01/2012	€ 402.969,16	Dott. Aldo Bonina (DRPC)	Prot. N. 54711 del 20/12/2010	Ing. Gioacchino Marino Geom. Antonino Sciuto	Ing. Gioacchino Marino				



ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento									Stato Intervento		Stato avanzamento Intervento																								
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINALI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL										
													impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo															
CT	034	Raddusa	A	A	Ministero		Opere di consolidamento del versante	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 27/07/2011. Il Commissario, con nota prot. 2277 del 26/10/2011, ha invitato il RUP a trasmettere all'ARTA la documentazione progettuale, al fine di avviare le procedure VIA/VAS. Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 300/UC del 23/12/2011, ha ritenuto necessaria l'attivazione delle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/06, richiedendo la necessaria documentazione. A seguito della Conferenza dei Servizi del 26/06/2012, vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione per il parere dell'ARTA Serv.1 VIA/VAS che attende dei chiarimenti sulle scelte progettuali, nonché dell'isp. Ripartimentale delle Foreste di Catania. Il Servizio 1 dell'ARTA, con nota assunta al prot. n. 2882/UC del 26/07/2012, ha comunicato la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 152/06, esprimendo dubbi sulle scelte progettuali. Il Comune, ritenuto pertanto di dover modificare le scelte progettuali precedentemente adottate, ha chiesto, con nota acquisita al prot. n. 3254 del 29/08/2012, l'autorizzazione ad affidare all'esterno gli incarichi di progettazione, studio geologico, indagini geognostiche e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Il Commissario, con nota prot. n. 3380 del 10/09/2012, ha concesso la relativa autorizzazione, successivamente revocata, con nota prot. n. 302/UC del 17/01/13, limitatamente all'incarico di progettazione, affidato invece, in forza della convenzione del 18/02/2011, ad Invitalia. Quest'ultimo incarico viene a sua volta revocato dal Commissario, con nota prot.482 del 23/01/13, in considerazione della nota del Comune, assunta al prot. n. 457/UC del 22/01/13, di comunicazione dell'avvenuto avvio delle procedure di affidamento dei servizi tecnici. Il RUP con nota prot. n. 2418 del 24/04/2013 comunica al Commissario che ha invitato il Capogruppo della R.T.P. a presentare nel più breve tempo possibile tutta la documentazione per la stipula del disciplinare d'incarico e che allo stesso saranno assegnati come da disciplinare trenta giorni di tempo per ottemperare alla progettazione esecutiva. Con nota prot. n. 3090 del 24/05/2013 il Comune trasmette al Commissario il Progetto Esecutivo. Il Commissario convoca una Cds per il giorno 04/06/2013 al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	-	Comune	-	-	-	-	€	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geom. Roberto Antonio La Mastra	Decreto Commissariale n. 292 del 25/06/2012	Ing. Federica Bottini	-
CT	035	Raddusa	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Trincea drenante a monte del centro abitato e paratie di pali	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 158 del 9/3/2012 per un importo di euro 2.389.815,78. I lavori sono stati aggiudicati dalla Consorzio Stabile Infrastrutture Meridionali che ha offerto un ribasso del 22,5624.	Affidamento Lavori	-	-	-	-	-	-	158 9-mar-12	€ 2.389.815,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
CT	036	Ramacca	A	A	Ministero		Opere di consolidamento e regimazione acque nel centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	La progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 224 del 14/09/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini Preliminari alla progettazione. A seguito della restituzione delle risultanze delle indagini, con nota acquisita al prot.n. 95 del 16/01/2012, la Soc. INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 89 del 01/03/2012. Con Decreto n. 125 del 26/03/2012 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori. In data 02/04/2012 si è emesso Decreto per l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree interessate dall'intervento. Il contratto è stato firmato in data 10/05/2012 e i lavori hanno avuto inizio in data 08/06/2012. Con Decreto n. 458 del 12/09/2012 si è preso atto della Perizia di Variante n. 1 migliorativa ed in diminuzione. A seguito di comunicazione del RUP in merito ad uno smantellamento della parte superficiale del terreno con fuoriuscita di acqua di ignota provenienza, il Commissario, con nota prot. n. 4532 del 04/07/2012, ha richiesto ad Invitalia di predisporre un piano di indagini integrative, successivamente acquisito al prot. n.2553 del 09/07/2012. Le indagini integrative sono state affidate dal RUP al Dott. Domenico Baso, come comunicato con nota acquisita agli atti al prot. n. 3055 del 06/08/2012. A seguito dell'espletamento delle indagini, così come attestato dal RUP con nota prot. 5292/UC del 12/12/12, e dalla nota tecnica integrativa del Geologo Dott. Baso, dallo quale si ravvisa "la necessità e l'urgenza di interventi mirati a stabilizzare il pendio ed evitare danni", il Comune ha chiesto, con nota prot. 4602/UC del 8/11/12, di utilizzare le economie risultanti dal ribasso d'asta per la risoluzione della problematica. Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4670 del 13/11/2012, ha trasmesso copia della perizia di variante e suppletiva n. 2, di cui il Commissario ha preso atto con D. C. n. 610 del 15/11/2012. Con nota prot. 525 del 11/12/12 il Commissario ha invitato il Comune a presentare un progetto preliminare, con la quantificazione delle spese, per trasmetterlo al Comitato di Indirizzo e Coordinamento ai fini di un'eventuale riprogrammazione delle risorse residue dei lavori. I lavori - sospesi come da verbale del 19/12/2012, a causa dello spostamento, da parte dell'ENEL, dell'impianto di media tensione - sono stati rioresi il 15/01/2013, come da relativo verbale, trasmesso dal Comune. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24/11/2011 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 29/11/2011. La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto era fissata entro il 18/04/2012. A seguito dei verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata, con possibili ripercussioni sul buon andamento dei lavori, è emersa la necessità di una Perizia di Variante e suppletiva, trasmessa dal DL con nota prot. 1387/UC del 23/04/2012, per la cui approvazione si è tenuta apposita Conferenza dei Servizi in data 16.05.2012. La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.236 del 24/05/2012 ed a seguito della rimodulazione dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori, il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al 09/09/2012. I lavori si sono conclusi in data 07/09/2012. Il RUP Ing. Domenico Imbroglia, a seguito della nota del Comune prot/UC n. 3719 del 27/09/2012, di segnalazione di alcune carenze circa la corretta e completa esecuzione dei lavori, ordina, con nota prot. 3882 del 5/10/12, ulteriori lavori, concedendo altri 15 gg., in aggiunta a quelli concessi dal D.L. nel certificato di ultimazione lavori del 12.09.2012.	LAVORI ULTIMATI	INVITALIA	INVITALIA	LGE M. INDAGINI GEOLOGICHE MERIDIONALI s.r.l.	CO.E.S.I srl	8-giu-2012	Decreto Commissariale n. 89 del 01/03/2012	€ 1.176.008,88	€ 23.991,12	Decreto Commissariale n. 458 del 12/09/2012	€ 951.340,42	Geom.Salvatore Sottosanti (UTC)	Decreto Commissariale n.136 del 20/07/2011	Ing. Federica Bottini Rag. Domenica Patricia Arcidiacono	Ing. G. Coroneo										
CT	037	Randazzo	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 960.000,00	€ 960.000,00	A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 333 del 24/11/2011 è stata disposta l'Aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 29/11/2011. La consegna dei lavori è avvenuta il 20/12/2011 e la data di ultimazione degli stessi, come da contratto era fissata entro il 18/04/2012. A seguito dei verificarsi di fenomeni di esondazione del torrente Annunziata, con possibili ripercussioni sul buon andamento dei lavori, è emersa la necessità di una Perizia di Variante e suppletiva, trasmessa dal DL con nota prot. 1387/UC del 23/04/2012, per la cui approvazione si è tenuta apposita Conferenza dei Servizi in data 16.05.2012. La PVS viene approvata con Decreto Commissariale n.236 del 24/05/2012 ed a seguito della rimodulazione dei tempi previsti per la realizzazione dei lavori, il nuovo termine di ultimazione è stato fissato al 09/09/2012. I lavori si sono conclusi in data 07/09/2012. Il RUP Ing. Domenico Imbroglia, a seguito della nota del Comune prot/UC n. 3719 del 27/09/2012, di segnalazione di alcune carenze circa la corretta e completa esecuzione dei lavori, ordina, con nota prot. 3882 del 5/10/12, ulteriori lavori, concedendo altri 15 gg., in aggiunta a quelli concessi dal D.L. nel certificato di ultimazione lavori del 12.09.2012.	LAVORI ULTIMATI	-	COMUNE	-	COTESP SRL	consegna lavori 20 dicembre 2011	197 - 23/8/2011	€ 960.000,00	€	83 del 27/02/2012	€ 765.181,07	Ing. Domenico Imbroglia	Decreto Commissariale n. 363 del 5 dicembre 2011	Ing. Marco Calogero (FINO AL 29/01/2013)	Ing. Antonino Romano										
CT	038	Santa Venerina	B	B*	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Badia-T. Fago	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita al protocollo al n. 2294 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnica/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con Decreto Commissariale n. 862 e 863 del 14/10/2013 vengono acquisite la progettazione esecutiva e lo studio geologico.	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	-	COMUNE	-	-	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	0								
CT	039	Sant'Agata Li Battiati	B	B*	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato: Loc. Leucatia - Via Einaudi	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita al protocollo al n. 2290 del 22/06/2012 l'ARTA Serv. 3 trasmette al Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnica/amministrativa relativa all'intervento ed invita il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con nota prot. n.3089 del 24/05/2013 l'ing. Pietro Agnello trasmette al Commissario il progetto esecutivo. I progettisti trasmettono le integrazioni al piano di sicurezza richieste in sede di Cds tenutasi in data 04/06/2013, pertanto sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	-	COMUNE	-	-	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	-	-	-	-	-	-	Ing. Adele Giusto	Decreto n. 314 del 07/05/2013	0						
CT	040	Trecastagni	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 460.000,00	€ 446.849,79	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 251 del 18/4/2011 per un importo di euro 446.849,79. Le procedure di gara sono concluse e l'aggiudicazione è avvenuta il 12/12/2011 con un ribasso del 24,0415%. Il contratto è stato sottoscritto in data 24/04/2012 e i lavori sono stati avviati il 03/05/2012	Avviati Lavori	-	-	ATI Conticello Luigi-Rinaudo Costruzioni	3-May-12	N. 25 DEL 18/04/2011	€ 446.849,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
CT	176_Int	Sant'alfio	B	B	Regione	AdP Integrativo	Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00	Progetto non pervenuto	AdP Integrativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento							Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																		
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL			
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo						
CT		Castel di Iudica	-	_B*	Regione		Lavori di consolidamento a salvaguardia del centro abitato	€ 900.000,00	€ -	La progettazione è stata redatta dal Comune. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2291/UC del 22/06/2012, l'ARTA Serv. 3 trasmette all'Ufficio del Commissario, in quanto Ente Beneficiario, il progetto, e la relativa documentazione tecnico/amministrativa, invitando il Comune a raccordarsi con l'Ufficio del Commissario. Con nota acquisita al prot. n. 273/UC del 16/01/2013, il RUP chiede al Commissario l'indizione della CdS. Considerato che durante la CdS del 07/03/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari, il Commissario con nota prot. n.2330 del 19/04/2013 trasmette all'ARTA Serv. 3 tutta la documentazione amministrativa e l'unico progetto trasmesso, per la definizione dell'iter di finanziamento dell'intervento.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	-	COMUNE	-	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	-	Geom. Domenico Faranda	Determina Sindacale n. 06 del 29/02/2012	-	-	-	-	-	-
EN	041	Barrafranca	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Mitigazione del rischio zona Bivio Catena	€ 1.500.000,00	€ 1.608.973,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 289 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.608.973,06.	Intervento finanziato						N. 289 DEL 03/05/2011	€ 1.608.973,06				arch. Francesco Costa						
EN	042	Centuripe	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Completamento consolidamento pendici ad Est di M. Calvario	€ 770.000,00	€ 770.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune di Centuripe ad un professionista esterno. Con nota acquisita al prot. n. 1438 del 26/04/2012, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 26/09/2012 il Commissario, con nota prot. n. 3937 del 09/10/2012, invita il RUP a porre in essere le attività necessarie all'approvazione del progetto, propedeutiche all'emissione del Decreto di Finanziamento. Con nota 4881 del 22/11/2012 il RUP trasmette il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione delle verifiche antecedenti l'avvio delle procedure di scelta del contraente. Con Decreto Commissariale n. 692 del 12/12/2012 è stato finanziato l'intervento. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 263 del 08/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa C.S. COSTRUZIONI S.r.l. che ha offerto un ribasso del 30,0897 %. In data 24/05/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito in 181 giorni naturali e consecutivi, cosicché l'ultimazione dovrà avvenire entro il 20/11/2013. Con Decreto Commissariale n. 542 del 10/07/2013 si impegnano le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 538.087,00. Con nota prot. n.6668 del 07/11/2013 l'Impresa C.S. Costruzioni srl comunica che in data 06 novembre 2013 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.	LAVORI ULTIMATI		COMUNE	C.S. COSTRUZIONI S.r.l.	24-mag-2013	n. 692 del 12/12/2012	€ 770.000,00	€ -	Decreto n. 542 del 10/07/2013	€ 598.087,00	Geom. Salvatore Di Benedetto	D.C. n. 385 del 24/07/2012	Ing. Mario Giuseppe Palazzolo	Ing. Claudio Farana				
EN	043	Gagliano Castelferrato	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.560.000,00	€ 1.557.285,46	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 235 del 13/4/2011 per un importo di euro 1.557.285,46. La gara è stata indetta in data 19/09/2011, a seguito dell'espletamento delle procedure i lavori sono stati affidati al CONSORZIO ESSEGI con il quale è stato stipulato il contratto in data 16/04/2012	Contratto stipulato							N. 235 DEL 13/04/2011	€ 1.557.285,46									
EN	044	Gagliano Castelferrato	A	A	Ministero		Lavori di messa in sicurezza e drenaggio del versante - C.da Urga	€ 800.000,00	€ 800.000,00	La progettazione dell'intervento è stata affidata ad INVITALIA S.p.A. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 141 del 22/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione Definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione. A seguito sia della consegna delle risultanze delle indagini geognostiche che dei successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici incaricati della progettazione e dalle osservazioni formulate del geologo, l'area di intervento è risultata essere notevolmente più estesa rispetto a quanto previsto dal PAI in prima istanza. Alla luce delle criticità emerse, con nota del Commissario n. 2440 del 09/11/2011, sono state autorizzate ulteriori indagini preliminari integrative delle precedenti, affidate a seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 361 del 02/12/2011. Il Progetto esecutivo è stato trasmesso da INVITALIA con nota acquisita al prot. n. 779 del 09/03/2012. In sede di Conferenza dei Servizi del 19/03/2012, in cui sono stati acquisiti i pareri degli Enti interessati, è emerso che gli importi stimati nel progetto esecutivo risultano superiori a quelli contenuti nell'Accordo di Programma. La problematica è stata discussa in sede di Comitato del 18/05/2012 che si è riservato di valutarla nella futura programmazione. A seguito delle determinazioni del Comitato potranno essere avviate le procedure di gara. Il Comune trasmette la nota prot. n. 42660 del 19/07/2012 dell'ARTA Serv. 3 in cui viene modificato l'assetto idrogeologico relativo ai dissesti di C.da Fontanelle-Urga portandoli da PO a P3, inoltrata dal Commissario, con nota prot. n. 3067 del 07.08.12, al Comitato di Indirizzo e Controllo del Ministero. Al fine di risolvere le problematiche relative all'intervento l'ARTA Serv. 3, invita il Comune il DRPC e l'ufficio del Commissario a partecipare alla riunione che si terrà il giorno 08/10/2013 presso i propri uffici.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA		INVITALIA	INVITALIA				€ -	€ -			Geom. Michele Corrente	Decreto Commissariale n. 90 del 14.6.2011	Arch. Diego Mammo Zagarella				
EN	45_1	Leonforte	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante scuola Verga	€ 200.000,00	€ 400.000,00	Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralzo relativo alla scuola Verga.	Progetto ancora non pervenuto																	
EN	45_2	Leonforte	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Lavori di consolidamento e messa in sicurezza Monte Cernigliere - Zona soprastante la via Trieste	€ 200.000,00	€ -	Progetto ancora non pervenuto Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ è stato suddiviso in 2 stralci (scuola Verga / via Trieste) e si è deciso di accogliere la richiesta del Comune di finanziare solo lo stralzo relativo alla scuola Verga.	Progetto ancora non pervenuto																	
EN	046	Piazza Armerina	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi nel quartiere Itria	€ 1.130.000,00	€ 1.130.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 27 del 2/2/2011 per un importo di euro 1.130.000. I lavori sono stati affidati alla Consorzio Galle S.c.a.r.l. - Esec. Kimiso costr. S.r.l. I lavori hanno avuto inizio il 5 settembre 2011 e sono stati conclusi il 27/10/2012	LAVORI ULTIMATI					Impresa DG Di Giovanna Costruzioni srl	5-set-2011	N. 27 DEL 02/02/2011	€ 1.130.000,00									
EN	047	Regalbuto	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Il progetto dell'intervento è stato redatto da professionisti esterni incaricati dall'Amministrazione Comunale di Regalbuto (EN). A seguito di richiesta del Commissario, in data 7/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina, prevedendo l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. Con Decreto Commissariale del 01/08/2012 è stato acquisito il progetto dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3361 del 07/09/2012, il gruppo di progettazione ha trasmesso gli elaborati integrativi redatti in aderenza alle prescrizioni richieste dall'ANAS in sede di CdS del 24/08/2012. Il Comune con nota prot. n. 4940 del 26/11/2012 ha trasmesso il Verbale di Verifica e Validazione dell'intervento. Con Decreto Commissariale n. 30 del 16/01/2013 è stato finanziato l'intervento. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 262 del 08/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore del CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Societa' Cooperativa che ha offerto un ribasso pari al 32,1923 %. Il Commissario con nota prot. n. 5558 del 17/09/2013 chiede al comune di indicare un nominativo di un tecnico interno al proprio UTC o cui potere affidare l'incarico di responsabile per le procedure esproprie. Con Decreto n. 771 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI		COMUNE	CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC Societa' Cooperativa			Decreto n.30 del 16/01/2013	€ 1.453.710,54	€ 46.289,46	Decreto n. 771 del 25/09/2013	€ 1.097.217,01	Arch. Vito Palazzolo (Responsabile area tecnica)	Decreto Commissariale n. 355 del 17/07/2012	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Ing. Giglio Ignazio Pio Aldo			



ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento						Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																			
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL			
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo						
EN	175	Barrafranca	A	A	Ministero	COMITATO 24 MAR 2011	Mitigazione rischio idrogeologico (zona a monte dell'intervento già finanziato con Accordo di Programma del 30 marzo 2010)	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	<p>La progettazione degli interventi è stata affidata dal Comune di Barrafranca a tecnici professionisti esterni.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 425 del 05/04/2011, il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo per un importo complessivo di € 1.930.000,00 e quindi per un importo superiore a quanto stanziato dall'APQ (€ 1.500.000,00).</p> <p>Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 743 del 25/05/2011, una stralcia funzionale esecutivo di importo pari a quello dell'Accordo di Programma, che però risulta redatta ai sensi di normativa obsoleta, così come evidenziato dal Commissario con nota prot. 1436 del 05/08/2011. Il progetto esecutivo, rimodulato ai sensi della vigente normativa, è stato trasmesso dal Comune, con nota acquisita al prot. n. 2117 del 18/10/2011, e finanziato dal Commissario con Decreto n. 352 del 05/12/2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 10 del 16/01/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, della durata di 357 giorni naturali e consecutivi, avviati in data 23/03/2012.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 1977 del 04/06/2012, il D.L. comunica che in data 22/05/2012 sono stati sospesi i lavori.</p> <p>In riscontro alla nota prot. n. 3107 del 09/08/2012 in cui il Commissario chiede di notiziare in merito allo stato di avanzamento dell'intervento, il RUP ha sollecitato, con nota acquisita al prot. n. 3180 del 23/08/2012, la DL a produrre apposita perizia di variante al fine di consentire la ripresa dei lavori.</p> <p>In data 17/10/2012 il DL, con nota assunta al prot. n. 4135 in pari data, ha trasmesso la Perizia di Variante in corso d'opera del 1° Stralcio Funzionale.</p> <p>In data 11/12/2012 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, in cui sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi necessari alla realizzazione degli interventi previsti nella perizia di variante e suppletiva.</p> <p>Il Comune con nota prot. n. 1014 del 18/02/2013 trasmette il parere tecnico n. 1 del 07/02/2013 di approvazione della perizia di variante già anticipata via email.</p> <p>In data 26/08/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Ripresa dei Lavori.</p>	AVVIATI LAVORI	-	COMUNE	SOCIETA' LAVORI PUBBLICI S.L.P. Srl	23-mar-2012	352 - 5/12/2011	€ 1.500.000,00	€ -	245 - 28/05/2012	€ 1.208.482,15	Arch. Francesco Costa	Decreto Commissariale n. 335 del 28.11.2011	geom Nicolicchia e geom Ferrante	Arch. Salvatore La Terra				
ME	048	Alcara Li Fusi	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento costone roccioso sovrastante Centro Abitato	€ 1.880.000,00	€ 1.880.000,00	<p>L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 485 del 19/7/2010 per un importo di euro 1.880.000,00. I lavori sono stati aggiudicati in data 31/11/2011 all'impresa Sidoti Costruzioni Srl- che ha offerto un ribasso del 53,731% . I lavori sono stati consegnati in data 07/03/2012</p>	Avviati Lavori				Sidoti Costruzioni Srl-	7-mar-2012	N. 485 DEL 19/07/2010	€ 1.880.000,00										
ME	049	Alcara Li Fusi	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Consolidamento aree, ripristino scoli e canali esistenti con regimentazione acque - C.da Cappuccini	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	<p>La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011.</p> <p>A seguito di procedure di gara, con Decreto n. 104 del 27.06.2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari ad oggi concluse. Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 10.10.2011 e finanziato con Decreto n. 392 del 20.12.2011.</p> <p>A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 18 del 18/01/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>La consegna dei lavori è avvenuta in data 13.04.2012.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2888 del 26/07/2012 il Comune ha chiesto di riutilizzare le economie per estendere l'area di intervento.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4215 del 22/10/2012, il D.L. certifica l'ultimazione lavori, avvenuta in data 13/10/2012.</p> <p>Con nota prot. n. 5266 del 11/12/2012 il D.L. ha trasmesso al Collaudatore amministrativo e statico la relazione o strutture ultimate e tabulato con le prove di carico sui pali di fondazione.</p>	LAVORI ULTIMATI	INVITALIA	INVITALIA	S.G.M. Srl	13/04/2012	392 - 20/12/2011	€ 834.921,87	€ 365.078,13	366 - 17/07/2012	€ 677.774,45	Ing. Basilio Sanseverino (UTC)	Decreto Commissariale n. 77 del 30 mag 2011	Geom Salvatore Bontempo (UTC)	Arch. Fabio Pulizzi				
ME	050	Ali	B	B	Regione		Opere di salvaguardia centro abitato	€ 900.000,00	€ 900.000,00	<p>Intervento finanziato con D.D.G 161 del 12/03/2012</p>	Intervento finanziato					N. 161 del 12-mar-12	€ 843.098,81											
ME	051	Ali Terme	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	€ 900.000,00	€ 1.321.010,50	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina che ha trasmesso il progetto in data 14/11/2011.</p> <p>In sede di Conferenza Servizi del 18/11/2011, il DRPC comunica che - a seguito delle prescrizioni dettate dal GC di Me sul progetto, delle indagini geognostiche e della nuova normativa sismica - il progetto generale ha un costo pari a circa 3.073.000 euro. Il Commissario invita il DRPC a valutare l'opportunità di redigere uno stralcio funzionale rientrante nell'importo previsto in AdP di euro 900.000.</p> <p>Con nota prot. n. 3045 del 31/12/2011 il DRPC trasmette lo stralcio funzionale del progetto esecutivo, rappresentando l'impossibilità di rimodulare il progetto per un importo inferiore ad euro 1.321.010,50.</p> <p>Con nota prot. n. 223 del 25/01/12, il Commissario trasmette la documentazione relativa allo stralcio funzionale al Comitato di Indirizzo e Controllo, che, nel corso dell'incontro del 18/05/2012 dispone l'incremento dei fondi per l'intervento pari a € 421.050,50, come richiesto dallo stralcio funzionale presentato dal DRPC.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 1091 del 02/04/2012, il DRPC trasmette la documentazione inerente il piano di indagini per "Adeguamento del tombino di convogliamento acque". Il MATTM invita RFI ed ANAS ad interfacciarsi con il Commissario per la problematica dei tombini, ed il Commissario, non avendo avuto riscontro, sollecita gli stessi direttamente con nota prot. n. 2409 del 28/06/2012 e nota prot.n. 4720 del 15/11/2012.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 5042 del 30/11/2012, la Direzione Commerciale ed Esercizio di rete di RFI comunica l'avvenuto inoltro delle richieste all'ufficio RFI competente.</p>	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI		DRPC				€ -	€ -							Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	CONVENZIONE DRPC ME		
ME	052	Basicò	A	A	Ministero	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011	Drenaggi e opere di convogliamento - C/da Badiazza	€ 300.000,00	€ 1.300.000,00	<p>La progettazione è stata affidata dal Comune a progettista esterna con Determina Sindacale n.22 del 28.04.2012.</p> <p>A seguito dell'acquisizione e della validazione del progetto esecutivo trasmesso, con Decreto n. 65 del 14.02.2012, si è finanziato l'intervento, e con il successivo Decreto n. 128 del 26.03.2012 si è disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Il contratto è stato firmato in data 04/04/2012.</p> <p>I lavori sono stati avviati in data 30/05/2012 e l'ultimazione dovrà avvenire entro il 29/05/2013.</p> <p>In data 21/12/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori n. 1, ed in data 10/04/2013 sono stati ripresi gli stessi.</p> <p>La I.Co.Li. di Li Destri, aggiudicataria dei lavori, in data 19/06/2013 con nota prot.n. 3715, comunica l'ultimazione dei lavori.</p>	LAVORI ULTIMATI		Dott. Ing. Renato Cilona (Figura esterna)		I.Co.Li di Li Destri	30-mag	65 - 14/02/2012	€ 1.291.603,12	€ 8.396,88	698 - 13/12/2012	€ 1.046.941,73	Arch. Giuseppe Trifilò (UTC)	Decreto Commissariale n. 324 del 15/11/2011	Ing. Giuseppe La Placa	Ing. Renato Cilona			
ME	053	Brolò	A	A	Ministero		Opere di consolidamento e regimazione idraulico - C.da Jannello	€ 3.630.000,00	€ 3.630.000,00	<p>La progettazione esecutiva è stata affidata dal Comune all'UTC con Delibera di G.M. n. 174 del 06.12.2010.</p> <p>Con nota 9225 del 16.06.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. Con atto n. 113/L.PP. del 23.01.2012 l'UTC ha nominato un nuovo progettista, che ritiene di dover apportare modifiche al progetto, chiedendo la nomina di un Ingegnere Geotecnico di supporto alla progettazione.</p> <p>L'Ufficio del Commissario, con Decreto Commissariale n.47 del 06.02.2012, nomina il RUP e, con nota prot.n.343 del 06.02.2012, l'Ingegnere Geotecnico da affiancare al progettista.</p> <p>Il progetto rivisitato è stato trasmesso dal Comune il 16.04.2012.</p> <p>In sede di Conferenza Servizi del 24.04.2012 sono stati acquisiti i pareri degli enti coinvolti e si è provveduto a finanziare l'intervento con Decreto n. 237 del 24/05/2012.</p> <p>Con D. C. n. 261 del 07/05/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n.431 del 29/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell'impresa GEO PERFORAZIONI Srl.</p> <p>Il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012 ed i lavori avviati in data 22/10/2012.</p> <p>Con Decreto n. 481 del 26/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la rimodulazione del quadro economico, l'integrazione dell'impegno di spesa e la proroga dell'ultimazione dei lavori di giorni 30.</p>	AVVIATI LAVORI		UTC	Geo Perforazioni srl	22-ott-12	237 - 24/05/2012	€ 3.630.000,00	€ -	547 del 19/10/2012	€ 2.813.578,07	Ing. La Placa Giuseppe	Decreto Commissariale n.47 del 06 febbraio 2012	Geom. Giuseppe Ferrante					




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento										Stato Intervento				Stato avanzamento Intervento																	
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO De'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL						
																				impresa	data inizio lavori	n. e data	importo								
ME	054	Capizzi	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.192.623,56	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 142 del 16/3/2010 per un importo di euro 1.192.623,56. I lavori sono stati aggiudicati in data 07/03/2012 all'impresa Torsten Costruzioni che ha offerto un ribasso del 23,4255%. Il contratto è stato firmato in data 26/03/2012. I lavori sono iniziati in data 09/05/2012.	Avviati Lavori				Torsten Costruzioni	9-mag-2012	N. 142 DEL 16/03/2011	€ 1.192.623,56													
ME	055	Capo d'Orlando	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto																				
ME	056	Capri Leone	A	A	Ministero		Opere di risagomatura e protezione versanti - Frazione Rocca	€ 550.000,00	€ 550.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 44 del 12.10.2010. Il progetto, dopo varie modifiche e integrazioni, viene trasmesso nella versione definitiva con nota assunta al prot. n. 136 del 18/01/2012 e, a seguito dell'acquisizione pareri, viene finanziato con Decreto Commissariale n. 96 del 08/03/2012. Con Decreto n. 99 del 13/03/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 287 del 20/06/2012 sono stati aggiudicati i lavori. Il contratto è stato sottoscritto in data 26/06/2012 ed i lavori consegnati il 19/07/2012. Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 3438 del 12/09/2012, tra l'altro, ha comunicato che i lavori sono concretamente iniziati solo in data 11.09.12. Con nota acquisita al prot. n. 5258 del 11/12/2012, il RUP trasmette la Relazione di Approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 resosi necessaria durante lo svolgimento dei lavori. Con nota prot. n. 897 del 11/02/2013 l'ing. Salvatore Russo trasmette il certificato di ultimazione lavori del 21/01/2013. Con Decreto Commissariale n. 101 del 18/02/2013 il Commissario prende atto dell'approvazione della PVS e della conseguente rimodulazione dell'impegno, e con Decreto n. 103 e 241 del 18/02/2013 e 29/03/2013 lo stesso Commissario dispone il pagamento del SAL n. 1 e 2. Con nota acquisita al prot. n. 2775 del 13/05/2013 il D.L. ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e dell'art. 237 del Regolamento n. 207/2010.	LAVORI ULTIMATI		Ing. Salvatore Russo (Figura Esterna)		CONSORZIO EMILIANO ROMAGNOLO FRA LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO - EUROVEGA COSTRUZIONI	19/07/2012	Decreto n. 96 del 08/03/2012	€ 516.698,04	€ 33.301,96	Decreto n. 101 del 18/02/2013	€ 386.810,69	Arch. Giovanni Piero Di Magro	D.C. n. 72 del 01/02/2013	Dott. Barranco	Ing. Salvatore Russo						
ME	057	Capri Leone	A	A	Ministero		Opere di consolidamento con tiranti in acciaio, ricostruzione muri perimetrali - Capri Leone Centro	€ 600.000,00	€ 600.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a professionisti esterni con Determina Sindacale n. 42 del 12.10.2010. Lo stesso Comune ha provveduto ad affidare la realizzazione delle indagini preliminari con Determina Sindacale n. 58 del 07.12.2010. A seguito del completamento delle indagini, in data 30.03.2011 è stato trasmesso il progetto esecutivo che, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 252 del 03.10.2011. A seguito di espletamento delle procedure di Gara avviate con Decreto n. 268 del 10/10/2011, con Decreto n. 302 del 03.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva alla Bo.No. Costruzioni Srl e i lavori sono stati avviati in data 17/12/2011. In data 03/07/2012 il D.L. ordina all'impresa Bo.No. Costruzioni Srl di sospendere i lavori e di riprenderli quando verrà approvata la perizia di Variante e Suppletiva. Il RUP, con nota acquisita al prot. con n. 3301 del 03.09.2012, trasmette al Commissario copia dell'autorizzazione a redigere la PVS trasmessa al DL. Con nota acquisita al prot. n. 3347 del 06/09/2012, il RUP trasmette gli elaborati della PVS. In data 10/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale Ripresa Lavori e con D.C. n. 678 del 10/12/2012 l'Ufficio del Commissario ha preso atto della PVS e della rimodulazione del quadro economico. Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 3346 del 06/09/2012, ha chiesto il finanziamento delle opere di completamento per una spesa pari ad € 70.000.	AVVIATI LAVORI		Ing. Amalfi Maurizio (Figura Esterna)	TRIGEO Srl	B.O.N.O. COSTRUZIONI s.r.l. con un ribasso 23,8878%	17/12/2011	252 - 03/10/2011	€ 573.816,18	€ 26.183,82	678 - 10/12/2012	€ 424.452,22	Geom. Gaetano Giuffrè (UTC)	Decreto Commissariale n.233 del 21 settembre 2011	Arch. Diego Mammo Zagarella	Studio Tecnico Ing. Falzea (Figura Esterna)						
ME	058	Caronia	A	A	Ministero	COMITATO 18 MAG 2012	Consolidamento centro abitato	€ 3.000.000,00	€ 3.653.083,31	La progettazione è stata affidata all'Ufficio del Commissario OPCM 3865/10. Il progetto, trasmesso in data 10.02.2011, a seguito di validazioni e approvazioni, è stato finanziato con Decreto n. 30 del 01.03.2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 38 del 31.03.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori che hanno avuto inizio il 01/04/2011. Con Decreto n. 92 del 02/03/2012 il Commissario ha preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 con conseguente rimodulazione del Quadro economico dell'intervento. In data 13.01.2012 i lavori sono stati sospesi in attesa di riscontro per un ulteriore finanziamento da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo per la realizzazione di lavori complementari. In sede di Comitato del 18.05.2012 l'importo dell'intervento è stato incrementato di € 750.000 per lavori indispensabili a garantire la funzionalità delle opere già realizzate. Con nota acquisita al prot. n. 2598 del 10/07/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto di completamento dell'intervento. Il Commissario, con nota prot. n. 2750 del 17.07.2012, ha autorizzato il RUP a procedere all'adozione della procedura di cui all'art. 57 del Codice dei Contratti. Al fine di procedere all'emissione del Decreto di finanziamento, propedeutico al contratto aggiuntivo dei lavori, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3046 del 06/08/2012, il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto e del verbale di Validazione completo di tutti gli atti a corredo necessari. In data 03/09/2012 è stato sottoscritto dall'impresa Presal e dal DL il Verbale di Ripresa Lavori principali ad oggi conclusi. Con D.C. n. 490 del 24/09/2012 sono finanziati i lavori complementari di completamento del consolidamento Centro abitato, e con D.C. n. 189 del 14/03/2013 è stato impegnato l'importo aggiuntivo degli stessi. In data 22/08/2013, con D.C. n. 673, è stato disposto il pagamento del SAL n. 3 alla ditta Presal Costruzioni per i lavori complementari affidatele	AVVIATI LAVORI		DRPC	PRESAL COSTRUZIONI SRL	1-Apr-11	31 - 1/3/2011	€ 3.000.000,00	€ 653.083,31	71 - 26/5/2011 come rimodulato dal Decr 92 del 02/03/2012	€ 2.903.083,31	Ing. Bruno Manfrè (DRPC ME)	nota in entrata prot.n. 10390 del 15 ottobre 2010		Ing. C. Marietta, Arch. F. Benedetti (DRPC ME)							
ME	059	Casalvecchio Siculo	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.363.853,00	€ 1.363.853,00	Il Comune ha affidato la progettazione a professionisti esterni con Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 28.08.2007. Lo stesso Comune, con nota prot. n. 54 del 12.01.2012, ha chiesto l'autorizzazione alla nomina di due consulenze esterne (Progettazione/Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione e Studio Geologico) a causa di mancanza di professionisti all'interno dell'Amministrazione. Il Comune, con note acquisite ai prot. n. 689 del 01.03.2012 e 1374 del 23.04.2012, ha trasmesso i preventivi inerenti le consulenze esterne, ed il Commissario le ha autorizzate rispettivamente con nota prot. n. 1231 del 11/04/2012 e 1479 del 02.05.2012 A seguito della Conferenza dei servizi del 11/06/2012 e successive integrazioni sono state acquisite tutte le necessarie autorizzazioni e pareri utili per l'approvazione dell'intervento. Con nota prot. n. 2286 del 22.06.2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto esecutivo (con Verifica, Validazione e Delibera di G.M. di approvazione dello stesso) finanziato Con Decreto n. 296 del 25.06.2012. Con Decreto n. 397 del 1/08/2012 sono state avviate le procedure di gara e con Decreto n. 464 del 13/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva Con Decreto Commissariale n. 634 del 21/11/2012 il Commissario ha disposto l'occupazione anticipata d'urgenza ed individuato il dirigente dell'UTC quale responsabile delle attività espropriative. La Consegnà dei Lavori ha avuto luogo giorno 10/12/2012. In data 20/03/2013 e 17/04/2013 il Coordinatore della Sicurezza ha effettuato i primi due sopralluoghi. Con Decreto n. 394 del 03/06/2013 è disposto il pagamento del SAL. A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, e del 7 gg per esprimersi concessi agli Enti, il Commissario. Con Decreto n. 496 del 28/06/2013 è avvenuta l'approvazione della Perizia di Variante, la rimodulazione del quadro economico e l'integrazione dell'impegno di spesa. In data 20/09/2013, con nota prot. n. 5635, il DL trasmette copia del Certificato di Ultimazione Lavori.	LAVORI ULTIMATI		Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)	ITINERA s.r.l.	10-dic	n. 296 del 25/06/2012	€ 1.363.853,00	€	n.38 del 22/01/2013	€ 954.358,27	Geom. Romina Sparacino	D. C. n. 73 del 01/02/2013	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Ing. Carmelo Trimarchi (Figura Esterna)							




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento									Stato Intervento		Stato avanzamento Intervento																	
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL			
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo		n. e data	importo							
ME	060	Castel di Lucio	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Completamento degli interventi di mitigazione per il rischio idrogeologico in località Calvario per la S.P. 176 e per il Centro Abitato - Via S. D'Acquisto	€ 1.000.000,00	€ 999.676,87	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 646 del 22/9/2010 per un importo di euro 999.676,87. In data 19/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "PLSANI srl - Mussomeli" con un ribasso del 21,8864%. I lavori hanno avuto inizio il 5 luglio 2011 e sono stati completati in data 12/07/2012 con certificato di ultimazione del 16/07/2012.	LAVORI ULTIMATI					PLSANI srl - Mussomeli	5-lug-2011	N. 646 DEL 22/09/2010	€ 999.676,87									
ME	061	Castel di Lucio	A	A	Ministero		Consolidamento via Durante e Via S. Lucia	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La progettazione è stata redatta da progettisti esterni incaricati dal Comune con Determina n. 51 del 3/12/2010. Il progetto è stato acquisito in data 01.02.2011 e, a seguito della validazione, è stato finanziato con Decreto n.32 del 07.03.2011, come rimodulato dal Decreto 91 del 14/06/2011. A seguito di espletamento di procedure di gara è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori con Decreto n. 163 del 01.08.2011. I lavori sono stati avviati 23/09/2011 e sono stati sospesi in data 25/01/2012 per permettere l'esecuzione di indagini integrative nelle more della redazione di una perizia di variante. I lavori sono stati ripresi in data 16.04.2012. Con nota prot. 1966 del 01/06/2012 il D.L. chiede al RUP l'autorizzazione a redigere una perizia di variante e supplemento, concessa dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2054 del 07/06/2012 a condizione che non comporti modifiche sostanziali che alterino la sostanza del progetto e di trovare copertura nelle somme già impegnate per l'esecuzione dell'opera con D.C. n° 238 del 22/09/2011. Il DL ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 2798 del 19.07.2012, copia della perizia di variante approvata dal RUP con nota acquisita al prot. n. 2836 del 23/07/2012. Con Decreto n. 457 del 12/09/2012 si è preso atto della PVS con conseguente rimodulazione del Quadro Economico. Con nota protocollo n. 383 del 21/01/2013 la Torsten Costruzioni comunica che in data 15 Gennaio 2013 sono stati ultimati i lavori. Con Decreto n. 422 del 07/06/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2 alla Torsten Costruzioni srl.	LAVORI ULTIMATI		S.T.J. Studio Tecnico Associato di Ingegneria e Architettura (Figura esterna)		TORSTEN COSTRUZIONI SRL	23/09/2011 sospesi il 25/01/2012 ripresa lavori il 16/04/2012	32 - 7/3/2011 come modificato dal Decr. n. 91 del 14/06/2011	€ 1.500.000,00	€		238 - 22/09/2011 come rimodulato dal Decreto 457 del 12/09/2012	€ 1.239.256,58	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto Commissariale n. 69 del 25.5.11		Geom. Giuseppe Ferrante		Studio Tecnico Associato Ing. Mineo e Scavaglieri (Figura esterna)
ME	062	Castell'Umberto	A	A	Ministero		Opere di contenimento a valle della sede stradale - Contrada Sfaranda Inferiore	€ 300.000,00	€ 300.000,00	In data 09.11.2010 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina, che ha trasmesso il progetto in data 24.05.2011. A seguito delle verifiche effettuate dalla Struttura Commissariale sono state richieste integrazioni al progetto trasmesso, inviate dal DRPC in data 24.11.2011 e 12.01.2012. Con nota prot. n. 395 del 09.02.2012 la Struttura Commissariale, analizzati gli allegati progettuali, ha sollecitato la consegna del progetto esecutivo, debitamente verificato e validato, tenendo conto delle osservazioni tecniche formulate. Con nota prot. n. 2148 del 13/06/2012 il Commissario ha sollecitato il DRPC di Me a trasmettere il progetto rielaborato entro 7 giorni, debitamente verificato e validato, specificando che trascorso infruttuosamente tale termine, avrebbe attivato i poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 17 del D.L. 195/2009. A seguito di osservazione da parte del Commissario in merito alla difformità tra il Titolo del Progetto in corso di redazione e quello inserito nell'AdP, il Commissario 3865 trasmette la Con Delibera di Giunta Municipale n. 31 del 28.06.2012 che conferma la riconducibilità del progetto di "Samma urgenza per la realizzazione di opere di raccolta, convogliamento acque superficiali e regimentazione idraulica del torrente Battagliola nella Contrada Sfaranda - Comune di Castell'Umberto" all'intervento ME062. Il progetto è stato trasmesso nel mese di novembre 2012 e finanziato con Decreto n. 702 del 17/12/2012. Con D. C. n. 59 del 28/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della A.B.M. Costruzioni srl. In data 12/03/2013 è stato stipulato il contratto. Con Decreto n. 772 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI		DRPC (Arch. Francesco Benedetti)		A.B.M. Costruzioni srl		702 - 17/12/2012	€ 300.000,00	€		772 - 25/09/2013	€ 223.185,12	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	nota di incarico prot.n.536 del 09 novembre 2010 (nota interna DRPC prot. N. 12165 del 24/11/2010 pervenuta via fax))	Arch. Carmelo Bianco	Arch. Francesco Benedetti (DRPC)		
ME	063	Castroreale	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento del versante occidentale a valle del centro abitato- Completamento	€ 1.650.000,00	€ 1.650.000,00	La progettazione è affidata dal Comune a professionisti esterni Con Determina Sindacale n.11 del 16.02.2007. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 903 del 17/06/2011 il Comune ha comunicato essere in corso l'aggiornamento del progetto esecutivo alla vigente normativa. A seguito della nota di sollecito del Commissario Straordinario Delegato, il Comune, con nota acquisita agli atti al prot. n. 1950 del 31/05/2012, ha trasmesso il progetto esecutivo. Con Decreto n. 297 del 26.06.2012 è stato acquisito la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori dai progettisti incaricati precedentemente dal Comune. A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/07/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, fatta eccezione del GC di Me che ha richiesto la trasmissione di elaborati integrativi. In data 18.07.2012 il Progettista ha trasmesso al GC le integrazioni richieste in sede di CdS ed il GC ha espresso il proprio parere con nota acquisita al prot. n. 2877 del 25/07/2012. Il RUP, con nota acquisita al prot.n.3164 del 21.08.2012 ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del progetto. Con Decreto Commissariale n. 564 del 26/10/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori. Con Decreto Commissariale n. 662 del 03/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della C.N.T. srl. Con Decreto Commissariale n. 113 del 21/02/2013 si è provveduto ad impegnare le somme. In data 02/04/2013 è avvenuta la formale Consegna dei Lavori.	AVVIATI LAVORI		Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)		C.N.T. srl	02-apr	564 del 26/10/2012	€ 1.585.394,53	€ 64.605,47	n. 113 del 21/02/2013	€ 1.166.313,41	Arch. Gaetano Buccheri (UTC)	D. C. n. 264 del 07/06/2012	Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Ing. Pietro Colonna (Figura Esterna)			
ME	064	Cesarò	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del Centro Abitato in zona Castello Colonna-Rocca a Sud dell'Abitato	€ 1.000.000,00	€ 965.547,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 2 del 12/1/2011 per un importo di euro 965.547,00. I lavori sono stati assegnati alla B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME). I lavori hanno avuto inizio il 7 settembre 2011	Avviati Lavori				B.C.S. Costr. S.r.l. - Mistretta (ME)	7-set-2011	N. 2 DEL 12/01/2011	€ 965.547,00										
ME	065	Ficarra	A	B*	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada grenne	€ 1.028.981,00	€ 1.028.981,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha trasmesso il progetto in data 21.10.2010. Il progetto è stato finanziato con Decreto n.1 del 23.11.10. I lavori sono stati appaltati dal Comune, e iniziati in data 20.01.11. A seguito del Comitato del 24 febbraio 2011 l'intervento è transitato alla lettera B (copertura finanziaria regionale) ma continuando ad essere gestito dal Commissario, in quanto i lavori erano già avviati. I lavori sono stati conclusi in data 03/11/2011 a meno di lavori accessori, completati, come richiesto dal RUP entro 60 gg e quindi il 03/01/2012. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2367 del 27/06/2012 l'ARTIA Serv.3 ratifica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento.	LAVORI ULTIMATI	COMUNE	Comune: professionista esterno	Geo Sicilia	EDILTECNICA COSTRUZIONI	20/01/2011 sospesi il 30/08/2011 ripresi il 18/10/2011	n. 1 del 23.11.2010	€ 1.028.981,00	€ 0,00	81 - 8/6/2011 così come modificato dal Decr 382 - 15/12/2011	873488,22	Ing. Fabio Marino (UTC)	Determina del Responsabile Area Tecnica n.300 del 04.11.2009	0	Ing. Francesco Caspotto (Figura Esterna)			



ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento							Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																			
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL				
																impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo						
ME	066	Ficarra	A	A	Ministero		Opere di consolidamento e regimazione idraulico - Contrada Rinella - San Noto	€ 1.450.000,00	€ 1.450.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune di Ficarra a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 7 del 23.08.2010. Il progetto è stato consegnato in data 23.03.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 44 del 07.04.2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 198 del 25.08.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato firmato in data 01/09/2011 ed i lavori hanno avuto inizio in data 27/09/2011 Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3222 del 24/08/2012, ritenuto necessario eseguire lavori complementari, ha chiesto autorizzazione ad effettuare le indagini geognostiche preliminari, trasmettendo al contempo elaborati tecnici dei lavori complementari previsti, ma il Commissario, atteso la quasi ultimazione dei lavori, non ha ritenuto accettabili le richieste avanzate. Con D.C. n. 161 del 07/03/2013 è avvenuta la presa d'atto approvazione PVS e la rimodulazione del QE dell'intervento.	AVVIATI LAVORI		ATP - Ing. Nunzio Colavecchio - Ing. Raffaele Cosentino - Geom. Giovanni Ricciarò (Figura Esterna)		RENZO COSTRUZIONI	27-set	Decreto n. 44 del 7/4/2011	€ 1.358.580,64	€ 91.419,36	Decreto n. 161 del 07/03/2013	€ 1.089.005,82	Ing. Fabio Marino (UTC)	Decreto Commissariale n. 232 del 21/09/2011	Arch. Diego Mammo Zagarella	Ing. Francesco Cappotto (Figura Esterna)				
ME	067	Fondachelli Fantina	B	B	Regione		Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 298 del 30/05/2012 per un importo pari a € 927.337,42. A seguito delle procedure di gara, con un ribasso del 30,3548%, l'aggiudicatario dei lavori risulta essere la Pullara Calogero.	Affidamento Lavori				Pullara Calogero	298 del 30/05/2012	€ 927.337,42												
ME	068	Forza D'Agro	B	B*	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.250.000,00	€ 414.163,28	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2368 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Con nota prot. n. 2533 del 06/07/2012 il Commissario sollecita il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa. In data 20/07/2012 si è tenuto un tavolo tecnico con Commissario, Provincia, ARTA e Comune. Con nota acquisita al prot. n. 3359 del 07/09/2012 il Comune, come concordato nel tavolo tecnico del 20.07.2012, trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto oltre la documentazione amministrativa dello stesso. Con nota protocollo n. 3793 del 01/10/2012 il DRPC di ME sentito il Commissario convoca una riunione operativa per il giorno 05/10/2012 al fine di esaminare la problematica dell'intervento. In data 20/02/2013, con nota prot.n. 1073, il Commissario trasmette all'ARTA (Serv. 3) copia del progetto necessario all'acquisizione del parere preventivo dello stesso. L'ARTA (Serv. 3), con nota prot.n. 1786 del 25/03/2013, invita il Comune ad integrare il progetto secondo specifiche indicazioni.	PROGETTAZIONE IN CORSO						€ 0,00	€ 0,00			0	0							
ME	069	Frazzanò	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Lavori di consolidamento del centro abitato a valle della via S. Filippo di Fragalà - Zona Piazzale S.Lorenzo	€ 1.165.000,00	€ 1.165.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 54 del 06/02/2012. Risultato aggiudicatario dei lavori la ATI Malitano srl - Renzo Costruzioni	Affidamento Lavori					n. 54 del 6-feb-12	€ 1.165.000,00												
ME	070	Frazzanò	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento ad est del centro abitato	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La ATI ALAK srl - Costru risulta l'aggiudicatario dei lavori, dopo aver offerto un ribasso del 22,7777% ed è in corso di stipula il contratto	Affidamento Lavori				ATI Alak srl	n. 848 DEL 22/11/2011	€ 2.500.000,00												
ME	071	Frazzanò	A	A	Ministero	COMITATO 15 SETT 2011	Monitoraggio delle aree in frana del centro abitato e delle aree ad elevato rischio idrogeologico (R4)	€ 300.000,00	€ 300.000,00	In data 09.01.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 61 del 13.02.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione. In data 18.04.2012 sono stati acquisiti gli elaborati inerenti le indagini effettuate. Come comunicato dal Commissario al Comune con nota prot. n. 3296 del 03/09/2012, in base alle indagini svolte ed agli studi effettuati sull'area, è emersa una criticità molto più ampia e complessa rispetto all'inquadramento dei bersagli di intervento e, pertanto, l'attività di progettazione dell'intervento, correlata alla disponibilità economica di finanziamento prevista in fase di progettazione preliminare, determina necessariamente una tempistica di studio maggiore di quella prevista. In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4241, Invitalia trasmette copia del Progetto Esecutivo. A seguito della CdS tenutasi in data 06/11/2012 e del parere di coerenza al PAI espresso dall'ARTA (Serv. 3) risultano acquisiti tutti i pareri necessari. Con D.C. n. 91 del 08/02/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento. Con Decreto Commissariale n. 178 del 11/03/2013 è stato approvato lo schema lettera di invito alla Procedura di gara ai sensi dell'art. 122 del d.lgs 163/2006 A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D.C. n. 275 del 15/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Società SCANCARELLO GAETANO (ribasso percentuale del 30,2430%), ed in data 12/06/2013 è stato sottoscritto il contratto. Con Decreto n. 656 del 08/08/2013 è disposto l'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	INVITALIA	INVITALIA	GEO PLANTS	Soc. SCANCARELLO GAETANO	N. 91 DEL 08-02-2013	€ 286.765,17	€ 13.234,83	656 - 08/08/2013	€ 242.164,33	Ing. Fabio Marino (UTC)	Decreto Commissariale n. 2 del 12.01.2012	Geom. Piero Nicolicchia	Ing. Fabio Marino (UTC)					
ME	072	Galati Mamertino	A	A	Ministero		Disaggiamento massi, messa in sicurezza versante - C.da Galini	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto ad affidarla a professionisti esterni con Determina Sindacale n.72 del 05.10.2010. Il progetto è stato acquisito in data 02.11.2011 e, a seguito di approvazione e validazione, è stato finanziato con Decreto n. 15 del 17.01.2012. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con decreto n.103 del 14/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato firmato in data 04/04/2012 ed i lavori sono stati avviati in data 22/05/2012. Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2258 del 21.06.2012, ha trasmesso copia del Decreto di Occupazione Temporanea. Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3399 del 10/09/2012, ha autorizzato il DL a redigere perizia di variante. A seguito dell'autorizzazione del RUP, in data 12/09/2012 è stato sottoscritto il Verbale di Sospensione Lavori. Con nota prot. n. 5053 del 03/12/2012, il DL ha chiesto al RUP autorizzazione al fine di poter procedere alla redazione della PVS II. Con D.C. n. 114 del 21/02/2013 è stato disposto l'impegno somme ed il pagamento del I SAL. In data 18/04/2013 il RUP, con nota prot.n. 2317, trasmette copia dell'approvazione PVS n. 2 e Verbale di ripresa lavori datato 16/04/2013. Con D.C. n. 351 del 16/05/2013 è stato disposto il pagamento del SAL n. 2.	AVVIATI LAVORI		Arch. Felice Testagrossa (Figura Esterna)		D&D	22-mag	15 - 17/01/2012	€ 500.000,00	€	114 - 21/02/2013	€ 362.140,56	Arch. Giuseppa Cavolo (UTC)	Decreto Commissariale n. 14 del 17 gennaio 2012	Arch. Felice Testagrossa (Figura Esterna)					






ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento							Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																			
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL				
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo							
ME	073	Galati Mamertino	A	A	Ministero		Consolidamento e messa in sicurezza versante - Località Pileri	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n.54 del 26/10/2010. Con nota prot. 2770 del 5/12/2011 il Commissario ha trasmesso la documentazione dell'intervento all'ARTA al fine di provvedere ai finanziamenti su fondi europei PO FESR 2007-2013 destinati alla Regione Sicilia. Con nota acquisita al prot. n.234 del 25/01/2012 l'ARTA comunica che l'intervento non possiede i requisiti necessari per l'ammissibilità al finanziamento e restituisce tutta la documentazione perché il Commissario si faccia carico della realizzazione dell'intervento. Con Decreto n. 153 del 03.04.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto n. 349 del 11/07/2012 si è acquisito lo studio geologico e le indagini geognostiche effettuate dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune. Con D.C. n. 406 del 02.08.2012 è stato finanziato l'intervento, con Decreto n. 448 del 2/09/2012 sono state avviate le procedure di affidamento lavori e con D.C. n. 514 del 04/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori. In data 19/10/2012 è avvenuta la consegna dei lavori.	AVVIATI LAVORI		Comune Ing. Mario Saitta		ARCOBALENO 3000 srl	406 - 02/08/2012	€ 1.100.000,00	€ -	495 - 28/06/2013	€ 767.340,53	Arch. Giuseppa Cavolo	D.C. n. 262 del 07/06/2012	Ing. Giuseppe Morganti (Dimessosi con nota prot.n. 611 del 29/01/2013)	Ing. Mario Saitta					
ME	074	Giardini Naxos	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Consolidamento versante - Località Orto Grande	€ 2.200.000,00	€ 2.200.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 9 del 18/01/2012. Aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Consolidamenti Speciale srl, ribasso del 26,6305%. In data 27/02/2013 hanno avuto inizio i lavori	Avviati Lavori						9 18-gen-12	€ 2.200.000,00											
ME	075	Gualtieri Sicaminò	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi urgenti di consolidamento centro abitato	€ 1.651.000,00	€ 1.651.041,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 273 del 22/4/2011 per un importo di euro 1.651.041,00. La gara è stata indetta in data 14/11/2011. In corso di aggiudicazione	Affidamento Lavori						N. 273 DEL 22/04/2011	€ 1.651.041,00											
ME	076	Itala	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Frazione Borgo	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 10 del 18/01/2012	Intervento finanziato							10 18-gen-12	€ 1.498.168,30										
ME	077	Leni	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di difesa costiera a difesa del centro abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 792 del 26/10/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla Chiofalo Costruzioni srl ed in data 28/09/2012 è avvenuta la consegna dei lavori	Avviati Lavori							N. 792 DEL 26/10/2011	€ 1.500.000,00										
ME	078	Letojanni	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di difesa costiera	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	Il progetto è stato affidato dal Comune a progettista esterno con Delibera di Giunta n. 194 del 11.10.2002. Con Decreto Commissariale n. 120 del 23.03.2012 si è acquisito il progetto definitivo ed esecutivo e con Decreto 327 del 10/07/2012 si è acquisito lo studio geologico dai professionisti precedentemente incaricati dal Comune. Durante la conferenza dei servizi del 14.05.2012 il Commissario ha preso atto di quanto richiesto dalle amministrazioni presenti ed ha disposto che il progettista integrasse gli elaborati progettuali con quanto richiesto. Con nota prot. n.2147 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso al progettista il parere con prescrizioni della Soprintendenza del Mare per le opportune modifiche e integrazioni. Il Progettista, con nota acquisita al prot. n. 2682 del 12/07/2012 ha trasmesso le integrazioni progettuali richieste, inoltrate dal Commissario, con nota prot. n. 2896 del 26/07/2012 all'ARTA Serv 3 per il parere di competenza. Il RUP con nota acquisita al prot. n. 3393 del 10/09/2012 ha trasmesso gli atti di validazione del progetto. Con Decreto n. 686 del 11/12/2012 è stato finanziato l'intervento. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 34 del 21/01/13 i lavori vengono aggiudicati definitivamente alla Valori S.C.a.R.L. Consorzio stabile con ribasso percentuale offerto del 29,5000 %. Con Decreto n. 770 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI		Ing. Sascaro Agostino e Geom. Sascaro Sabrina (Figura Esterna)		Valori S.C.a.R.L. Consorzio stabile	686 - 11/12/2012	€ 2.000.000,00		770 - 25/09/2013	€ 1.310.143,30	Ing. Francesca Usticino	Decreto Commissariale n. 657 del 08/08/2013	Geom. Giuseppe Ferrante	Ing. Salvatore Zaccaro					
ME	079	Librizzi	A	A	Ministero		Opere di consolidamento del versante e convogliamento acque - Contrada Nasidi e Via Fraiale	€ 2.150.000,00	€ 2.150.000,00	A seguito della rinuncia da parte del DRPC di Messina la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, il 15/11/2011. La realizzazione delle indagini preliminari alla progettazione è stata affidata dal DRPC ed i risultati sono stati trasmessi in data 23.02.2012. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM), che, in data 16/02/2012, ha trasmesso i prodotti di restituzione dei voli aerei effettuati. A seguito dell'acquisizione della relazione geologica redatta dal Dott. Basile, rivista a seguito delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate dal DRPC e secondo quanto discusso nel tavolo tecnico del 21/03/2012, il geologo della CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 1157 del 04.04.2012, ha richiesto integrazioni alla relazione. Con nota acquisita al prot. n.2041 del 07/06/2012 il geologo ha trasmesso la relazione finale di sintesi della campagna di indagini geognostiche e geotecniche e del monitoraggio strumentale di Contrada Nasidi a Librizzi. Con nota acquisita agli atti al prot. n.3283 del 03/09/2012, la CGIAM ha trasmesso agli Uffici del Commissario le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti le indagini effettuate. Con D.C. n. 473 del 17/09/2012 sono state finanziate le indagini ed avviate le procedure per l'affidamento delle stesse. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 521 del 08/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della realizzazione del Piano di indagini Preliminari di cui l'Affidataria ha trasmesso i risultati con nota acquisita al prot. n. 4781 del 19/11/2012. CGIAM ha trasmesso in data 24/01/2013, con nota prot.n. 520, la relazione geologica dell'intervento. In data 05/03/2013, con nota prot.n. 1361, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo dell'intervento. A seguito della Conferenza dei Servizi del 22/05/2013, e dei 7 gg concessi agli Enti per esprimersi, il Commissario, con nota prot.n. 3451 del 10/06/2013, invita il RUP a procedere alla Verifica e Validazione del Progetto. Con Decreto n. 471 del 20/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con D.C. n. 596 del 25/02/2013 è avvenuta l'aggiudicazione definitiva del	AVVIATI LAVORI		CGIAM INVITALIA	INVITALIA	GEO GAV Srl	Nuova costruzione siciliana srl	471 - 20/06/2013	€ 2.128.085,55	€ 21.914,45	838 - 09/10/2013	€ 1.587.238,81	Geom. Cilona Carmelo (UTC)	D.C. n. 339 del 11.07.2012	Arch. Giovanni Piero Di Magro	Ing. Basilio Ridolfo				
ME	080	Librizzi	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di contenimento Librizzi centro	€ 150.000,00	€ -	INTERVENTO REVOCATO nel corso della riunione di Comitato del 24 febbraio 2011. Le risorse rese disponibili dalla mancata realizzazione delle opere, pari a € 150.000, sono state destinate all'intervento TP171 Salemi.	INTERVENTO REVOCATO		0					€ -	€ -	€ -	€ -	Geom. G. Adamo	[manca determina incarico]						



ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento							Stato Intervento				Stato avanzamento Intervento																	
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL			
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo						
ME	081	Librizzi	A	A	Ministero		Opere di consolidamento versante e sistemazione - Zona Ronco Marudà	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 142 del 22.07.2011 è stato disposto l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione, ad oggi concluse. L'intervento è stato inserito nell'Accordo Quadro con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo al fine di ottenere un rilievo topografico e una restituzione aerofotogrammetrica adeguata. Con note assunte al prot. n. 498 del 16/02/2012, 1503 del 03/05/2012 e 2781 del 18/07/2010 la CGIAM ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati. Con nota acquisita al prot. n. 3724 del 27/09/2012 INVITALIA ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS tenutasi in data 10/10/2012, ed al parere espresso dall'ARTA (Serv. 3) con nota acquisita al prot. n. 4254 del 23/10/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri. Con D.C. n. 707 del 17/12/2012 viene approvato e finanziato l'intervento. Il Commissario con D.C. n. 709 del 18.12.2012, approva la lettera d'invito ed avvia gara. Con Decreto Commissariale n. 32 del 17/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della TEK Infrastrutture srl che ha offerto un ribasso del 29,8833%. In data 09/04/2013 è stato redatto il verbale ai sensi dell'art. 106, comma 3 Regolamento D.P.R. 207/2010. In data 20/05/2013, con nota prot.n. 2951, il RUP autorizza il DL a procedere alla formale consegna dei lavori. In data 05/06/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Consegna Lavori. Con Decreto Commissariale n. 635 del 01/08/2013 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento. In data 19/09/2013 è avvenuta la sospensione dei lavori.	SOSPENSIONE LAVORI	CGIAM INVITALIA	INVITALIA	GIA EXPLORING SAS	TEK Infrastrutture srl	05-giu	707 - 17/12/2012	€ 500.000,00	€	n.635 del 01/08/2013	€ 363.006,46	Geom. Santo di Perna (UTC)	Decreto Commissariale n. 75 del 27 mag 11	Ing. Giuseppe La Placa	Ing. Mobilia Massimiliano			
ME	082	Limina	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.666.000,00	€ 1.666.000,00	Intervento finanziato con DDG.n. 301 del 30/05/2012. L'aggiudicatario dei lavori, a seguito di gara, risulta essere la D.L.M. Costruzioni srl (ribasso del 28,4166%). I lavori hanno avuto inizio il 19/07/2013	Avviati Lavori				D.L.M Costruzioni srl	19-lug-2013												
ME	083	Longi	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.503.100,00	€ 1.474.985,06	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 153 del 18/3/2011 per un importo di euro 1.474.985,06. Lavori aggiudicati in data 15/11/2011 alla DEMETRA LAVORI SRL con un ribasso del 24,16354%. In data 08/02/2012 hanno avuto inizio i lavori.	Avviati Lavori				Demetra Lavori Srl	8-feb-2012	N. 153 DEL 18/03/2011	€ 1.474.985,06										
ME	084	Malfa	B	B	Regione		Messa in sicurezza e consolidamento del costone in località Torricella della Frazione Capo	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 846 del 22/11/2011.	Intervento finanziato						N. 846 DEL 22/11/2011	€ 998.000,00										
ME	085	Malvagna	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 288 del 3/5/2011 per un importo di euro 1.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla MICHELANGELO MAMMANA con un ribasso d'asta pari al 23,44. I lavori sono stati consegnati in data 30/12/2011.	Avviati Lavori				MICHELANGELO MAMMANA - Castel di Lucio (ME)	30-dic-11	N. 288 DEL 03/05/2011	€ 1.000.000,00										
ME	086	Mandanici	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 1.170.000,00	€ 1.149.942,49	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 74 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.149.942,49. I lavori sono stati affidati alla ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA con un ribasso d'asta pari al 22,832 ed affidati alla stessa in data 20/10/2011	Avviati Lavori				ATIFIN.PAR 2000 s.p.a. ROMA	20-ott-2011	N. 74 DEL 22/02/2011	€ 1.149.942,49										
ME	087	Messina	B	A	Ministero		Opere di consolidamento località Giampilleri	€ 24.000.000,00	€ 24.000.000,00	La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009	LAVORI ULTIMATI	Transitata nell'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009 (Eventi alluvionali Giampilleri ME)																
ME	088	Messina	B	A	Ministero	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di salvaguardia centro abitato	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è affidata al Comune che incarica un progettista esterno con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 22.02.2011. Con nota acquisita al prot. n. 2951 del 20.12.2011 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei servizi del 20.03.2012 è stato richiesto al Comune di rimodulare il progetto in ottemperanza alle indicazioni dell'ARTA Serv. 3. Il Progetto rimodulato è stato trasmesso con nota acquisita al prot. n. 1289 del 16.04.2012 e finanziato con Decreto n. 192 del 26.04.2012. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 382 del 20.07.2012, è stato disposto l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Il Contratto è stato sottoscritto il 24/07/2012. I lavori consegnati il 31.07.2012 e dovranno concludersi entro il 27/07/2013. Con D.C. n. 421 del 09.08.2012, funzionari dell'UTC sono stati incaricati del perfezionamento del procedimento espropriativo. Con Decreto Commissariale n.169 del 08/03/2013 si dispone l'impegno delle somme pari ad € 2.239.939,74. Con D.C. n. 372 del 21/05/2013 viene notificata la presa d'atto della Perizia di Variante e Suppletiva, rimodulazione QE ed integrazione impegno di spesa dei lavori.	AVVIATI LAVORI		Comune	SIGEO	Pettinato Costruzioni srl	31-lug	192 - 26/04/2012	€ 3.000.000,00	€	D.C. n. 169 del 08/03/2013	€ 2.239.939,74	Ing. Salvatore Bartolotta	Decreto Commissariale n. 203 del 04.05.2012	Dott. Angelo Salvatore Nicastro	Ing. Antonino Sutura			
ME	89_1	Messina	A	A	Ministero	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Galati Sant'Anna	€ 900.000,00	€ 900.000,00	Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B. Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 traici. Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A. La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 444, trasmette la documentazione amministrativa. Con nota acquisita al prot. n. 3079 del 07.08.2012, il Progettista trasmette all'Ufficio del Commissario copia del Progetto esecutivo. A seguito della CdS tenutasi in data 23.08.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri. Con Decreto Commissariale n. 593 del 08/11/2012 è stato finanziato l'intervento, e con Decreto n. 733 del 21/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della C&P srl (ribasso del 28,9554%). In data 06/03/2013 è avvenuta la consegna dei lavori, il termine utile per ultimare i lavori è stabilito in 180 giorni naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 02/09/2013. Con Decreto Commissariale n. 546 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 632.964,88. Con Decreto n. 725 del 11/09/2013 è disposto il pagamento del SAL.	AVVIATI LAVORI		Comune		C&P srl	06-mar	D.C. n. 593 del 08/11/2012	€ 900.000,00	€	D.C. n.546 del 12/07/2013	€ 632.964,88	Ing. Antonino Amato (UTC)	D.C. n. 379 del 20.07.2012	Ing. Alberto Peligra (FINO AL 31/01/2013)	Geom. Domenico Currò (UTC)			




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento								Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																						
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL								
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo		n. e data	importo												
ME	89_2	Messina	A	A	Ministero	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Milli San Marco	€ 1.390.000,00	€ 1.390.000,00	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B</p> <p>Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci</p> <p>Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A</p> <p>La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 446, ha trasmesso la documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota prot.n. 464 del 14/02/2012 il Commissario, in riscontro alle richieste del Comune, ha nominato un tecnico interno a supporto della progettazione.</p> <p>Con nota prot.n. 2976 del 01.08.2012, il Geologo incaricato ha trasmesso copia della documentazione integrativa allo studio geologico.</p> <p>In data 12/12/2012 il RUP ha trasmesso copia del progetto rielaborato dal progettista in data 30/11/2012.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi in data 20/02/2013, il Progettista trasmette, con nota prot.n. 1172 del 25/02/2013, le integrazioni richieste dall'ARTA Serv. 3, a cui sono concessi 7 gg per esprimere il parere di propria competenza.</p> <p>In data 27/03/2013, con nota prot.n. 3866, l'Ufficio del Commissario sollecita l'ARTA (serv. 3) al rilascio del parere.</p> <p>Con nota prot. n. 1983/UC del 04/04/2013, il Commissario richiede all'ARTA Serv.1 che le opere vengano sottoposte, nell'ambito della Valutazione di Incidenza, allo screening ai sensi dell'art. 4 del D.A. 30 marzo 2007.</p>	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	-	Comune	-	-	-	€	-	-	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ing. Antonino Amato (UTC)	D. C. 381 del 20.07.2012	Ing. Giuseppe Morganti (FINO AL 29/01/2013)	
ME	89_3	Messina	A	A	Ministero	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Milli San Pietro	€ 510.000,00	€ 510.000,00	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B</p> <p>Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci</p> <p>Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A</p> <p>La progettazione è affidata al Comune che con nota del 13.02.2012, acquisita al prot.n. 445, ha trasmesso la documentazione amministrativa.</p> <p>Il Comune ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 1760 del 17.05.201, copia del progetto esecutivo aggiornato.</p> <p>A seguito della conferenza dei servizi del 31/05/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento.</p> <p>In data 20/07/2012 con Decreto n.383 si è provveduto a finanziare il progetto.</p> <p>Il RUP, con nota acquisita al protocollo n. 2839 del 23/07/2012 ha trasmesso al Commissario il Verbale di Verifica e Validazione e l'Attestazione ex art. 106 comma 1.</p> <p>Con D. C. n. 831 del 08/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	-	Comune	-	Ditta Projet s.r.l.	-	n.383 del 20/07/2012	€ 505.354,78	€ 4.645,22	831 - 08/10/2013	€ 383.477,82	Geom. Marco Mancuso (UTC)	D.C. n. 226 del 17.05.2012	Ing. Alberto Peligra (FINO AL 31/01/2013)	Ing. Angelo Di Dio								
ME	89_4	Messina	A	A	Ministero	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Santa Margherita	€ 650.000,00	€ 650.000,00	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B</p> <p>Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci</p> <p>Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.</p> <p>La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 443, ha trasmesso la documentazione amministrativa.</p> <p>A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il Comune a trasmettere con urgenza il progetto esecutivo ed il DRPC a trasmettere, entro 45 giorni, il progetto del rifiorimento del tratto di litorale prospiciente il complesso edilizio in località Santa Margherita.</p> <p>A seguito della CdS tenutasi giorno 29/11/2012, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto.</p> <p>Il DRPC in data 10/12/2012, con nota assunta al prot.n. 5191, trasmette copia del progetto esecutivo di rifioritura massi.</p> <p>Il Commissario con Decreto Commissariale n. 699 del 13/12/2012 approva e finanzia l'intervento</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 20 del 14/01/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dell'intervento ME089_4aA_Messina, a favore della ROMEO COSTRUZIONI S.R.L. ribasso percentuale del 29,2246 %. In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto.</p> <p>A seguito della CdS dell'intervento ME 089_4b tenutasi in data 23/01/2013 il Commissario concede 7 giorni per esprimersi agli Enti che non hanno ancora comunicato il parere di propria competenza. L'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 874 del 08/12/2012, comunica che l'intervento ricade in aree non perimetrate nel PAI.</p> <p>Con D.C. n. 182 del 12/03/2013 è stato finanziato l'intervento ME089_4b, e con D.C. n. 258 del 05/04/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento ME089_4a.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 336 del 10/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per la realizzazione dei lavori relativi all'intervento l'intervento ME089_4b a favore della ECOAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L., (ribasso del 30,9333%)</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 535 del 10/07/2013 venano impegnate le somme</p>	AVVIATI LAVORI	-	DRPC	-	ROMEO COSTRUZIONI S.R.L. (ME089_4aA)	20-apr	699 - 13/12/2012	€ 395.650,00	€ 254.350,00	258 - 05/04/2013	€ 306.390,20	Ing. Salvatore Bartolotta (ME089_4a) Ing. B. Manfrè (ME089_4b)	(ME089_4a) D.C. n. 650 del 27/11/2012 (ME 089_4b) nota in entrata prot. n. 1155 del 22/02/2013	(ME089_4a) Dott.ssa Flavia Liistro (FINO AL 30/01/2013) (ME 089_4b) Arch. Carmelo Blancato	(ME 089_4a) Geom. Domenico Currò Comune (ME089-4b) Ing. Fabio Bongiovanni DRPC								
ME	89_5	Messina	A	A	Ministero	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento località Santo Stefano	€ 550.000,00	€ 550.000,00	<p>Nel corso del comitato del 21 ottobre 2011 l'intervento transita da A a B</p> <p>Nel "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 l'intervento originario dell'APQ di € 4.000.000,00 è stato suddiviso in 5 stralci</p> <p>Nel Corso del Comitato del 15 settembre 2011 l'intervento transita nuovamente alla lettera A.</p> <p>La progettazione è affidata al Comune che in data 13.02.2012, con nota acquisita al prot.n. 442, ha trasmesso la documentazione amministrativa.</p> <p>A seguito del tavolo tecnico del 22/10/2012, il Commissario, con nota prot.n. 4366 del 26/10/2012, ha invitato il RUP a trasmettere il progetto entro 15 gg.</p> <p>In data 29/11/2012, con nota prot.n. 5006, il Commissario autorizza il Comune di Messina a procedere alla redazione delle attività connesse alla progettazione esecutiva dell'intervento.</p>	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	-	Comune	-	-	-	-	€	-	-	-	Geom. Domenico Currò (UTC)	D. C. 380 del 20.07.2012	Ing. Alberto Peligra (FINO AL 31/01/2013)									
ME	090	Militello Rosmarino	B	B	Regione		Consolidamento all'interno del centro abitato in c/da Ramisi	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG.n. 584 del 29/10/2012	Intervento finanziato																						




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento								Stato Intervento		Stato avanzamento Intervento																
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL	
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo		n. e data	importo					
ME	091	Mirto	A	A	Ministero		Consolidamento centro abitato	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011. Con Decreto n. 144 del 22.07.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini preliminari alla progettazione ad oggi concluse. In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 1257 del 12 aprile 2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche inerenti ulteriori indagini da effettuare sul sito di cui il RUP ha preso atto in data 27.04.2012. Con Decreto Commissariale n. 205 del 08/05/2012 sono state approvate le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini integrative preliminari alla progettazione e dato avvio alle procedure di gara per l'affidamento delle stesse. Con Decreto Commissariale n. 250 del 30/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di indagini preliminari integrative. Le attività sono state avviate il 18/06/2012 e sono state completate in data 16/07/2012, con la trasmissione della relazione sulle indagini integrative effettuate acquisita al prot.n. 2754 in pari data. Con nota acquisita al prot. n. 3421 del 11/09/2012, la CGIAM ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della relazione geologico-tecnica. Con nota acquisita al prot. n. 772 del 05/02/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Cds tenutasi giorno 06/03/2013 sono acquisiti tutti i pareri con esito positivo, ad eccezione di quelli di competenza dell'ARTA (Serv. 3) che, con nota prot.n. 1576 del 13/03/2013, ha espresso pressioni che occorrerà rispettare. In data 07/06/2013 con nota prot.n. 3406, Invitalia trasmette le integrazioni richieste dall'ARTA. In data 09/07/2013, con nota prot.n. 4104, il RUP trasmette al Commissario verifica e validazione del progetto esecutivo. Con Decreto n. 531 del 09/07/2013 è stato finanziato l'intervento. Con Decreto n. 675 del 26/08/2013 viene nominata la Commissione di Gara. Con Decreto n. 790 del 30/09/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Colnisa Costruzioni srl.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI		INVITALIA	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL GEOMERID (Indagini preliminari integrative)	Colnisa Costruzioni srl	-	531 - 08/07/2013	€ 2.427.687,47	€ 72.312,53	-	-	Ing. Giuseppe Nastasi (UTC)	Decreto Commissariale n. 93 del 14 giugno 2011	Ing. Federica Bottini	Ing. Antonio Sorge	
ME	092	Mistretta	A	A	Ministero		Regimentazione e ripristino degli alvei mediante la realizzazione di strutture di ingegneria naturalistica e messa in sicurezza versante area nord-ovest dell'abitato di Mistretta - Torrente Santa Domenica	€ 800.000,00	€ 800.000,00	Con nota prot.n. 746 del 07.03.2012 la progettazione è stata affidata al Comune. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, ha restituito i dati del rilievo aereo effettuato. Con nota acquisita al prot. n. 1526 del 07.05.2012, il Comune ha comunicato che il progetto sarebbe stato redatto da personale interno dell'UTC che verrà affiancato, per la progettazione specialistica, da un supporto tecnico nella qualità di coprogettista, incarico già autorizzato con nota del Commissario prot.n. 1174 del 04.04.2012 purché eseguito ai sensi delle norme vigenti. Il Comune con nota prot.n. 3324 del 05.09.2012, ha trasmesso il progetto esecutivo. Con nota prot. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha revocato alla CGIAM l'incarico. A seguito della Cds tenutasi in data 25/09/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri/assenso dagli Enti interessati per l'approvazione del progetto. Il RUP, con nota acquisita al prot.n. 3910 del 08/10/2012, ha trasmesso copia del Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo. L'intervento è stato finanziato con D.C. n. 586 del 07/11/2012 e con D.C. n. 626 del 20/11/2012 sono state avviate le procedure di gara. A seguito delle procedure di gara con D. C. n. 710 del 18/12/2012 viene disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori, e giorno 03/04/2013 ha avuto luogo la formale consegna dei lavori. Con Decreto n. 419 del 07/06/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento. In data 23/08/2013 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori.	SOSPENSIONE LAVORI		Geom. Lucio Pani (UTC)	GEO RAS (IAP)	Geodesia srl	03-apr	586 - 07/11/2012	€ 778.679,50	€ 21.320,50	419 - 07/06/2013	€ 567.419,42	Geom. Rosario Mazzurco (UTC)	Decreto Commissariale n.326 del 16.11.2011	Arch. Di Magro	Geom. Lucio Pani (UTC)	
ME	093	Monforte San Giorgio	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 360 del 6/6/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. In data 22/11/2012 è stato stipulato il contratto con il Consorzio Cooperativo Costruzioni che ha offerto un ribasso del 11,754%.	Affidamento Lavori			Consorzio COOPERATIVE COSTRUZIONI		N. 360 DEL 06/06/2011	€ 1.200.000,00									
ME	094	Motta Camastra	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Completamento consolidamento del Centro Abitato per le zone Nord di Rocca Mancusa	€ 1.000.000,00	€ 993.521,35	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 425 del 17/6/2011 per un importo di euro 993.521,35. I lavori sono stati affidati alla Vertical Project srl ed in data 12/03/2012 è avvenuta la consegna dei lavori.	Avviti Lavori			VERTICAL PROJECT s.r.l. - Cesarà (ME)	12-mar-2012	N. 425 DEL 10/06/2011	€ 993.521,35									
ME	095	Naso	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento del versante, opere di drenaggio in località Gattina	€ 600.000,00	€ 1.650.000,00	La progettazione è stata affidata dal Comune a progettisti esterni con Determina Sindacale n. 37 del 01.06.2011. Con nota acquisita al prot.n. 1293 del 16.04.2012 il Comune ha comunicato di voler affidare incarichi professionali relativi alle competenze geotecniche, geologiche e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e tali incarichi sono autorizzati dal Commissario con nota prot. n. 1319 del 20/04/2012, purché conferiti nei rispetti delle norme vigenti. In riscontro alla nota di sollecito del Commissario, con nota acquisita agli atti al prot. n. 227 del 14/03/2013 il Progettista incaricato, ha trasmesso all'Ufficio del Commissario n. 6 copie del Progetto Esecutivo. A seguito della Cds tenutasi in data 24/01/2013 sono stati acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento, ad eccezione del GC di Messina che, con nota prot.n. 1281 del 28/02/2013 richiede integrazioni. In data 28/02/2013 è stato sottoscritto il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo. Con D.C. n. 191 del 14/03/2013 è stato disposto il Finanziamento dell'intervento. A seguito delle procedure di gara con D.C. n. 341 del 13/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'Impresa EVER GREEN SRL UNIPERSONALE, che ha offerto un ribasso percentuale del 30,6998%. Giorno 09/07/2013 è stato sottoscritto il contratto.	AVVIATI LAVORI		UTC	Trigeo srl	EVER GREEN SRL UNIPERSONALE	-	191 - 14/03/2013	€ 1.635.000,00	€ 15.000,00	Decreto n. 579 del 18/07/2013	€ 1.232.005,50	Arch. Mario Sidoti Migliore (UTC)	Decreto Commissariale n. 344 del 11/07/2012	Ing. Rossella Zumbè (FINO AL 29/01/2013)	Arch. Mario Messina	
ME	096	Novara di Sicilia	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento del centro abitato	€ 400.000,00	€ 399.110,40	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 196 del 1/4/2011 per un importo di euro 399.110,40. I lavori sono stati affidati alla Chiofalo Group con un ribasso d'asta pari a 23,9471%, ed in data 25/11/2011 sono stati avviati.	Avviti Lavori			CHIOFALO GROUP srl- San Filippo del Mela	25-nov-2011	N. 196 DEL 01/04/2011	€ 399.110,40									
ME	097	Pagliara	B	B	Regione		Interventi di consolidamento del centro abitato	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 163 del 12/03/2012. Con un ribasso del 33,0927 risulta essere l'aggiudicatario dei lavori la MEDI Appalti srl	Affidamento Lavori			MEDI Appalti srl		163 12-mar-12	€ 911.521,64									
ME	098	Patti	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento frazione Sorrentino	€ 1.300.000,00	€ 1.085.544,63	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 154 del 18/3/2011 per un importo di euro 1.085.544,63. I lavori sono stati aggiudicati dalla ATI Co.I.V. di Racheli S. - G.F. Costruzioni srl - Patti Sorrentini srl con un ribasso del 24,05%. In data 24/07/2012 sono stati avviati i lavori	Avviti Lavori			ATI CO.I.V. di Racheli S. - G.F. Costruzioni srl - Euroinfrastruttur e srl - Patti Sorrentini srl	24-lug-2012	N. 154 DEL 18/03/2011	€ 1.085.544,63									



ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	Descrizione Intervento			Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																								
			FONDI ORIGINALI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL								
			impresa	data inizio lavori	n. e data	importo	n. e data	importo																									
ME	099	Piraino	A	A	Ministero		Opere di consolidamento - Zona Roda - S. Costantino, Polcara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	La progettazione è stata affidata ad Invitalia in data 08.03.2011. SAN LEONARDO: - Invitalia ha trasmesso il progetto in data 17.02.2012; - A seguito della Conferenza dei Servizi del 27.02.2012 sono stati acquisiti tutti i pareri; Con nota assunta al prot. n.1952 del 31/05/2012 Invitalia ha trasmesso al Commissario il progetto esecutivo con le integrazioni richieste dal parere del GC. Il Progetto consegnato prevedeva, come concordato, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo da parte di RFI. A seguito di rinuncia da parte di RFI al riutilizzo, il Commissario, con nota prot. n. 2623 del 11/07/2012, ha chiesto ad INVITALIA di rimodulare e trasmettere, il Quadro Economico dell'intervento in funzione del mancato riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dalla riprofilatura degli argini del torrente Garofalo. Con nota prot.n. 3232 del 27.08.2012 il RUP ha invitato il GdA a predisporre una variante al progetto, prevedendo la sistemazione del materiale proveniente dagli scavi nel tratto focale del Torrente Garofalo o, in alternativa, nella medesima area d'intervento. Con Decreto Commissariale n. 493 del 25/09/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dei lavori "Opere di consolidamento in contrada San Leonardo", e con D. C. n. 660 del 03/12/2012 è avvenuta l'approvazione schema lettera di invito alla procedura di gara dello stesso. Con Decreto n. 735 del 27/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Terramare srl, e giorno 14/02/2013 verrà stipulato il contratto. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 784 del 05/02/2013 il RUP trasmette il verbale di cui all'art. 106 comma 3 DPR del 05 ottobre 2010. Con Decreto Commissariale n. 618 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno delle somme. Con nota acquisita al prot. n. 6338 del 22/10/2013 il RUP trasmette il verbale di consegna dei lavori del 13/05/2013.	AVVIATI LAVORI	CGIAM INVITALIA	INVITALIA	GEOMERID SRL GEO PLANTS (integrative) GEO GAV srl (S. Costantino) TRIVELISICILIA (Torre delle Ciavole)	Terramare srl (S. Leonardo)	41.407	Decreto n.493 del 25/09/2012	€ 668.652,86	€ 431.347,14	618 - 30-7-13	€ 486.321,04	Geom. Sarino Giuffrè (UTC)	Decreto n. 680 del 28 agosto 2013	Ing. Adriano Grassi (IAP) (FINO AL 29/01/2013)	Ing. Domenico Gaetano Alampi								
ME	100	Raccuja	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento - Zona Centro abitato	€ 5.000.000,00	€ -	Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad IAP (a seguito di rinuncia del DRPC di Messina precedentemente incaricato). Il DRPC, con nota acquisita al prot.n. 954 del 21.03.2012, ha trasmesso copia del piano delle indagini geognostiche e del monitoraggio strumentale geotecnico dell'intervento da loro stessi effettuate, in virtù dell'incarico precedentemente conferitogli. In riferimento all'Accordo Quadro del 29.11.2011 stipulato con la CGIAM, la stessa ha trasmesso, con nota prot. n. 1143 del 03/04/2012, la restituzione dei dati da rilievo aereo effettuati, e con nota acquisita al prot. n. 1258 del 12 aprile 2012 la stessa ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari alla progettazione da realizzare. Nel Corso del Comitato del 18/05/2012 è stato deciso di sospendere ogni attività.	INTERVENTO REVOCATO	CGIAM INVITALIA	INVITALIA								Ing. Marco Calogero (FINO AL 29/01/2013)	Decreto Commissariale n. 173 del 18.04.2012											
ME	101	Reitano	B	B	Regione		Opere di consolidamento centro abitato	€ 980.000,00	€ 980.000,00	Intervento finanziato con DDG n. 849 del 22/11/2011	Intervento finanziato					N. 849 DEL 22/11/2011	€ 966.114,00																
ME	102	Roccalumera	B	B	Regione		Consolidamento del centro abitato	€ 850.000,00	€ 850.000,00	I lavori sono stati consegnati in data 12/10/2012 alla Consorzio Artek - Roma (Giada Costruzioni) che ha offerto in gara un ribasso del 26,6166%.	Avviati Lavori					N. 89 DEL 01/03/2011	€ 850.000,00																
ME	103	Roccalumera	B	B	Regione		Consolidamento centro abitato	€ 1.885.000,00	€ 1.885.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 726 del 14/10/2010 per un importo di euro 1.885.000,00. I lavori sono stati affidati alla Sidoti Costruzione con un ribasso d'asta pari a 47,731%. Il Contratto è stato stipulato in data 26/03/2012 e i lavori sono stati avviati il 14/06/2012	Avviati Lavori					Consorzio Artec - Roma (Giada Costruzioni)	14-giu-2012	N. 726 DEL 12/10/2010	€ 1.885.000,00														
ME	104	Roccella Valdemone	B	B	Regione		Opere di salvaguardia centro abitato	€ 875.000,00	€ 875.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 361 del 6/6/2011 per un importo di euro 875.000,00. Aggiudicazione avvenuta il 21/11/2011, a favore della Di Maria Costruzioni. In data 01/12/2011 hanno avuto inizio i lavori, terminati in data 12/11/2012	LAVORI ULTIMATI					Di Maria Costruzioni srl	1-dic-2011	N. 361 DEL 06/06/2011	€ 875.000,00														
ME	105	Rometta	A	B*	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di protezione e consolidamento del centro abitato di Rometta mare	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2371 del 27/06/2012 l'ARTA Serv.3 comunica all'Ufficio del Commissario che è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento ed invita il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Con nota prot. n. 2532 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa. Con nota acquisita al prot.n.3185 del 23/08/2012 il Comune ha trasmesso copia del progetto definitivo generale delle opere e della documentazione amministrativa, e con nota prot.n. 4103 del 16/10/2012 il Commissario ha invitato il Comune a trasmettere in tempi brevi copia del progetto esecutivo. In data 07/03/2013, con nota prot. n. 1381, l'UTC trasmette alla Struttura Commissariale il Progetto Definitivo dell'intervento. Con nota prot. n. 3503 del 12/06/2013 l'ARTA Serv.3 esprime positivamente il parere di propria competenza. A seguito della CAS di giorno 31/07/2013 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso necessari alla realizzazione dell'intervento (progetto definitivo). In data 08/11/2013, con nota prot.n. 6724, la ARTEC srl trasmette copia del progetto esecutivo dell'intervento.	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI							ARTEC Associati srl			0	0			Ing. Nicolò Cannata	decreto n. 578 del 18/07/2013	0						
ME	106	S. Alessio Siculo	A	B*	Regione	Comitato 21 OTT 2010	Barriera soffiata e radente a protezione del centro abitato	€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	A seguito delle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo tenutosi in data 21/10/2010 con nota prot. N.629 del 17/11/2010 l'intervento è stato trasmesso all'ARTA. L'ARTA Serv. 3, con nota acquisita al prot. N. 996 del 23/03/2012, ha comunicato al Commissario essere l'ente beneficiario dell'intervento e lo invita a ricordarsi con il Comune di S. Alessio Siculo. Con nota acquisita al prot. n. 1069 del 29/03/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al - 3° Lotto Funzionale Opere a salvaguardia della costa e dell'abitato I-STRAORDINARIO ESECUTIVO. Con Decreto Commissariale n. 187 del 26/04/2012 è stata acquisita la progettazione definitiva eseguita da progettisti incaricati dal Comune. In sede di conferenza dei servizi del 15/05/2012 sono state richieste integrazioni al fine di attemperare alle prescrizioni formulate dagli Enti. A seguito dell'adeguamento del progetto, con nota prot. n. 2155 del 13/06/2012 il Commissario ha trasmesso all'ARTA Serv.3 copia del progetto munito di tutti i visti di approvazione e tutta la documentazione tecnico-amministrativa, ai fini dell'emissione del Decreto di finanziamento. In data 30-05-2013 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 126 del 11.03.2013 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo. Con nota acquisita al prot. n. 4065 del 08/07/2013 il RUP dichiara che gli elaborati di progetto in formato PDF, messi a gara, sono conformi agli elaborati in formato cartaceo, debitamente sottoscritti da tutti i soggetti interessati. Con Decreto n. 627 del 31/07/2013 si prende atto del DDG n. 126 del 11/03/2013 dell'ARTA di finanziamento dell'intervento, approvazione bando e disciplinare di gara. Con Decreto n. 837 del 09/10/2013 viene comunicata alla Angelo De Cesaris srl l'aggiudicazione definitiva dei lavori.	Affidamento Lavori							Comune: professionista esterno					ATI - Angelo De Cesaris srl			0	0			Arch. Gaetano Faranna (Responsabile dell'UTC)	D. C. n. 239 del 24.05.2012	Geom. Giuseppe Ferrante	
ME	107	San Fratello	B	A	Ministero		Opere di consolidamento centro abitato	€ 18.000.000,00	€ 18.000.000,00	La gestione dell'intervento è stata trasferita al Commissario di cui all'OPCM 3815 del 10 ottobre 2009	LAVORI ULTIMATI	tata nell' OPCM 3865 del marzo 2010 (Eventi alluvionali S. Fratello ME)																					
ME	108	San Pier Niceto	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.550.000,00	€ 1.550.000,00	Intervento finanziato con DDG. 619 del 06/11/2012	Intervento finanziato																						




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento									Stato Intervento				Stato avanzamento Intervento																
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINALI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL				
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo							
ME	109	San Pier Niceto	A	A	Ministero		Eliminazione del rischio igienico sanitario mediante consolidamento dell'area a protezione del serbatoio del centro abitato	€ 600.000,00	€ 600.000,00	Con nota prot.n. 425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. A seguito di espletamento delle procedure di gara, con Decreto n. 345 del 30.11.2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle indagini preliminari, ad oggi concluse. Con nota acquisita al prot. n. 4359 del 26/10/2012 Invitalia ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 21/11/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari. Con D.C. n. 734 del 21/12/2012 è stato finanziato l'intervento. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 33 del 21/01/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Gresy Appalti srl che ha offerto un ribasso percentuale pari a 29,9559%. In data 04/03/2013 il RUP e la Gresy Appalti srl sottoscrivono Verbale di Accertamento permanenza condizioni per immediato esecuzione dei lavori. In data 20/05/2013, con Decreto n. 364 è stato disposta l'impegno delle somme. In data 03/07/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.	AVVIATI LAVORI	INVITALIA	INVITALIA	S.G.M. SOCIETA' GEONOSTICA MEDITERRANEA SRL (Mandante) (IAP)	Gresy Appalti srl	03-lug	734 - 21/12/2012	€ 552.953,81	€ 47.046,19	364 - 20/05/2013	€ 429.593,24	Geom. Francesco Maio (UTC)	Decreto Commissariale N. 301 del 31 ott 2011	Arch. Giovanni Piero Di Magro	Ing. Cono Galipò				
ME	110	San Piero Patti	A	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica del centro abitato	€ 1.850.000,00	€ 1.850.000,00	Il Comune con nota del 10 Feb 2011 chiede di trasferire l'intervento, R4P4 GP1, dalla lettera A alla lettera B, cioè di inserirlo nel PO FESR 2007/2013; Il Comitato di Indirizzo e Controllo ha accolto l'istanza del Comune nel corso della seduta del 24 febbraio 2011. Il progetto è stato finanziato con DDG.n. 127 del 11/03/2013	Intervento finanziato																		
ME	111	Santa Lucia del Mela	B	B	Regione		Consolidamento centro abitato	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 572 del 31/8/2010 per un importo di euro 1.300.000,00. In data 20/4/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "UNICOS S.r.l. - Acì Castello" con un ribasso del 21,3808%. I lavori hanno avuto inizio il 18 agosto 2011	Avviate Lavori			UNICOS srl Acì Castello	18-ago-2011	N. 572 DEL 31/08/2010	€ 1.300.000,00												
ME	112	Santa Lucia del Mela	B	B	Regione		Consolidamento ed eliminazione rischio idrogeologico perimetro urbano in Contrada Grazie in prossimità del Viale dei Pini	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 88 del 1/3/2011 per un importo di euro 1.200.000,00. I lavori sono stati affidati alla CIOFALO COSTR. S.R.L. - S. Filippo del Mela (ME) con un ribasso d'asta pari al 23,2012. I lavori hanno avuto inizio il 21/11/2011	Avviate Lavori			CIOFALO COSTR. S.R.L. - S. Filippo del Mela (ME)	21-nov-2011	N. 88 DEL 01/03/2011	€ 1.200.000,00												
ME	113	Santa Marina Salina	A	A	Ministero		Opere di consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - Fraz. Lingua e zona del Faro	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	In data 27.10.2010 la progettazione è stata affidata al Prov. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria. A seguito della riunione del 21/09/2011, è stata data priorità agli interventi di difesa costiera da via Nero a Punta Lingua. Con nota prot.n. 2234 del 20.06.2012, il Prov. Interr. OO.PP. ha comunicato essere in corso la rimodulazione delle scelte progettuali. Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/02/2013. Con nota prot. n. 1493 del 11/03/2013 il Provveditorato trasmette il Progetto Generale Definitivo per un importo pari ad € 3.700.000,00 ed il Progetto Esecutivo 1° Stralcio per un importo di € 2.000.000,00. A seguito della Conferenza dei Servizi del 10/05/2013, si resta in attesa dei pareri non ancora pervenuti.	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	Prov.to Int.le OO.PP.	Prov. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria							€	€					Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Nota in uscita prot.n.460 del 27.10.2010		
ME	114	Sant'Agata di Militello	B	B	Regione		Intervento di difesa idraulica del centro abitato	€ 1.710.000,00	€ 1.710.000,00	Intervento finanziato con DDG. 881 del 25/11/2011. I lavori sono stati aggiudicati dalla Amata Costruzioni srl che ha offerto un ribasso del 30,00%	Affidamento Lavori				Amata Costruzioni srl			€ 1.168.113,43											
ME	115_1	Sant'Angelo di Brolo	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Barba	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. In data 19.10.2011 la progettazione è stata affidata al DRPC di Messina. A seguito di espletamento di procedure di gara, con Decreto n. 295 del 26/10/2011, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il contratto è stato sottoscritto il 15/11/2011. I lavori sono stati avviati il 29/11/2011. Con nota prot.n. 281/65 del 08.08.2012 il RUP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia della Perizia di Variante e Suppletivo, per l'autorizzazione di competenza. In data 08.08.2012 è stato sottoscritto Verbale di Sospensione Lavori. Il Commissario, data l'urgenza delle attività previste nell'ambito della PVS ai lavori, ha convocato il 11.09.2012 un tavolo tecnico, in base agli esiti della quale, con nota prot. n. 3456 del 12/09/2012 sono state richieste integrazioni alla PVS presentata, successivamente acquisite al prot.n. 4017 del 12/10/2012. In data 19/11/2012, con D.C. n. 624, è disposta l'occupazione anticipata d'urgenza degli immobili siti nel Comune. Con Decreto Commissariale n. 24 del 15/01/2013 è stato rimodulato l'impegno, prendendo atto della PVS approvata dal RUP. In data 01/03/2013, con nota prot.n. 1308, il RUP trasmette copia del Verbale di Ripresa Lavori	AVVIATI LAVORI		DRPC	S.G.M. Srl		29/11/2011	151 - 27/7/2011	€ 3.000.000,00	€	24 - 15/01/2013	€ 2.675.342,21	Ing. Bruno Manfrè (DRPC)	Decreto Commissariale n. 170 del 17/04/2012						
ME	115_2	Sant'Angelo di Brolo	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Contrada Cartelli	€ 2.500.000,00	€ 2.930.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scorporato, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. La progettazione è stata affidata al DRPC di Messina. Con nota acquisita al prot. n. 955 del 21/03/2012 il DRPC ha trasmesso il progetto esecutivo I Stralcio. A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 A seguito delle Conferenze dei Servizi del 16/04/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri degli Enti e a seguito di validazione del RUP il progetto è stato finanziato con Decreto n. 301 del 28.06.2012. Con Decreto n. 532 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed il Contratto è stato stipulato in data 25/10/2012 Con Decreto Commissariale n. 638 del 22/11/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Con Decreto Commissariale n. 15 del 11/01/2013 è stato disposta l'impegno della spesa necessaria per la realizzazione dell'opera. In data 29/01/2013, con nota prot.n. 561, il DL invita l'aggiudicatario dei lavori alla formale consegna parziale dei lavori che avrà luogo giorno 01/02/2013. In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1584, l'Ufficio del Commissario autorizza il DL a redigere Perizia di Variante Strutturale. A seguito della CdS tenutasi in data 31/10/2013, si è in attesa dell'approvazione della PVS da parte del RUP	AVVIATI LAVORI		DRPC	GEOMERID			n. 301 del 28/06/2012	€ 2.930.000,00	€	n. 15 del 11/01/2013	€ 2.412.808,79	Geom. Vittorio Ricciardi (Comune)	Decreto Commissariale n. 171 del 17/04/2012	Arch. Francesco Giuseppe Fricano	Ing. Sandro Orlando				




ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	Descrizione Intervento				Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento															
			FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo		n. e data	importo				
ME	115_3	Sant'Angelo di Brolo	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento e regimazione idraulica - Centro urbano	€ 2.500.000,00	€ 2.070.000,00	L'intervento originariamente finanziato per un importo complessivo pari a € 8.000.000, è stato scarparato, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato di Indirizzo e Controllo del 24 febbraio 2011, in 3 interventi. Con nota prot.n.425 del 10.02.2012 la progettazione è stata affidata ad Invitalia. In data 21.03.2012 il DRPC ha trasmesso copia dei risultati delle indagini geognostiche e geotecniche effettuate propedeutiche alla progettazione. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati. A seguito della riunione del 03/04/2012 si è ritenuto di destinare una quota parte del finanziamento relativo all'intervento ME115_3 (€ 430.000,00) alla realizzazione dello stralcio dell'intervento ME115_2 Con nota prot. 2394 del 28/06/2012 il Commissario, a seguito di richiesta di CGIAM, ha chiesto al DRPC di voler fornire integrazioni allo studio geologico già effettuato, ad oggi non pervenute. A seguito di riscontro negativo alle determinazioni richieste, il Commissario, con nota prot.3332 del 06/09/2012, ha invitato il Dott. Geol. Filippo Cappotto a fornire supporto al gruppo di progettazione per la stesura del progetto esecutivo. Il Dott. Geol. Filippo Cappotto, con nota prot.n. 4808 del 20/11/2012 ha trasmesso all'Ufficio del Commissario le integrazioni geologiche richiestegli. In data 02/05/2013, con nota prot.n. 2514, Invitalia trasmette copia del Progetto esecutivo. A seguito della Conferenza dei Servizi del 23/05/2013, sono stati acquisiti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento. Con Decreto n. 456 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento, e con D. C. n. 505 del 02/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito alla procedura negoziata. Con D.C. n. 679 del 28/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Diva srl. In data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto. Con Decreto n. 843 del 10/10/2013 sono state impegnate le somme necessarie.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	CGIAM INVITALIA	INVITALIA	METE.RO	DIVA srl	-	456 - 18/06/2013	€ 2.069.505,23	€ 494,77	843 - 10/10/2013	€ 1.580.612,53	Geom. Tindaro Pino Scaffidi (Comune)	Decreto Commissariale n. 172 del 17/04/2012	Dott. Geol. Giuseppe Lombardo	Ing. Gianluca Coroneo
ME	116	Savoca	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.195.875,88	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 73 del 22/2/2011 per un importo di euro 1.195.875,88. I lavori sono stati affidati alla Cadore Asfalti s.p.a. Belluno con un ribasso d'asta pari al 23,1. Il contratto è stato stipulato in data 09/03/2012	Contratto stipulato			Cadore Asfalti s.p.a. Belluno	N. 73 DEL 22/02/2011	€ 1.195.875,88									
ME	117_1	Scaletta Zanclea	B	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guidomandri Superiore Codice PAI 102-55Z-016 codice PAI 102 55Z 016	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 36 del 31/01/2013	Intervento finanziato														
ME	117_2	Scaletta Zanclea	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guidomandri Superiore Codice PAI 102-55Z-020 codice PAI 102 55Z 020	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Intervento finanziato con DDG. N. 37 del 31/01/2013	Intervento finanziato														
ME	117_3	Scaletta Zanclea	B	A	Ministero	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di messa in sicurezza degli insediamenti abitativi di Scaletta Superiore, della fraz. Divieto e della c/da Guidomandri Superiore Codice PAI 102-55Z-024 codice PAI 102 55Z 024	€ 1.300.000,00	€ -	Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il finanziamento dell'intervento ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi è il ME117_3. Si procede pertanto alla revoca del relativo finanziamento	INTERVENTO REVOCATO														
ME	118	Scaletta Zanclea	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Sistemazione idraulica a monte del centro abitato - Zona Torrente Divieto Codice PAI 102-55Z-020	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	Nel corso della riunione del 15 settembre 2011 il Comitato decide di riaccendere il finanziamento dell'intervento ME118 erroneamente revocato nel corso della riunione del 24 febbraio. L'intervento che riceve copertura finanziaria con altri fondi è il ME117_3	Progetto ancora non pervenuto														
ME	119	Sinagra	A	A	Ministero		Drenaggi e consolidamento versanti - Contrada Farano	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 295/UC del 11/03/2011 in virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con note acquisite ai prott. n. 753 del 07/03/2012, e 2781 del 18/07/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati. Con nota acquisita al prot. n. 1900 del 29/05/2012, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari, vistato dal RUP in data 10/07/2012. Con D.C. n. 437 del 03/09/2012 sono state finanziate e approvate le specifiche tecniche offerenti il piano di indagini preliminari. A seguito delle procedure di gara, con D.C. n. 486 del 24/09/2012 il Commissario ha disposto l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari ad oggi concluse. In data 04/03/2013, con nota prot.n. 1326, la CGIAM trasmette relazione geologica provvisoria ed i relativi elaborati. A seguito della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 11/09/2013 risultano acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo. Con Decreto Commissariale n. 764 del 24/09/2013 è stato finanziato l'intervento.	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	CGIAM INVITALIA	INVITALIA	GEO PLANTS Sr	-	n. 764 del 24/09/2013	€ 2.972.159,55	€ 27.840,45	-	-	Ing. Cappotto (UTC)	Decreto Commissariale n.27 del 23.02.2011	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicolichia		
ME	120	Sinagra	A	A	Ministero		Opere di regimazione idraulica e consolidamento con paratia - Zona Martini	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	In data 26.02.2011 la progettazione è stata affidata al Comune. Con nota prot. 975 del 28/06/2011 è stato sollecitato il Comune alla trasmissione del progetto esecutivo. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha restituito i dati dei rilievi effettuati.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	CGIAM	Comune	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto Commissariale 28 del 23-02-2011	Geom. Ferrante
ME	121	Sinagra	A	A	Ministero		Drenaggi e gabbioni - C.da Mulinozzo	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	In data 26.02.2011 l'incarico di progettazione è stato affidato al Comune. Il comune, con nota prot. 1216 del 25/07/2011, ha richiesto autorizzazione per conferimento incarico di revisione dello studio geologico. L'Ufficio del Commissario ha richiesto al Comune con nota prot.n. 594 del 22.02.2012, apposita relazione attestante gli adempimenti posti in essere al fine di realizzare i lavori il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2946 del 31/07/2012, ha trasmesso al RUP copia delle specifiche tecniche relative alle indagini geognostiche per la convalida di competenza. Le indagini sono state affidate dallo stesso Comune in data 04/10/2012. In data 14/06/2013, con nota prot.n. 3574, il Comune trasmette n. 5 copie del Progetto Esecutivo. A seguito della cds tenutasi in data 08/07/2013 sono concessi 7 gg ai progettisti per adeguare il progetto a quanto richiesto dall'ARTA (Serv. 3) e dalla Soprintendenza BB.CC.AA.	ADEGUAMENTO DEL PROGETTO IN CORSO	-	Comune	SGM srl	-	-	-	-	-	-	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto Commissariale n. 26 del 23.2.2011	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicolichia		
ME	122	Spadafora	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.330.000,00	€ 1.327.891,32	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 571 del 31/8/2010 per un importo di euro 1.327.891,32. I lavori sono stati affidati alla ATI Imp. Rubino s.r.l. Castell'Umberto - Imp. Trovato Torregrotta con un ribasso d'asta pari al 22,2222. La consegna dei lavori è avvenuta il 29/11/2011	Avviati Lavori				ATI Imp. Rubino s.r.l. Castell'Umberto - Imp. Trovato Torregrotta	29-nov-2011	N. 571 DEL 31/08/2010	€ 1.327.891,32							
ME	123	Spadafora	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Consolidamento dell'area - Fraz. S. Martino	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	lavori sono stati affidati alla PMP costruzioni srl con un ribasso d'asta pari a 26,178%.	Affidamento Lavori						N. 847 DEL 22/11/2011	€ 1.500.000,00							




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento								Stato Intervento		Stato avanzamento Intervento															
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINALI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL
														impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo				
ME	124	Terme Vigliatore	A	B*	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Ripascimento scogliere - Zona Terme Marchesana	€ 3.823.875,00	€ 3.823.875,00	<p>La progettazione è stata affidata al Prov. Int. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2011</p> <p>Con nota acquisita al prot.n.3021 del 30/12/2011 il Prov. Interregionale OO.PP. ha trasmesso</p> <p>Il progetto primo stralcio esecutivo e successivamente, in data 08.03.2012, ha trasmesso il progetto primo stralcio esecutivo rielaborato secondo quanto richiesto dall'ARTA Serv.1 in sede di Conferenza Servizi del 09.02.2012.</p> <p>Il Commissario con nota prot. 962 del 22/03/2012, ha trasmesso il progetto all'ARTA serv. 3 al fine dell'emissione del Decreto di finanziamento.</p> <p>In data 11-09-2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso D.D.G. n. 390 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 289 del 23/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo.</p> <p>Con nota prot. n. 3459 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. di finanziamento al Provveditorato Interregionale OO.PP Sicilia e Calabria invitandolo ad attivare, in tempi brevi l'iter di affidamento dei lavori.</p> <p>In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4275, il RUP comunica l'aggiudicazione dei lavori a favore della Pacos srl (ribasso del 10,21%).</p> <p>I lavori sono stati consegnati il giorno 16/11/2012 ed avranno una durata di circa di 240 giorni.</p> <p>Con Decreto n. 852 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Pacos srl.</p>	AVVIATI LAVORI	Prov.to Int.Le OO.PP.	Prov. Int. OO. PP. Sicilia e Calabria	-	Pacos Srl	16-nov-2012	0-Jan-00	€ 0,00	-	-	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Nota in uscita prot.n. 489 del 03/11/2010	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)		
ME	125	Tortorici	A	A	Ministero	-	Muri e paratie montevalle e opere idrauliche - Zona Lembo-Pellizza	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	<p>A seguito di procedura di gara, la progettazione è stata affidata, con Decreto Commissariale n. 182 del 09.08.2011 ad un professionista esterno.</p> <p>Con Decreto n. 250 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività.</p> <p>Con nota prot.n. 515 del 16.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n.943 del 21/03/2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo.</p> <p>In sede di Conferenza di Servizi del 29/05/2012 sono stati acquisiti i pareri degli Enti con prescrizioni ed il progetto rielaborato in ottemperanza alle stesse è stato acquisito al prot. n. 2351 in data 27/06/2012.</p> <p>A seguito di validazione del progetto da parte del RUP, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 592 del 08/11/2012.</p> <p>A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 271 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Società ITAL PROGET S.R.L. (ribasso pari al 30,1982%).</p> <p>In data 31/05/2013 si provvederà alla formale consegna dei lavori.</p> <p>Con Decreto n. 784 del 27/09/2013 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	AVVIATI LAVORI	-	Ing. Mario Saitta (Figura Esterna)	GEOMERID s.r.l.	ITAL PROGET S.R.L.	-	n. 592 del 08/11/2012	€ 1.452.238,14	€ 47.761,86	784 - 27/09/2013	€ 1.019.259,96	Geom. Calanni R. Carmelo (UTC)	D. C. n. 143 del 02.04.2012	Ing. Giampiero Di Magro	Ing. Mario Saitta (Figura Esterna)
ME	126	Tortorici	A	A	Ministero	-	Muri su pali e raccolta acque - Zona S. Antonio-Scaortino	€ 500.000,00	€ 500.000,00	<p>A seguito di procedura di gara la progettazione è stata affidata in data 25.08.2011 a professionista esterno.</p> <p>Con Decreto n. 334 del 24.11.2011, è stata affidata la realizzazione del piano di indagini preliminari ad oggi completato.</p> <p>Con nota prot.n. 624 del 24.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 1303 del 18.04.2012 il progettista ha trasmesso copia del progetto esecutivo.</p> <p>In sede di Conferenza di Servizi del 11.07.2012 il RUP si è impegnato a portare a termine il procedimento finalizzato alle procedure espropriative.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 2672 del 12/07/2012, l'ARTA Serv. 3 ha richiesto documentazione integrativa al fine di poter esprimere il parere di propria competenza.</p> <p>In data 19/09/2012 il RUP ha trasmesso il Verbale di Verifica e di Validazione del progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto n. 573 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 242 del 02/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Matina Geom. Giovanni</p> <p>In data 06/06/2013 è avvenuta la formale consegna dei lavori.</p> <p>Con Decreto n. 769 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.</p>	AVVIATI LAVORI	-	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)	S.G.M. SOCIETA' GEOGNOSTICA MEDITERRANEA SRL	Matina Geom. Giovanni	06-giu	573 - 06/11/2012	€ 473.375,06	€ 26.624,94	769 - 25/09/2013	€ 363.140,93	Geom. Calanni R. Carmelo (UTC)	D. C. n. 144 del 02.04.2012	Ing. Giampiero Di Magro	Ing. Giuseppe Puglisi (Figura Esterna)
ME	127	Tortorici	A	B*	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Muri e paratie monte valle e opere idrauliche - Zona S.Paolo	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	<p>Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2564 del 09/07/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato all'Ufficio del Commissario di averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto.</p> <p>Con nota prot. n. 2565 del 09/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa.</p> <p>Con nota acquisita al prot.n. 2761 del 17.07.2012 il Comune ha trasmesso alla Struttura Commissariale tutta la documentazione inerente gli incarichi professionali conferiti.</p> <p>Con nota prot.n. 3197 del 23.08.2012 il RUP ha chiesto al Commissario la disponibilità di figure professionali a cui affidare la redazione dello studio geologico e quant'altro di supporto alla progettazione definitiva ed esecutiva.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n.3293 del 03/09/2012, ha comunicato al RUP il nulla osta all'immediato avvio delle procedure per il conferimento del nuovo incarico.</p> <p>In data 04/12/2012, con nota prot.n. 5106, il RUP ha trasmesso al Commissario richiesta di integrazioni al piano di indagini originario ricevuta dalla RTI Dinamica srl - Studio Colonna srl.</p> <p>In data 13/03/2013, con nota prot.n. 1577, il RUP trasmette alla Struttura Commissariale il preventivo del programma delle indagini geognostiche integrative.</p> <p>Con Decreto n. 491 del 27/06/2013 sono state approvate le specifiche tecniche del piano di indagini preliminari</p> <p>Con Decreto n. 563 del 15/07/2013 viene disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini integrative a favore della GEO PLANTS S.r.l che ha offerto un ribasso percentuale pari al 47,2125%.</p> <p>In data 06/08/2013 viene sottoscritto il Verbale di Consegna delle Aree alla Geo Plants srl, ed in data 04/09/2013 sono state ultimate le attività della stessa.</p>	PROGETTAZIONE IN CORSO	-	-	GEO PLANTS S.r.l	-	-	-	€ 0,00	-	-	Geom. Calanni Carmelo (UTC)	D.C. n. 489 del 27/06/2013	0		






ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento									Stato Intervento		Stato avanzamento Intervento																	
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL			
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo						
ME	128	Tortorici	A	A	Ministero		Muri e barriere paramassi - Zona Batana-Pagliaro-S.Leone	€ 500.000,00	€ 500.000,00	A seguito di procedure di gara la progettazione è stata affidata con Decreto Commissariale n. 181 del 09.08.2011 a professionista esterno. Con Decreto n. 251 del 03.10.2011 la realizzazione del piano di indagini preliminari alla progettazione è stata affidata alla ditta Geomerid, che ad oggi ha completato le attività. In data 10.02.2012 è stato trasmesso al progettista lo studio geologico esecutivo, redatto sulla base delle risultanze delle indagini preliminari, ai fini del completamento della progettazione. Con nota acquisita al prot. n.2048 del 07/06/2012 il progettista incaricato ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della Conferenza di Servizi del 25/06/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2758 del 17/07/2012 ha trasmesso il verbale di verbale di verifica e validazione e l'attestazione del Direttore dei lavori in merito alla immediata eseguibilità degli stessi. Con Decreto n. 574 del 06/11/2012 è stato finanziato il progetto esecutivo dell'intervento e con Decreto n. 645 del 27/11/2012 è stato approvato lo schema lettera d'invito alla Procedura di gara. Con nota prot.n. 5465 del 20/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della Aveni srl. In data 10/01/2013 è avvenuta la stipula del contratto. Con Decreto Commissariale n. 547 del 12/07/2012 vengono impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento per un importo pari ad € 344.390,16. Con Decreto n. 926 del 31/10/2013 è decretata la presa atto i Perizia di Variante, rimodulazione quadro economico ed impegno somme.	AVVIATI LAVORI	-	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)	GEOMERID s.r.l.	AVENI SRL	-	574 - 06/11/2012	€ 476.038,45	€ 23.961,55	n. 547 del 12/07/2013	€ 344.390,16	Geom. Buttafaro Carmelo (UTC)	Decreto Commissariale n. 145 del 02.04.2012	Ing. Giampiero Di Magro	Ing. Daniele Bisignani (Figura Esterna)			
ME	129	Tortorici	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento, regimazione idraulica e drenaggi - Zona via Zappulla	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n.393 del 09/07/2012.	Intervento finanziato						N. 393 del 9-lug-12	€ 3.897.104,56										
ME	130	Tusa	A	B*	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Prosecuzione della barriera soffiata a mare, interventi di ripascimento della costa e sistemazioni - Zona Castel di Tusa (viale Europa Unita)	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La progettazione è stata affidata al Prov. Interr. OO.PP. Sicilia e Calabria, in data 03.11.2010. In data 10.01.2012, con nota prot.n. 320, il Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria ha trasmesso il progetto I Stralcio esecutivo. In sede di Conferenza del 29/02/2012 sono stati acquisiti i pareri con prescrizioni ed il Prov. Interr. OO.PP., con nota acquisita al prot.n. 1000 del 23.03.2012, ha trasmesso il progetto rielaborato inoltrato dal Commissario all'ARTA, con nota prot.n. 1023 del 27.03.2012, ai fini dell'emissione del Decreto di Finanziamento. In data 11/09/2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 389 del 09.07.2012 con cui è stato modificato e sostituito l'art. 6 del D.D.G. n. 290 del 24/05/2012 di finanziamento del progetto esecutivo. Con nota prot. n. 3460 del 12/09/2012, il Commissario ha trasmesso i D.D.G. al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria invitandolo ad attivare, in tempi brevi, l'iter di affidamento dei lavori. In data 23/10/2012, con nota assunta al prot.n. 4276, il RUP ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori. I lavori sono stati consegnati in data 16/11/2012 ed avranno una durata di circa 240 giorni. Con DDG n. 577 viene finanziata la Perizia di Variante dell'intervento. Con Decreto n. 847 del 11/10/2013 viene disposto il pagamento del SAL n. 1 e 2 alla ditta Costruzioni Bruno Teodoro spa.	AVVIATI LAVORI	Prov.to Int.Le OO.PP.	Prov. Interr. OO. PP. Sicilia e Calabria	Costruzioni Bruno Teodoro spa	16-nov-2012	0-Jan-00	€ 0,00			Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)	Nota in uscita prot.n. 491 del 03/11/2010	Ing. Pietro Viviano (OO.PP.)						
ME	131	Ucria	B	B*	Regione		Consolidamento del Centro Urbano in località Vasile - Belvedere	€ 1.261.000,00	€ 1.261.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2847 del 23/06/2012 l'ARTA Serv.3 ha comunicato al Commissario averlo individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Con nota prot. n. 2904 del 27/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo corredato dalla documentazione amministrativa. Con nota prot. n. 3039 del 03/08/2012 il Comune ha trasmesso all'Ufficio del Commissario copia del progetto esecutivo, datato 05/07/2010, e di tutti atti amministrativi richiesti. In data 23/04/2013, con nota prot.n. 2370, l'Ufficio del Commissario trasmette all'ARTA copia del progetto, affinché lo stesso possa procedere all'emissione del parere di propria competenza. Con nota prot.n. 4879 del 08/08/2013 l'ARTA comunica che il progetto ricevuto non ha i requisiti di G.P.1.	PROGETTAZIONE IN CORSO		Ing. Cosentini Matteo				€ 0,00			Geom. Gianfranco Vinciullo	0	0						
ME	132	Ucria	A	A	Ministero		Consolidamento mediante paratia a protezione dei fabbricati opere di drenaggio - Zona via Annunziata	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata a INVITALIA in data 09.05.2011. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche per la realizzazione del piano di indagini preliminari. Con Decreto Commissariale n. 129 del 26.03.2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del Piano di Indagini preliminari ed il contratto è stato firmato in data 04/04/2012. In data 23/10/2012, con nota acquisita al prot.n. 4240, la CGIAM ha trasmesso la Relazione Geologica de-l'intervento. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 773 del 05/02/2013 il GDL IAP ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 08/03/2013, e del parere espresso dal GC di Me, con nota prot.n. 1790 del 25/03/2013, sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto. In data 06/06/2013 i Progettisti, con nota prot.n. 3457, trasmettono il Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo rimodulato. Con Decreto n. 458 del 18/06/2013 è approvato e finanziato il progetto esecutivo dell'intervento. Con Decreto n. 676 del 27/08/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della Geo Drilling Srl (ribasso del 32,9999%). In data 30/10/2013 è avvenuta la consegna dei lavori.	AVVIATI LAVORI	CGIAM INVITALIA	INVITALIA	S.G.M.srl	Geo Drilling Srl	30-ott	458 - 18/06/2013	€ 959.845,87	€ 1.540.154,13			Ing. Sidoti Pinto Benedetto	Decreto Commissariale n. 563 del 26/10/2012	Geom. Domenico Rigoli	Ing. Antonino Scutteri			
ME	133	Valdina	B	B	Regione		Protezione, Consolidamento e sistemazione idrogeologica dell'abitato di Valdina Centro - versante Est	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 211 del 6/4/2011 per un importo di euro 2.000.000,00. I lavori sono stati affidati alla ATIN ASC srl con un ribasso d'asta pari al 24,3987.	Contratto stipulato				ATIN ASC srl		N. 211 DEL 06/04/2011	€ 2.000.000,00										
ME	134	Venetico	B	B	Regione		Consolidamento del centro abitato	€ 1.554.100,81	€ 1.554.100,81	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 492 del 7/7/2011 per un importo di euro 1.554.100,81. L'impresa Renzo Costruzioni srl è risultata aggiudicataria dei lavori, che hanno avuto inizio in data 07/06/2013	Avviati Lavori				Renzo Costruzioni srl	7-lug-2013	N. 492 DEL 06/07/2011	€ 1.554.100,81										
ME	176	Giardini Naxos	B	B	Regione	COMITATO 24 MAR 2011	Erosione costiera	€ 1.400.000,00	€ 1.400.000,00	Istruttoria in corso	Istruttoria Progetto																	




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento										Stato Intervento				Stato avanzamento Intervento													
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL		
														impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo						
ME	177_Int	Brolo	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Consolidamento e salvaguardia fabbricati Cda Iannello Alto	€ 600.000,00	€ 600.000,00	L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo. In virtù dell'accordo quadro stipulato, la CGIAM, con nota assunta al prot. n. 498 del 16/02/2012, ha trasmesso i prodotti di restituzione dei rilievi effettuati. Con nota prot. n. 1336 del 19/04/2012 il Commissario ha affidato la progettazione a INVITALIA. In data 31/01/2013, con nota prot.n. 659, CGIAM trasmette le specifiche tecniche ed i relativi elaborati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione delle indagini. Con D. C. n. 140 del 27/02/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano d'indagini, che hanno avuto luogo da giorno 12/03/2013, e sono state portate a termine il 29/03/2013. In data 23/05/2013, con nota prot.n. 3066, Invitalia trasmette copia del progetto esecutivo. A seguito della CdS tenutasi giorno 06/06/2013 e dei pareri acquisiti, con nota prot.n. 3586 del 17/06/2013 il RUP trasmette Verbale di Verifica e Validazione del Progetto Esecutivo. Con Decreto n. 502 del 02/07/2013 è stato finanziato l'intervento, e con D.C. n. 522 del 09/07/2013 è avvenuta l'approvazione dello schema lettera d'invito. Con Decreto n. 620 del 30/07/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori alla AEMME S.r.l., risultata aggiudicataria a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 31,7373%. In data 10/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto. Con Decreto n. 766 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	CGIAM INVITALIA	INVITALIA	Geo Plants srl	AEMME Srl	-	502 - 02/07/2013	€ 599.808,08	€ 191,92	766 - 25/09/2013	€ 432.876,41	Arch. Mario Messina (UTC)	D.C. n. 357 del 17.07.2012	Dott. Francesco Barranco	Ing. Basilio Ridolfo		
ME	178	Capri Leone	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Protezione e ripascimento litorale (2° lotto)	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Il progetto è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune. Il Comune con nota prot. n. 1273 del 13/04/2012 ha trasmesso la documentazione relativa al conferimento degli incarichi per lo studio geologico e per la progettazione ed il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3043 del 06/08/2012 il progettista incaricato ha trasmesso progetto esecutivo dell'intervento. A seguito della CdS tenutasi giorno 30/10/2012 e dei pareri conseguentemente acquisiti, si è in attesa dell'adeguamento del progetto a quanto richiesto dall'ARTA Serv. 3 in data 14/12/2012, con nota prot.n. 5356. A seguito del Tavolo Tecnico tenutosi in data 09/01/2012 e del parere espresso dall'ARTA Serv. 3, con nota prot.n. 321 del 17/01/2013, si intendono acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento. Con Decreto Commissariale n. 79 del 06/02/2013 è stato finanziato l'intervento. Con nota prot.n. 1912 del 29/03/2013, il Commissario invia ai vari Enti richiesta di autorizzazione all'occupazione temporanea del tratto di costa oggetto dell'intervento. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con D. C. n. 272 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori a favore della Società 'C.T.F. S.R.L. (ribasso percentuale del 29,8728%). Il RUP e l'aggiudicataria dei lavori giorno 06/05/2013 sottoscrivono l'art. 106 c. 3 Regolamento DPR 207/2010. In data 28/06/2013 è avvenuta la consegna dei lavori. Con Decreto n. 617 del 30/07/2013 è stato disposto l'impegno somme.	AVVIATI LAVORI	-	pH3 Engineering s.r.l	Biosurvey	C.T.F. srl	28-Jun-13	n. 79 del 06/02/2013	€ 1.000.000,00	€ -	723 - 11/09/2013	€ 672.617,55	Arch. Gianpiero Di Magro	D.C. n. 376 del 19.07.2012	Geom. Piero Nicolichia	Ing. Salvatore Zaccaro		
PA	135	Altofonte	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 800.000,00	€ 789.270,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 143 del 10/3/2011 per un importo di euro 789.270,00. I lavori sono stati affidati alla Ditta Geom. Carmelo Cangemi con un ribasso d'asta pari al 23,8727. Il Contratto è stato stipulato in data 29/02/2012 e la consegna lavori è avvenuta l'11/04/2012	Avviati Lavori	-	-	-	Geom. Carmelo Cangemi	11-apr-2012	N. 143 DEL 16/03/2011	€ 789.270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
PA	136	Belmonte Mezzagno	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011	Opere di consolidamento del canale di gronda, regimazione corsi d'acqua e revisione canale a protezione del centro urbano	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	La progettazione è stata affidata al DRPC di Palermo con nota prot. n. 694 del 24/11/2010. A seguito della nota del Commissario prot. n. 3298 del 03/09/2012, con cui sollecitava il DRPC di Pa a trasmettere il progetto esecutivo, con nota acquisita al prot. n. 5511 del 21/12/2012 il RUP trasmette all'Ufficio del Commissario n. 2 copie del progetto. A seguito della CdS tenutasi in data 07/02/2013 si resta in attesa dei pareri non ancora pervenuti. Con nota prot. n. 1869 del 27/03/2013 il Commissario sollecita l'ARTA Serv.1 al rilascio del parere di competenza. Con Decreto Commissariale n. 387 del 28/05/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva inerente il Piano di indagini Preliminari a favore della Geo Services Trivellazioni e Sondaggi srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 43,1999%. Con D.C. n. 460 del 18/06/2013 si è provveduto a finanziare ed impegnare le somme necessarie per la realizzazione del piano di indagini. In data 30/07/2013, con nota prot.n. 4616, l'aggiudicataria delle indagini trasmette alla Struttura Commissariale i risultati delle stesse.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	DRPC	DRPC Pa	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.R.L.	-	-	-	€ -	€ -	-	-	Ing. Angelo Alferi (DRPC PA)	n.42 del 22/01/2013	Sig.ra Teresa Marano (DRPC)			
PA	137_1	Blufi	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di sistemazione idraulica burrone San Domenico Malpasso e consolidamento del centro urbano	€ 1.310.000,00	€ 1.310.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011. A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 67 del 24/05/2011. A seguito dell'espletamento di gara con Decreto Commissariale n. 300 del 27/10/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore della CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI. La consegna dei lavori è avvenuta il 06/12/2011. A seguito della richiesta avanzata dalla D.L. di autorizzazione alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, autorizzata dal RUP con nota prot. n.1934 del 31/05/2012, la stessa DL ha trasmesso la perizia assunta al prot. n. 2863 del 24/07/2012 ed approvata dal RUP in data 29/08/2012. Con Decreto Commissariale n. 443 del 06/09/2012 si è provveduto a prendere atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e della rimodulazione del quadro economico di impegno delle somme. I lavori sono ultimati in data 31/10/2012.	LAVORI ULTIMATI	-	Comune	-	CEIT di GIUSEPPE MAMMOLITI	6-dic-2011	n. 67 del 24/05/2011	€ 1.310.000,00	€ -	n. 348 del 30/11/2011	€ 1.067.015,52	Ing. Giuseppe La Placa	D.C. n.25 del 23/02/2011	Geom G. Ferrante Geom P.Nicolichia Dott. F. Barranco	Ing. Michele Zafonti		
PA	137_2	Blufi	A	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di consolidamento del centro urbano a monte e a valle del quartiere Macelli	€ 690.000,00	€ 690.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune, che ha trasmesso il progetto esecutivo in data 29/03/2011. A seguito dell'acquisizione di tutti i pareri e validazione, il progetto è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 87 del 10/06/2011. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 158 del 29/07/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori avviati in data 07/09/2011. Con nota acquisita al prot. n.493 del 16/02/2012 la D.L. ha evidenziato la necessità di effettuare nuovi lavori da inserire in una perizia di variante e suppletiva, la cui stesura è stata autorizzata dal RUP con nota prot. n.549 del 20/02/2012. La PVS è stata trasmessa dalla DL con nota acquisita al prot. n. 843 del 15/03/2012, approvata dal RUP in data 19/03/2012 e ratificata dal Commissario con Decreto n. 146 del 02/04/2012. I lavori sono ultimati in data 29/03/2012.	LAVORI ULTIMATI	-	Comune	-	Arcobaleno 3000 Srl	7-set-2011	n. 87 del 10/6/2011	€ 690.000,00	€ -	n.246 del 28/09/2011 così come modificato dal Decreto n. 146 del 2/04/2012 di presa atto PVS e rimodulazione QE	€ 558.878,57	Ing. Giuseppe La Placa	Decreto Commissariale n. 24 del 23/02/2011	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante Geom. Piero Nicolichia	Ing. Michele Zafonti		




ELENCO INTERVENTI A e B

PROV	COD	COMUNE	Descrizione Intervento			Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																		
			FONDI ORIGINALI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL		
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo		n. e data	importo						
PA	138	Caltavuturo	B	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 24 MAR 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Consolidamento centro abitato	€ 811.000,00	€ 793.690,51	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 252 del 18/4/2011 per un importo di euro 793.690,51. I lavori sono stati affidati alla Torsten Costruzioni con un ribasso d'asta pari al 23,2553. Il Contratto è stato stipulato in data 22/03/2012 e la consegna lavori è avvenuta l'02/02/2012	Avviati Lavori					Torsten Costruzioni Srl	2-feb-2012	N. 252 DEL 18/04/2011	€ 793.690,51								
PA	139	Campofelice di Roccella	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento - C/da Belvedere	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Intervento finanziato con DDG.n. 39 del 31/01/2013	Intervento finanziato																
PA	140	Camporeale	A	B*	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento centro abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 4858 del 07/08/2013 l'ARTAS Serv. 3 comunica che l'Ufficio del Commissario è stato individuato come Ente Beneficiario dell'intervento. Il GC di Pa con nota acquisita agli atti al prot. n. 5130 del 30/08/2013 trasmette n.5 copie del progetto esecutivo. A seguito del tavolo tecnico si resta in attesa che il Comune proceda a richiedere l'impilamento dell'opera PAL.	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	0	Ing. Giuseppe Nogara GC Pa	0	0	-	-	€ 0,00	€ 0,00	-	-	Ing. Manlio Munafo (GC Pa)	Nota prot. n. 139260 del 17/04/2013	Arch. Giovanni Lo Cascio			
PA	141	Capaci	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Consolidamento centro abitato	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	Facendo seguito alle determinazioni del Comitato del 24/02/2011 che hanno determinato il passaggio dell'intervento in A, l'ARTAS, con nota acquisita al prot. n.528 del 18/04/2011 ha trasmesso tutta la documentazione tecnico-amministrativa dell'intervento. La progettazione è stata effettuata da progettisti esterni incaricati dal Comune. In data 07/11/2011 l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ha fornito indicazioni per la definizione delle problematiche relative agli affidamenti degli incarichi in epoca precedente all'introduzione della disciplina che ha previsto l'obbligo del ricorso a procedure concorsuali. Con Decreto Commissariale n.180 del 23/04/2012 il Commissario ha acquisito il progetto I stralcio esecutivo. A seguito della conferenza dei servizi del 30/05/2012 sono stati conseguiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento. Con nota acquisita al prot. n. 2902 del 27/07/2012 il RUP ha trasmesso gli atti di approvazione e validazione del progetto. Con Decreto Commissariale n. 410 del 02/08/2012 è stato finanziato l'intervento. Con Decreto Commissariale n. 522 del 08/10/2012, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. In data 23/01/2013 è stato stipulato il contratto. Con nota acquisita al prot. n. 1513 del 11/03/2013, il D.L. comunica all'impresa Zaccaria Costruzioni che in data 18/03/2013 si procederà alla consegna dei lavori. Con Decreto Commissariale n. 179 del 11/03/2013 si è provveduto ad impegnare le somme. A seguito della CdS del 12/09/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari all'approvazione della Perizia di Variante.	AVVIATI LAVORI	-	Dott Ing Carlo Barbuza (fig. esterna)	-	ZACCARIA COSTRUZIONI Srl	24-mag-2013	n. 410 del 02/08/2012	€ 1.200.000,00	€ -	n. 179 del 11/03/2013	€ 944.262,41	Ing. Giuseppe Lo lacono	Decreto Commissariale n.131 del 22/02/2013	Geom. Giuseppe Ferrante	Dott Ing Carlo Barbuza (fig. esterna)		
PA	142	Carini	A	A	Ministero		Barriere paramassi - Zona Industriale	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	Con nota prot. n. 520 del 18/04/2011 la progettazione è stata affidata ad INVITALIA, mentre con nota prot. n. 2759 del 05/12/2011, i rilievi propedeutici alla progettazione sono stati affidati al Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo "CGIAM". Con nota acquisita al prot. n. 3513 del 11/03/2012 la CGIAM ha trasmesso le specifiche tecniche ed i relativi allegati riguardanti il programma operativo per l'esecuzione del piano di indagini preliminari. Con Decreto Commissariale n. 589 del 07/11/2012 sono state approvate le specifiche tecniche offerte dal Piano di Indagini Preliminari e con Decreto Commissariale n. 663 del 03/12/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione delle stesse a favore dell'impresa GEO R.A.S. S.r.l., in data 19/12/2012 è stato stipulato il contratto. In data 29/12/2012 è avvenuta la consegna delle aree e l'inizio delle attività. Con nota acquisita al prot. n. 723 del 01/02/2013, la GEO RAS trasmette n. 3 copie cartacee degli elaborati inerenti ai report delle indagini svolte. Con nota acquisita al prot. n. 2642 del 08/05/2013 il GdL IAP ha trasmesso il progetto esecutivo. A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento. Co Decreto Commissariale n. 583 del 18/07/2013 si provvede ad approvare e finanziare l'intervento per un importo complessivo pari ad € 976.967,14. Con Decreto Commissariale n. 590 del 22/07/2013 viene predisposta l'occupazione anticipata d'urgenza preordinata all'espropriazione. Con Decreto Commissariale n. 677 del 27/08/2013 il Commissario dispone l'aggiudicazione definitiva dei lavori a favore dell'impresa CONSORZIO TRIVENETO che ha offerto un ribasso pari al 35,8978%.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	CGIAM INVITALIA	INVITALIA	GEO R.A.S. S.r.l.	CONSORZIO TRIVENETO	-	n. 583 del 18/07/2013	€ 976.967,14	€ 23.032,86	-	-	Geom. Salvatore Bellia	D.C. n. 850 del 11/10/2013	Dott. Francesco Barranco Geom. Giuseppe Ferrante	Ing. Michele Zafonti.		
PA	143	Castelbuono	A	A	Ministero		Opere di drenaggio e consolidamento - C.da Liccia	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è affidata al GC di Palermo. Con nota prot. n.978 del 28/06/2011 è stato sollecitato il GC alla trasmissione del progetto esecutivo. Con nota del 02/11/2011 il GC Pa ha chiesto al Dott. Antonio Rubino di poter acquisire lo studio geologico-tecnico eseguito per conto della Procura della Repubblica e di poterlo utilizzare a supporto della progettazione esecutiva. A tutt'oggi è in corso una campagna di monitoraggio finanziata dal DRPC di PA di cui si resta in attesa dei risultati. Il Commissario, facendo seguito alla nota prot. n. 3961 del 09/10/2012, con la quale concedeva al GC di Pa 20 giorni per la trasmissione del progetto esecutivo PA 143 A-Castelbuono "Opere di drenaggio e consolidamento c.da Liccia", con nota prot. n. 4369 del 29/10/2012 ha revocato tutti gli incarichi finalizzati alla realizzazione delle opere, compreso quello di RUP. Il Commissario con nota prot. n. 4370 del 29 ottobre 2012 ha affidato la progettazione a INVITALIA, che ha comunicato il GdL con nota acquisita al prot. n. 4438 del 31/10/2012. Il Commissario, con nota prot. n. 5232 del 10/12/2012 ha chiese alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, di poter acquisire copia della consulenza tecnica al fine di ottenere dati e informazioni utili alla realizzazione dell'intervento. Con nota acquisita al prot. n. 1280 del 26/02/2013 la CGIAM trasmette n. 2 dischi DVD contenenti i prodotti risultanti dai rilievi aerei. Con Decreto Commissariale n. 273 del 11/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per realizzazione del Piano di indagini Preliminari a favore dell'impresa GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l. (ribasso percentuale del 46,9999 %) Con nota acquisita al prot. n. 3799 del 24/06/2013 la CGIAM trasmette all'Ufficio del Commissario i documenti relativi all'approvazione della relazione geologica ed i relativi elaborati riguardanti le "Opere di drenaggio e consolidamento C.da Liccia nel Comune di Castelbuono". Con nota acquisita al prot. n. 4131 del 09/07/2013 la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo redatto dal GdL. A seguito delle richieste di integrazioni emerse in sede di CdS del 31/07/2013 e richieste dal RUP, con nota acquisita agli atti al prot. n. 4772 del 02/08/2013, il Gruppo di progettazione IAP, trasmette gli elaborati integrativi.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	INVITALIA	INVITALIA	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI S.r.l.	FERRARO IGNAZIO	-	n. 808 del 08/10/2013	€ 1.978.972,49	€ 21.027,51	-	-	Ing. Santi Sottile	D.C. n. 576 del 06/11/2012	Dott. Angelo Nicastro	GC Pa Incarico revocato con nota prot. n. 4370 del 29/10/2012		
PA	144	Castronovo di Sicilia	B	B	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato: versante Est a difesa della Scuola Elementare di Via Mazzini, ecc.	€ 1.600.000,00	€ 1.600.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 186 del 29/3/2011 per un importo di euro 1.600.000,00. I lavori sono stati affidati a SCF Costruzioni s.r.l. con un ribasso d'asta pari al 23,0625%. Il Contratto è stato stipulato in data 17/05/2012 e la consegna lavori è avvenuta il 22/06/2012	Avviati Lavori					SCF Costruzioni srl	22-giu-2012	N. 186 DEL 29/03/2011	€ 1.600.000,00								
PA	145	Castronovo di Sicilia	A	B	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento centro urbano	€ 1.344.000,00	€ 1.344.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 359 del 22/06/2012	Predisposizione atti di gara							n. 359 del 22-giu-12	€ 1.291.335,45								




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento										Stato Intervento				Stato avanzamento Intervento																							
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL												
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo															
PA	146	Geraci Siculo	B	B	Regione		Progetto di consolidamento della zona nord orientale	€ 1.057.000,00	€ 1.057.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 909 del 2/12/2010 per un importo di euro 1.057.000,00. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Costruzioni San Giuseppe di Lanza Vincenzo s.a.s." con un ribasso del 22,4650%. In data 24/6/2011 riapertura gara a seguito ricorso della seconda classificata. nuova aggiudicazione alla Impresa Di Maria Costruzioni srl con un ribasso del 22,4622%. Lavori avviati il 13/04/2012	Avviati Lavori				Di Maria Costruzioni srl	13-apr-2012	N. 909 DEL 02/12/2010	€ 1.057.000,00																			
PA	147	Marineo	B	B	Regione		Consolidamento centro abitato	€ 2.257.528,00	€ 2.257.528,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 290 del 3/5/2011 per un importo di euro 2.257.528,00. I lavori sono stati aggiudicati con un ribasso del 23,9653. I lavori sono stati avviati il 29/12/2011	Avviati Lavori				Giuseppe Di Lanza Vincenzo e C. Sas Catalano Francesco	29-dic-2011	N. 290 DEL 03/05/2011	€ 2.257.528,00																			
PA	148	Mezzojuso	A	B*	Regione	COMITATO 21 OTT 2010	Opere di consolidamento - Zona Collina Brigna	€ 2.144.000,00	€ 2.144.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2295 del 22/06/2012 l'ARTA ha trasmesso all'Ufficio del Commissario in quanto Ente Beneficiario il progetto e la documentazione tecnico/amministrativa relativa all'intervento invitando il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto in proprio possesso. L'ARTA Serv. 3, esaminati gli elaborati progettuali trasmessi dal Commissario con nota prot. n. 724 del 04/02/2013, trasmette il parere favorevole sulla coerenza dell'efficacia degli interventi previsti nel progetto ai fini della mitigazione della pericolosità e del rischio geomorfologico. Con Decreto Commissariale n. 224 del 26/03/2013 si è provveduto ad acquisire tutta la documentazione tecnica progettuale redatta dalla Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl nella persona del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico Ing. salvatore Miliziano. Con nota acquisita al prot. n. 2770 del 13/05/2013 la Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl ha trasmesso in formato cartaceo e digitale il progetto esecutivo rielaborato ed adeguato al nuovo prezzario regionale OO.PP. per l'anno 2013. A seguito della CdS del 05/06/2013 sono stati acquisiti i pareri necessari e con nota acquisita agli atti al prot. n. 4405 del 22/07/2013 il Dipartimento Azienda Foreste Demaniali conferma il parere positivo alla realizzazione dell'intervento e rimanda per le eventuali determinazioni di competenza alla nota a suo tempo inviata all'ARTA Serv.6. Con nota prot. n. 5231 del 05/09/2013 il Commissario comunica i componenti del gruppo di verifica del progetto esecutivo.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE		Soc. D.M.S. Geotechnical Engineering srl								€ 0,00	€ 0,00					Ing. Calogero Foti	Decreto Commissariale n. 192 del 14/03/2013	Geom. Giuseppe Ferrante								
PA	149	Misilmeri	A	A	Ministero		Opere di regimazione idraulica - C.da piano Stoppa	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La Progettazione esecutiva è stata eseguita da progettisti esterni incaricati dal Comune di Misilmeri che con nota acquisita al prot. n. 1650 del 06/09/2011, ha trasmesso il progetto. Con nota prot. n.4707 del 07/02/2012 il comune ha trasmesso all'ARTA copia del progetto esecutivo per l'emissione del parere di competenza, parere poi acquisito al prot. 1011 del 26/03/2012 con esito negativo. Il Commissario, in riscontro alla nota acquisita al prot. n. 2266 del 22/06/2012 con cui il RUP ha trasmesso unitamente alla validazione e alla Deliberazione di G.M. n. 41 del 19/06/2012 di approvazione amministrativa, il progetto esecutivo-"lotto funzionale, senza le giustificazioni e/o chiarimenti sulle procedure dell'affidamento dell'incarico professionale e senza le modifiche alle soluzioni progettuali delle opere richieste dall'ARTA Serv.3, ha ribadito che avrebbe provveduto ad avviare nuove procedure per il conferimento dell'incarico di progettazione dell'intervento. Con nota prot. n.4251 del 23/10/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011 aggiungendo l'intervento - PA 149 Misilmeri. Con Decreto Commissariale n. 274 del 12/04/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione a favore dell'Associazione Temporanea di Professionisti ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO (ribasso percentuale pari al 51,861%). In data 27/08/2013, con Decreto n. 678, è avvenuta l'approvazione delle specifiche tecniche offerenti il Piano di indagini preliminari. Con Decreto Commissariale n. 733 del 12/09/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini a favore della GEOMERID Srl (ribasso percentuale pari al 51,5000%) in data 24/09/2013 è stato stipulato il contratto.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	CGIAM	ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO	GEOMERID S.r.l					€	€			€											ATP ING. DOMENICO MAJOLINO - ING. SALVATORE MERLINO			
PA	150	Palermo	A	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di regimazione idraulica - C.da Belmonte Chiavelli	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00	In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Palermo. I lavori sono stati aggiudicati dalla ICM che ha offerto un ribasso del 25,3627	Affidamento Lavori	GC	Genio Civile							€ 4.206.186,56																	
PA	151	Partinico	B	B*	Regione		Consolidamento costone roccioso Colle Cesarò-terzo stralcio	€ 950.000,00	€ 950.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2292 del 22/06/2012 l'ARTA Serv.3 ha trasmesso tutta la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto all'Ufficio del Commissario ed ha invitato il Comune a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto. Con nota prot. n. 2531 del 06/07/2012 il Commissario ha sollecitato il Comune a trasmettere il progetto esecutivo. Con nota acquisita al prot. n.2883 del 26/07/2012 il Comune ha informato di non essere in grado di rispettare i termini di consegna richiesti per la progettazione. Con nota prot. n. 2983 del 01/08/2012 l'Ufficio del Commissario ha comunicato al Comune che in qualità di Ente Beneficiario del finanziamento, avrebbe proceduto alla redazione della progettazione ed all'espletamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione dell'opera. Con nota prot. n. 4350 del 25/10/2012 il Commissario revoca l'incarico precedentemente conferito alla CGIAM con nota prot. n. 3339/UC del 06/09/2012. L'Ufficio del Commissario con nota prot. n. 6315 del 21/10/2013 chiede al Comune di Partinico, la trasmissione del progetto preliminare.	PROGETTAZIONE IN CORSO										€ 0,00	€ 0,00					0			0							
PA	152	Petralia Sottana	A	B*	Regione	COMITATO 21 OTT 2010 COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 18 MAG 2012	Opere di consolidamento - Quartiere Casale e Scavarello	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00	A seguito del Comitato del 21/10/2010 l'intervento transita dalla lettera A alla Lettera B. Nel corso del Comitato del 24/02/2011 l'intervento transita nuovamente sotto la copertura finanziaria ministeriale. Nella seduta del Comitato di indirizzo e controllo del 18/05/2012 l'intervento transita in lettera B. Con nota acquisita al prot. n. 2254 del 21/06/2012 l'ARTA ha comunicato di aver individuato il Commissario Straordinario Delegato quale Ente Beneficiario. In data 06.08.2012 l'Arta (Serv. 3) ha trasmesso il D.D.G. n. 360 del 22.06.2012 con cui è stato finanziato il progetto esecutivo per i lavori. Con D.C. n. 433 del 29.08.2012 il Commissario prende atto del DDG n. 360 del 22.06.2012 dell'ARTA inerente il finanziamento dell'intervento. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 504 del 02/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l. (ribasso pari al 30,8684%), in data 04/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto. Con nota acquisita al prot. n. 4566 del 26/07/2013 il RUP trasmette il verbale di attestazione sull'eseguibilità dei lavori ai sensi dell'art.106 comma 3 del Regolamento n. 207/2010. Con nota acquisita al prot. n. 5924 del 03/10/2013, il RUP invita la D.L. e l'impresa aggiudicatario per il giorno 10/10/2013 per effettuare la consegna dei lavori.	AFFIDAMENTO LAVORI		Comune																					Geom. Sabatino Giovanni	D.C. n. 488 del 27/06/2013	Geom. Giuseppe Ferrante	Ing. Alessandro Sammataro




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento							Stato Intervento			Stato avanzamento Intervento																			
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL				
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo							
PA	153	Polizzi Generosa	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Opere di consolidamento del centro abitato	€ 920.000,00	€ 908.469,01	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 753 del 25/10/2010 per un importo di euro 908.469,01. I lavori sono stati aggiudicati alla QUADRIFOGLIO s.r.l. - Polizzi Generosa con un ribasso offerto pari a 21,7273%. I lavori hanno avuto inizio il 10 giugno 2011	Avviati Lavori				QUADRIFOGLIO s.r.l. - Polizzi Generosa	10-giu-2011	N. 753 DEL 25/10/2010	€ 908.469,01											
PA	154	Polizzi Generosa	A	A	Ministero		Opere di consolidamento - Zona via G.Borgese	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La progettazione è stata affidata al Genio Civile di Palermo. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara con Decreto Commissariale n. 168 del 03/08/2011 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. I lavori sono stati avviati il 14/09/2011 e sono stati completati in data 23/04/2012. Il Collaudatore Statico ha prodotto il Certificato di Collaudo Statico delle opere redatto in data 09/05/2012 Il GC PA, con nota acquisita al protocollo con n. 1921 del 30/05/2012, ha trasmesso la Perizia di Assestamento Finale, la cui presa d'atto è avvenuta con Decreto Commissariale n. 263 del 07/06/2012. Il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori è stato redatto dalla DL in data 12/07/2012.	LAVORI ULTIMATI	GC	GC Pa		CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	14-set-2011	n.39 del 31/03/2011	€ 366.497,75	€ 133.502,25	n.245 del 28/09/2011	€ 407.990,10	Ing. Vincenzo Di Rosa (Ing. Capo GC PA)	n. 483/UC del 03 novembre 2010					Ing. Giuseppe Nogara Genio Civile di PA	
PA	155	Termini Imerese	B	B	Regione	COMITATO 15 SETT 2011	Intervento di monitoraggio del centro abitato	€ 198.625,00	€ 198.196,38	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 754 del 25/10/2010 per un importo di euro 198.196,38. In data 20/5/2011 i lavori sono stati aggiudicati alla "Bellino Costruzioni S.r.l. - Cammarata" con un ribasso del 21,8288% pari ad euro 24.464,55 (lavori a base d'asta euro 112.074,65; oneri per la sicurezza euro 2.000,00).	Affidamento Lavori				Bellino Costruzioni srl Cammarata		N. 754 DEL 25/10/2010	€ 198.196,38											
PA	156	Termini Imerese	A	A	Ministero		Risagomatura argini e opere di pulpitura - Zona foce Fiume Torto	€ 800.000,00	€ 800.000,00	La Progettazione è stata affidata al D.R.P.C. di Palermo che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 1116 del 11/07/2011 e successiva integrazione con nota acquisita al prot. 1779 del 19/09/2011. A seguito della ricezione di tutti i pareri necessari il Commissario ha finanziato l'intervento con Decreto n.108 del 15/03/2012. Con Decreto Commissariale n. 215 del 11/05/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 28/06/2012 sono stati consegnati i lavori. Con D.C. n. 606 del 15/11/2012 di presa atto perizia di variante si è avuta una rimodulazione e riduzione dell'impegno di spesa In data 25/10/2012 è avvenuta l'ultimazione dei lavori.	LAVORI ULTIMATI	DRPC	DRPC Pa		SILGEO srl	28-giu-2012	n.108 del 15/03/2012	€ 800.000,00	€ -	Decreto n. 606 del 15/11/2012	€ 547.274,70	Ing. Calogero Foti (DRPC Pa)	D.C. n.116 del 20 marzo 2012						
PA	157	Valledolmo	A	A	Ministero		Opere di consolidamento - C.da Renella	€ 500.000,00	€ 500.000,00	La Progettazione è stata affidata al Comune. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara il Comune ha provveduto ad affidare i lavori. Con nota acquisita al prot. n. 1266 del 26/07/2011 il Comune ha comunicato la fine dei lavori in data 04/07/2011 e l'avvenuto collaudo statico in data 07/07/2011.	LAVORI ULTIMATI	COMUNE	Comune		CO.GEN.AP. Srl	14-mar-2011	D.C. n. 02 del 23/11/2010	€ 500.000,00	€ -	D.C. n.50 del 18/04/2011 come rimodulato dal D.C. n.108 del 29/06/2011	€ 465.000,00	Geom. Orazio Pizzolanti (Capo UTC)	determina sindacale n° 227 del 10 agosto 2010				Ing. Gioacchino Muscato (non ho trovato nessuna determina di incarico, informaz estrpolata da una nota)		
PA	179	Altofonte	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Consolidamento aree interessate da fenomeni di dissesto	€ 600.000,00	€ 600.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che ha provveduto all'affidamento a progettisti esterni. Le indagini preliminari alla progettazione sono invece state affidate dal Commissario alla CGIAM che con nota assunta al prot. n. 1256 del 12/04/2012 ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini preliminari. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 285 del 18/06/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari ed in data 03/07/2012 è stato sottoscritto il contratto. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2691 del 13/07/2012 il RUP, a seguito di un sopralluogo effettuato in data 10/07/2012, nel quale è emersa la problematica inerente la presenza di una falda vegetazionale che non consentiva l'esecuzione di un idoneo rilievo, ha chiesto all'impresa aggiudicataria di trasmettere un atto aggiuntivo al contratto principale per l'esecuzione di suddette ulteriori lavorazioni. L'impresa, con nota acquisita agli atti al prot. n. 3040 del 03/08/2012, ha trasmesso copia degli elaborati tecnici e degli elaborati relativi al piano di indagini preliminari Con nota acquisita al prot. n.521 del 24/01/2013 la CGIAM trasmette tutta la documentazione relativa alla Relazione Geologica. Il Commissario con nota prot. n. 564 del 29/01/2013 trasmette alla Mediterraneo Engineering le indagini e la relativa relazione geologica propedeutici alla progettazione. Con nota acquisita al prot. n. 1899 la PRO-GEO trasmette n. 4 copie del progetto esecutivo. A seguito della CdS del 09/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento. Con nota acquisita al prot. n. 3486 del 12/06/2013 il D.L. trasmette attestazione ai sensi dell'art. 106, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 di conformità del progetto esecutivo al permanere delle condizioni di esecuzione dell'opera. Con Decreto Commissariale n. 449 del 17/06/2013 è stato finanziato l'intervento. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 561 del 15/07/2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della URANIA srl., in data 10/09/2013 è stato stipulato il contratto di appalto.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	CGIAM	ATI MEDITERRANEA ENGINEERING-PRO-GEO	CGIAM (GEO R.A.S Srl Indagini integrative preliminari)	URANIA srl		n. 449 del 17/06/2013	€ 578.022,01	€ 21.977,99	n. 735 del 12/09/2013	€ 428.662,50	Ing. Giuseppe La Placa	D.C. n.211 del 10/05/2012	Dott. Gaetano Vinci					ATI MEDITERRANEA ENGINEERING- PRO-GEO
PA	180	Cefalù	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Messa in sicurezza movimenti franosi Loc. Testardita-	€ 90.000,00	€ 90.000,00	A seguito della convenzione stipulata in data 29/11/2011 il Commissario ha incaricato la CGIAM di predisporre le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini geologiche. Il Commissario, con nota prot. n. 2711 del 01/12/2011 ha affidato la progettazione ad INVITALIA. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 3281 del 03/09/2012 Invitalia ha trasmesso gli elaborati progettuali integrativi richiesti in sede di CdS del 23/08/2012. In riscontro alla nota della Soprintendenza BB.CCAA., nella quale dava avviso della necessità di avviare le procedure di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76 e s.s.mm.ii., pregiudiziali ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento, il RUP, con nota prot. n. 3661 del 24/09/2012, ha invitato il Comune ad attivarsi per la definizione degli adempimenti di propria competenza. A seguito della nota prot. n. 3351 del 06/09/2012, con la quale il RUP chiedeva al GdI di procedere alle verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte dalla Soprintendenza, in relazione alla natura dell'entità del dissesto, con nota prot. n. 3662 del 24/09/2012 il RUP, ha trasmesso alla Soprintendenza BB.CCAA di Pa le verifiche di compatibilità tecnica delle alternative progettuali naturalistiche proposte. Con nota prot. n. 5450 del 19/12/2012 il RUP Ing. Giuseppe Morganti trasmette al Comune di Cefalù copia cartacea del progetto esecutivo per l'avvio delle procedure di deroga ex art. 106 della L. R. 78/76 ai fini della pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. A seguito delle dimissioni dall'incarico di RUP dell'Ing. Giuseppe Morganti, con Decreto Commissariale n. 71 del 01/02/2013 è stato nominato il Dott. Giuseppe Lombardo RUP dell'intervento. A seguito della seduta della CdS del 25/06/2013, con nota acquisita al prot. n. 3877 del 27/06/2013, la Soc. IAP ha trasmesso il progetto esecutivo rielaborato dai tecnici incaricati. Con nota acquisita al prot. n. 5539 del 16/09/2013 il Responsabile del Settore LL.PP del Comune di Cefalù trasmette copia della delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 23/08/2013 inerente l'attivazione della procedura di deroga ex art. 16 della L.R. 78/76.	ACQUISITI PARERI PROGETTAZIONE	CGIAM INVITALIA	INVITALIA											Dott. Giuseppe Lombardo	D. C. n. 71 del 01/02/2013				





ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento								Stato Intervento		Stato avanzamento Intervento															
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL
														impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo				
SR	162	Carlentini	A	A	Ministero		Messa in sicurezza costone centro abitato - Zona via Venezia, via 4 Novembre e via dei caduti	€ 800.000,00	€ 800.000,00	La progettazione è stata inizialmente affidata al D.P.R.C. di Siracusa con nota n. 616 del 17/11/2010: non avendo avuto alcun riscontro e atteso il carattere di urgenza, il Commissario con nota prot. n.478 del 15/02/2012, ha revocato l'incarico. Con nota prot. n. 1342 del 20/04/2012 è stata incaricata la CGIAM per la predisposizione del piano di indagini preliminari, mentre la progettazione è stata affidata, con nota prot. n. 1343 del 20/04/2012, ad INVITALIA. Le specifiche tecniche per la realizzazione delle indagini preliminari sono state trasmesse dalla CGIAM con nota acquisita agli atti al prot. 2875 del 25/07/2012 e sono state approvate con Decreto Commissariale n. 438 del 03 Settembre 2012. Con Decreto Commissariale n. 484 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del piano di indagini preliminari e le indagini sono ad oggi concluse. La CGIAM con nota protocollo n. 486 del 23/01/2013 trasmette la relazione geologica propedeutica alla fase di progettazione. Con nota prot. n.2483 del 29/04/2013 la Società Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati progettuali esecutivi. In sede di CdS tenutasi in data 06/06/2013 vengono acquisiti tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento. Il RUP con le note prot. n.3948del 01/07/2013 e prot. n. 3953 del 02/07/2013 trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto. Con Decreto Commissariale n. 506 del 03/07/2013 è stato approvato e finanziato l'intervento. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 601 del 26/07/2013 il Commissario ratifica l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa Triscari Costruzioni srl a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 32,0000%. Il Commissario invita l'aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto in data 04/09/2013. Con Decreto n. 768 del 25/09/2013 sono state impegnate le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento.	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI	CGIAM INVITALIA	INVITALIA	GEOMERID S.r.l.	TRISCARI COSTRUZIONI S.r.l.	-	Decreto n. 506 del 03/07/2013	€ 763.402,88	€ 36.597,12	Decreto n. 768 del 25/09/2013	€ 569.730,05	Geom. Francesco Ingalisi	Decreto Commissariale n. 329 del 10/07/2012	Arch. Francesco Giuseppe Fricano Ing. Gianluca Coroneo (FINO AL 29/01/2013)	Ing. Francesco Freni
SR	163	Pachino	B	A	Ministero	COMITATO 24 FEB 2011	Intervento in Contrada Raneddi	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	La progettazione è stata affidata a INVITALIA, mentre con Decreto n. 121 del 23/03/2012 sono state approvate convenzioni e contratti con le università di Catania, Messina, Palermo e con la DHI Italia. Con nota acquisita al prot. n. 2793 del 6/12/2011 il DICA ha trasmesso la relazione su "Rilievi batimetrici, prelievo e analisi granulometriche dei sedimenti marini", l'Università di Messina con nota acquisita al prot. n. 303 del 01/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Analisi diacronica delle tendenze evolutive del litorale del Comune di Pachino (SR) compreso tra Punta Castellazzo e Punta delle Farniche", la DHI Italia acquisita al prot. 363 del 07/02/2012 ha trasmesso la relazione su "Acquisizione e processamento dei dati del modello d'onda Mar Mediterraneo di Mep Office per tre celle situate a largo della costa Sud-Orientale della Sicilia". Con Decreto n. 194 del 26/04/2012 è stata approvata la convenzione con CNR per la "ricerca, l'individuazione e caratterizzazione di cave di sabbie reitite sulla piattaforma siciliana nell'area prospiciente il golfo di Gela" e con Decreto Commissariale n. 408 del 02 Agosto 2012 è stato approvato l'atto aggiuntivo alla convenzione del 19/04/2012. Con nota protocollo n. 3925 del 08/10/2012 il CNR ha trasmesso il Rapporto Tecnico Finale delle attività relative alla Convenzione del 30/03/2012. Il RUP, con nota acquisita al prot. n. 4085 del 16/10/2012, ha trasmesso al Commissario gli elaborati relativi alle tre nuove ipotesi d'intervento. Con nota protocollo n. 5026 del 29/11/2012 il Commissario ha chiesto all'ARPA - DAP di Ragusa la trasmissione dei risultati della caratterizzazione dei sedimenti portuali da esso effettuati nel porto di Pozzallo, a supporto delle scelte progettuali che dovranno essere definite dai tecnici incaricati dal Commissario. Con nota protocollo n. 1355 del 05/03/2013 Invitalia trasmette al Commissario gli elaborati progettuali esecutivi. Con nota protocollo n. 2739 del 13 maggio 2013 il Commissario convoca per il giorno 21/05/2013 alle ore 11,00 una Conferenza dei Servizi, al fine di conseguire tutti i prescritti atti autorizzativi e di assenso, necessari alla realizzazione dell'intervento. A seguito della Conferenza dei Servizi di giorno 21/05/2013 sono stati acquisiti tutti i pareri di assenso per la realizzazione dell'intervento fatta eccezione per l'ARTA Serv. 3, peraltro, l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS ritiene necessario che il progetto venga sottoposto alla valutazione d'impatto ambientale. Con nota prot. n. 3504 del 12/06/2013 l'ARTA Serv. 3 trasmette il proprio parere	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	INVITALIA- Università degli Studi Catania - Università degli Studi Messina - Università degli Studi Palermo - DHI Italia- CNR	INVITALIA	-	-	-	€ -	€ -	-	-	Dott. Giuseppe Lombardo	Decreto n. 74 del 01/02/2013	Dott. Gaetano Vinci		
SR	164	Portopalo di Capo Passero	B	B	Regione		Opere di salvaguardia e difesa del centro abitato	€ 719.000,00	€ 719.000,00	L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 642 del 18/09/2013	Intervento finanziato														
SR	165	Portopalo di Capo Passero	A	A	Ministero		Ripristino e stabilizzazione scarpate - ripristino e protezione litorale - Zona C.da Casuzze-Scalo mandrie	€ 800.000,00	€ 800.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune di Portopalo di Capo Passero. Si è in attesa del progetto esecutivo in quanto necessita della Verifica di assoggettabilità alla VIA presso il Servizio 1 VIA-VAS dell'ARTA, per cui il comune ha già avviato la procedura di verifica. Il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv 1 VIA/VAS con nota prot. n. 3466 del 12/09/2012 Il Commissario convoca gli enti in indirizzo per il tavolo tecnico del 30/10/2012 L'ARTA Serv. 1 comunica al Comune l'attivazione della procedura di danno ambientale ai sensi dell'art. 29 del d.Lgs. 152/2006, pertanto dispone la demolizione di quanto realizzato ed il ripristino dei luoghi.	PROGETTO ESECUTIVO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	COMUNE					€ -	€ -	-	-	Geom. Mario Poidomani (Comune)	Decreto Commissariale n. 147 del 02/04/2012	Arch. Giampiero Di Magro		
SR	166	Rosolini	B	B*	Regione		Opere di consolidamento del centro abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2296 del 22/06/2012 L'ARTA Serv.3 ha trasmesso il progetto e la documentazione amministrativa e tecnica relativa al progetto al Commissario invitando il Comune di Rosolini a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa di competenza relativa al progetto. Con nota protocollo n. 3117 del 09/08/2012 il RUP ha comunicato che tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa al progetto è stata consegnata all'Ufficio del Commissario in data 08/08/2012. Con nota acquisita al protocollo n. 2614 del 07/05/2013 il RUP Arch. Giovanni Calabrese trasmette il parere favorevole del GC di Siracusa Con nota acquisita al prot. n. 6439 del 28/10/2013 il RUP trasmette la documentazione integrativa richiesta ai fini dell'approvazione del progetto.	PROGETTO RICEVUTO IN ATTESA PARERI	COMUNE					€ 0,00	€ 0,00	-	-	Arch. Giovanni Calabrese (UTC)	D.C. n. 687 del 11/12/2012	Geom. Giuseppe Ferrante		
SR	167	Rosolini	A	A	Ministero		Consolidamento versante e sistemazione idraulica - Zona vallone Ristallo-Masciugno	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita agli atti al prot. n. 657 del 12/05/2011 ha trasmesso il progetto esecutivo. Il Commissario con nota prot. n. 2796 del 6/12/2011 ha chiesto alcuni chiarimenti al Comune e rappresentato la mancanza di alcuni pareri necessari all'approvazione e finanziamento progetto nonché della comunicazione del RUP relativa ai vincoli presenti sull'area oggetto dell'intervento. In sede di Conferenza dei Servizi del 16/05/2012, e nei giorni successivi, sono stati acquisiti i pareri e le autorizzazioni utili per l'approvazione dell'intervento, tra cui il parere del GC di SR che ha chiesto integrazioni per poter esprimersi. Le integrazioni sono state trasmesse dal Comune con note acquisite ai prot. n. 1947 del 31/05/2012 e n. 2176 del 14/06/2012. Con Decreto n. 427 del 22/08/2012 è stato finanziato del progetto esecutivo dell'intervento. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 534 del 15/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. In data 19/12/2012 è avvenuta la formale consegna dei Lavori Il RUP con nota prot. n. 3759 del 21/06/2013 trasmette la concessione di proroga di 30gg data all'Impresa Unifica Soc. Coop. per l'ultimazione dei lavori.	AVVIATI LAVORI	COMUNE	Unifica Soc Coop.	19-dic-2012	Decreto Commissariale n. 427 del 22/08/2012	€ 1.315.000,00	€ 185.000,00	n. 653 del 28/11/2012	€ 975.912,96	Geom. Vindigni Giuseppe	Decreto Commissariale n.225 del 16/05/2012	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 30/01/2013)	Ing. Corrado Mingo		




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento									Stato Intervento				Stato avanzamento Intervento															
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL			
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo						
SR	177	Carlentini	A	A	Ministero	COMITATO 24 MAR 2011 COMITATO 15 SET 2011	Regimazione e riduzione rischio idraulico a difesa del centro abitato (2° stralcio)	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	La progettazione è stata affidata al Comune che con nota acquisita al prot. n. 459 del 11/04/2011 ha trasmesso gli elaborati progettuali. Con nota acquisita al prot. n. 1511 del 12/08/2011, il Comune ha trasmesso variazioni tecniche ritenute necessarie, ma che non hanno modificato gli obiettivi di riduzione del rischio idraulico dell'area oggetto di intervento. A seguito dell'accoglimento dell'istanza di variante tecnica nel corso del comitato del 15/09/2011, il Commissario, con nota prot. 1823 del 21 set 2011, ha autorizzato il comune a procedere alle modifiche progettuali richieste. Con nota prot. n. 670 del 29/02/2012 il Comune ha trasmesso il progetto esecutivo rivisitato. In sede di Conferenza dei Servizi del 09/03/2012 sono stati espressi tutti i pareri necessari alla realizzazione dell'intervento, che è stato finanziato con Decreto Commissariale n. 247 del 28/05/2012. Con D.C. n. 429 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori; il contratto è stato stipulato in data 26/09/2012. Con Decreto Commissariale n. 637 del 22/11/2012 è stato affidato l'incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Con Decreto Commissariale n. 307 del 06/05/2013 si impegna la somma di € 2.047.454,02 per la realizzazione dell'intervento. Il Commissario convoca un tavolo tecnico per il giorno 08/05/2013.	AVVIATI LAVORI	-	COMUNE	-	Urania Costruzioni srl	-	Decreto n. 247 del 28/05/2012	€ 2.500.000,00	€ -	€ -	Decreto n. 307 del 06/05/2013	€ 2.047.454,02	Geom. Francesco Ingalisi	Decreto Commissariale n. 191 del 26/04/2012	Ing. Diego Li Calzi	Ing. Antonio Lanza		
SR	184	Avola	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Opere di difesa a salvaguardia della linea di costa	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune il quale, con nota prot. n. 2938 del 20/12/2011, è stato invitato a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni. Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 231 del 25/03/2012, ha rappresentato di essere in attesa dell'ultimo parere necessario per l'approvazione della progettazione definitiva generale di un intervento più ampio, e che provvederà alla trasmissione del progetto definitivo generale approvato con l'individuazione delle opere oggetto del primo stralcio, per un importo pari a € 2.000.000,00. Al fine di pervenire all'acquisizione della progettazione esecutiva di uno stralcio funzionale di un importo complessivo di € 2.000.000,00, il Commissario, con nota prot. n. 5313 del 12/12/2012, ha convocato un tavolo tecnico l'08/01/2013. Con Decreto Commissariale n. 268 del 10/04/2013 viene disposto il finanziamento e impegno per l'acquisizione del progetto esecutivo 1° stralcio e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. A seguito delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 597 del 25/07/2013 il Commissario notifica l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione del piano di indagini preliminari a favore della Geomerid srl a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 40,2000% in data 01/08/2013 è prevista la stipula del contratto.	INDAGINI PRELIMINARI IN CORSO	-	COMUNE	Geomerid srl	-	-	€ -	€ -	-	-	-	-	Arch. Gaetano Brex (Dirigente Area 4 del Comune di Avola)	Decreto Commissariale n. 358 del 17/07/2012	Geom. Romina Sparacino			
SR	185	Buscemi	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Consolidamento costone sottostante il Santuario	€ 200.000,00	€ 200.000,00	La Progettazione è stata affidata al Comune. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata dell'area di intervento. Tali rilievi sono stati trasmessi dalla CGIAM con nota acquisita al prot. n. 498 del 16/02/2012. Il Comune, con nota acquisita al prot. n.1263 del 13/04/2012 ha trasmesso il progetto esecutivo. In sede di Conferenza di Servizi del 26/04/2012 sono stati acquisiti gli assenti da parte degli enti interessati all'approvazione del progetto, ed il RUP, con nota acquisita al prot. n. 2308 del 25/06/2012 ha trasmesso il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo. Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012, il Commissario comunica alla CGIAM la revoca dell'incarico conferito per SR 185. Con Decreto n. 319 del 09/07/2012 è stato finanziato il progetto. Con Decreto Commissariale n. 449 del 07/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto. I lavori sono stati avviati in data 23/10/2012 e l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 29/01/2013. Con Decreto Commissariale n. 176 del 11/03/2013 si provvede alla Presa d'Atto della Perizia di Variante e Suppletivo e rimodulazione impegno.	LAVORI ULTIMATI	-	COMUNE	TECNO COSTRUZIONI S.R.L.	23-ott-2012	n.319 del 09/07/2012	€ 200.000,00	€ -	n.566 del 30/10/2012	€ 162.190,54	Geom. Giuseppe Ferrante	Decreto Commissariale n. 176 del 19/04/2012	Ing. Giovanni Donetti	Ing. Giovanni Donetti				
SR	186	Portopalo di Capo Passero	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Regimazione acque e consolidamento scarpata	€ 600.000,00	€ 600.000,00	L'intervento è inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata ad INVITALIA con nota prot. n. 553 del 20/02/2012. L'intervento è stato inserito tra quelli previsti dall'ACCORDO QUADRO con il Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo (CGIAM) al fine di ottenere un rilievo topografico e di una restituzione aerofotogrammetrica adeguata. La CGIAM, con nota acquisita al prot. n. 753 del 07/03/2012, ha trasmesso la restituzione parziale degli elaborati. Con nota acquisita al protocollo n. 2415 del 28/06/2012 la CGIAM, a seguito della presa d'atto del RUP, ha trasmesso le specifiche tecniche per le indagini. Il RUP, con nota protocollo n. 3021 del 02/08/2012, ha trasmesso la determinazione di modifica della presa d'atto delle specifiche tecniche delle indagini preliminari a supporto della progettazione esecutiva, approvate e finanziate con Decreto n. 452 del 11/09/2012. Con Decreto n. 511 del 4/10/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per il piano di indagini preliminari e in data 09/10/2012 è stato sottoscritto il contratto. I risultati delle indagini eseguite sono state acquisite al prot. n. 4362 del 26/10/2012. Con nota 1203 del 26/02/2013 la Società Invitalia trasmette gli elaborati progettuali esecutivi. Con nota protocollo n. 3018 del 21 maggio 2013 il Commissario trasmette il verbale della CdS tenutasi in data 21/05/2013 e rimane in attesa delle integrazioni da parte dei progettisti e del parere della Provincia Regionale di Siracusa Serv. VIII e della Soprintendenza entro e non oltre 7gg dalla presente. Con nota prot. n. 3476 del 11/06/2013 Invitalia trasmette dettagliata descrizione in risposta alle prescrizioni dettate dall'ARTA Serv. 3 in sede di CdS tenutasi in data 21/05/2013, il commissario trasmette la suddetta alla Provincia e resta in attesa di valutazioni. A seguito della nota della Provincia Regionale Serv. VIII nella quale si reiterava il parere già espresso in precedenza, il GdL di Invitalia con nota prot. n. 3770 del 24/06/2013, trasmette gli elaborati progettuali integrativi stralcio della parte idraulica, al fine di superare le prescrizioni del sopraccitato servizio. Con nota prot. n. 3800 del 24/06/2013 il RUP trasmette al Commissario tutti gli atti relativi all'approvazione nei modi di legge del progetto Con Decreto Commissariale n. 498 del 28/06/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 397.797,49.	SOSPENSIONE LAVORI	CGIAM INVITALIA	INVITALIA	GEO SERVICES TRIVELLAZIONI E SONDAGGI Srl	PULLARA CALOGERO	-	Decreto n. 498 del 28/06/2013	€ 397.797,49	€ 202.202,51	n. 908 del 28/10/2013	€ 319.038,58	Geom. Mario Poidomani	Decreto Commissariale n.313 del 06/07/2012	Arch. Giampiero Di Magro				





ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento								Stato Intervento		Stato avanzamento Intervento															
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO Dell'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL
														impresa	data inizio lavori	n. e data	importo			n. e data	importo				
SR	187	Rosolini	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Intervento di sistemazione della voragine del centro abitato	€ 1.800.000,00	€ 1.800.000,00	<p>La progettazione è stata affidata al Comune.</p> <p>Con nota prot. n. 130 del 18/01/2012 il Comune ha riferito che per la definire la progettazione esecutiva aveva necessità di avvalersi di consulenze specifiche (indagini idrauliche, idrogeologiche e geotecniche, coordinamento della sicurezza) e ha chiesto autorizzazione.</p> <p>Il Commissario, con nota prot. n. 169 del 19/01/2012, ha comunicato al Comune di aver già incaricato la CGIAM per la realizzazione delle indagini geologiche, autorizzando il conferimento delle altre consulenze specifiche richieste.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 485 del 21/09/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva delle indagini ed in data 26/09/2012 è stato stipulato il contratto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4427 del 31/10/2012 l'impresa ha trasmesso il verbale di consegna delle aree ed un parziale avvio dei lavori in quanto ancora in attesa della mappatura dei sottoservizi già richiesta al comune.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4506 del 08/11/2012 l'impresa ha comunicato di non essere ancora in possesso delle mappature dei sottoservizi, pertanto, ha chiesto la sospensione dei lavori.</p> <p>A seguito della risoluzione delle problematiche incontrate, l'impresa ha trasmesso, con nota acquisita al prot. n. 5135 del 05/12/2012, gli elaborati tecnici delle indagini effettuate.</p> <p>Con nota protocollo n. 4237 del 12/07/2013 il RUP trasmette il progetto esecutivo.</p> <p>L'ARTA Serv.3. con nota prot. n. 5172 del 03/09/2013 trasmette il proprio parere favorevole, precisando che in futuro per un eventuale aggiornamento delle aree si richiederà un adeguato studio idraulico.</p> <p>Il RUP con nota prot. n. 6244 del 16/10/2013 trasmette il Verbale di Verifica e Validazione del progetto.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 867 del 17/10/2013 si approva e finanzia l'intervento per un importo pari ad € 1.800.000,00.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 897 del 24/10/2013 si approva lo schema lettera di invito e avvio della Procedura di gara.</p>	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA	CGIAM	COMUNE	S.G.M. Società Geognostica Mediterranea Srl	-	-	€	€	-	-	Geom. Giuseppe Vindigni	Decreto Commissariale n. 198 del 02/05/2012	Ing. Fabio Ferla (FINO AL 30/01/2013)	Ing. Corrado Mingo	
SR	188	Siracusa	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Lavori di ripristino e consolidamento della falesia	€ 3.466.002,61	€ 3.466.002,61	<p>L'intervento è stato inserito nell'AdP integrativo e la progettazione è stata affidata al Comune di Siracusa, che ha trasmesso il progetto con nota acquisita al prot. n. 1155 del 04/04/2012.</p> <p>In sede di CdS del 17.04.2012 si è invitato il Comune a trasmettere entro 45 giorni il progetto esecutivo rivisitato tenendo conto di tutte le prescrizioni impartite dagli enti: tale documentazione è stata trasmessa dal Comune con nota acquisita al prot. n.1893 del 29/05/2012.</p> <p>In sede di ulteriore CdS del 12/06/2012 L'ARTA Serv.1 VIA/VAS ha posto l'attenzione sull'interferenza della scogliera soffolta più piccola con la prateria di posidonia presente nel sito ed il Commissario ha invitato i progettisti a ridimensionare la suddetta barriera soffolta lato Punta Castelluccio in modo tale da limitare quanto più possibile l'interferenza della stessa con la posidonia, ed a presentare il progetto definitivo rielaborato entro il 18 giugno 2012.</p> <p>Il Comune, con nota acquisita al prot. n. 2222 del 19/06/2012, ha trasmesso le integrazioni richieste dall'ARTA, inviate poi al Serv.1 VIA/VAS dal Commissario con nota prot. n.2230 del 20/06/2012 per il rilascio entro 15 gg del parere di competenza.</p> <p>Con nota prot. n. 2827 del 20/07/2012 il Commissario ha sollecitato l'ARTA Serv. 1 VIA/VAS a trasmettere il parere di competenza ancora non prodotto.</p> <p>Con nota protocollo n. 3138 del 13/08/2012 la Sigma srl trasmette all'ARTA (Serv. 1) la documentazione integrativa allo studio di impatto ambientale.</p> <p>L'ARTA (Serv. 3) con DDG n. 489 del 26/09/2012 ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo.</p> <p>Con nota protocollo n. 3960 del 09/10/2012 il Commissario, a seguito della visita ricognitiva del Nucleo Tecnico di valutazione degli investimenti Pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica del Ministero dello Sviluppo Economico, e della riunione del 09/10/2012, ha chiesto al Comune di trasmettere, entro il 31.10.2012, lo stralcio funzionale del progetto.</p> <p>Con nota protocollo n. 307 del 17/01/2013 il RUP Ing. Emanuele Fortunato comunica che il progetto definitivo è stato trasmesso al G.C. di Siracusa per l'approvazione in linea tecnica.</p> <p>Con nota prot. n. 2074 del 08/04/2013 il Comune trasmette il Progetto Esecutivo.</p> <p>Nella Conferenza dei Servizi del 15/04/2013 vengono acquisiti tutti i pareri degli enti interessati.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 280 del 16/04/2013 relativo all'approvazione ed al</p>	AVVIATI LAVORI	COMUNE (Ing. Agostino Calandrino, Geom. Andrea Riccardi)	-	PICARDI TECNICA S.R.L.	22-lug-2013	Decreto n. 280 del 15/04/2013	€ 3.466.002,61	€	-	Decreto n. 629 del 31/07/2013	€ 2.628.510,21	Ing. Emanuele Fortunato (UTC)	Decreto Commissariale n. 333 del 10/07/2012	Arch. Marcella Miotto (FINO AL 30/01/2013)	Ing. Triglia Vincenzo
TP	168	Erice	A	A	Ministero	-	Consolidamento costone roccioso - Zona Crocifisso	€ 500.000,00	€ 500.000,00	<p>La progettazione è stata affidata al DRPC di TP.</p> <p>Con nota prot. 1541 del 23/08/2011, il DRPC TP ha trasmesso gli elaborati progettuali, successivamente integrati dalla documentazione trasmessa con nota prot. n. 2106/UC del 14/10/2011.</p> <p>In sede di Conferenza dei Servizi del 28/02/2012 sono stati acquisiti tutti i pareri necessari ed</p> <p>Il DRPC TP, con nota n. 1635/UC del 11/05/2012, trasmette la verifica del progetto esecutivo, il rapporto conclusivo sulla verifica e la validazione dello stesso.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 223 del 15/05/2012 si è finanziato il progetto esecutivo.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 428 del 23/08/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 3219/UC del 24/08/12, il RUP ha nominato un nuovo gruppo di Direzione Lavori.</p> <p>Il contratto è stato stipulato in data 09/10/2012 ed i lavori sono stati consegnati in data 28/11/2012 e dovranno concludersi entro il 25/02/2013.</p> <p>Il Commissario, con Decreto n. 90 del 08/01/2013, ha preso atto della perizia di variante e suppletiva - approvata ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c) del D.Lgs.163/2006, dal DRPC con determina n. 122 del 20/12/2012 - provvedendo all'impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento pari ad € 389.833,73</p> <p>L'ing. Antonio Minutella in data 07/02/2013 effettuerà la visita di collaudo.</p>	AVVIATI LAVORI	DRPC	DRPC TP	Renzo Costruzioni srl	28-nov-2012	Decreto n. 223 del 16/05/2012	€ 500.000,00	€	-	n. 90 del 08/01/2013	€ 389.833,73	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Decreto Commissariale n.107 del 15/03/2012	Ass. Amm.vo Antonina Minaudo	Arch. Vincenzo Lora
TP	169	Mazara del Vallo	A	A	Ministero	-	Opere di protezione consolidamento e ripristino funzionalità infrastrutture - Zona Tonnarella	€ 800.000,00	€ 800.000,00	<p>La progettazione è stata affidata al Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita al prot. n. 1539 del 23/08/2011. A seguito delle Conferenze dei Servizi del 20.10.2011 (nella quale è stato esposto il progetto generale dell'intervento che però presentava un importo delle opere da realizzare superiore a quanto stanziato dall'APQ) e del 29.11.2011 (nella quale è stato discusso uno stralcio funzionale il cui importo risultava conforme alle somme stanziato dall'APQ) sono stati acquisiti tutti i pareri, di cui alcuni con prescrizioni, necessari alla realizzazione dell'intervento dello Stralcio Funzionale.</p> <p>In virtù della Convenzione stipulata con il Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria, le procedure di affidamento dei lavori sono state espletate dallo stesso Ente, che tra l'altro, con verbale del 3/11/2011, ha dichiarato la somma urgenza ai sensi dell'Art. 176 del DPR 207/2010.</p> <p>Con Decreto Commissariale n. 216 del 11/05/2012 è stato approvato e finanziato il progetto esecutivo.</p> <p>Con nota acquisita agli atti al prot. n.1805 del 22/05/2012, il Comune ha comunicato l'avvenuta consegna dei lavori da parte dell'Ufficio Opere Marittime in data 26.04.2012, nelle more della stipula del contratto di appalto.</p> <p>Con nota acquisita al prot. n. 4619 del 09/11/2012, il RUP ha trasmesso la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del D.Lgs. 163/2006 munita del Decreto Dirigenziale di approvazione in linea tecnica.</p>	AVVIATI LAVORI	Prov.to Int.le OO.PP.	Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SC A.R.L.	-	Decreto n. 216 - 11/05/2012	€ 800.000,00	€	-	603 - 13/11/2012	€ 741.500,00	Ing. Pietro Viviano	prot. N. 515/UC del 04/11/2010	Ing. Leonardo Tallo	
TP	170	Poggioreale	B	B	Regione	-	Consolidamento versante orientale dell'abitato	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00	<p>L'intervento è stato finanziato con D.D.G. n. 493 del 7/7/2011 per un importo di euro 1.500.000,00. I lavori sono stati affidati alla Spallina Costruzioni con un ribasso del 24,1644%</p>	Affidamento Lavori	-	-	Spallina Costruzioni	-	N. 493 DEL 06/07/2011	€ 1.500.000,00	-	-	-	-	-	-		




ELENCO INTERVENTI A e B

Descrizione Intervento							Stato Intervento				Stato avanzamento Intervento																
PROV	COD	COMUNE	FONDI ORIGINARI	FONDI ATTUALI	FONDI	COMITATI	TITOLO	IMPORTO AdP	IMPORTO Rimodulato	STATO DELL'ARTE	SAL	CONVENZIONI	AFFIDAMENTO PROGET.	AFFIDAMENTO INDAGINI	AFFIDAMENTO LAVORI:		DECRETO DI FINANZIAMENTO		Economie	DECRETO DI IMPEGNO		RUP	Nomina RUP tramite	Supporto al RUP	DL		
															impresa	data inizio lavori	n. e data	importo		n. e data	importo						
TP	171	Salemi	A	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011 COMITATO 15 SETT 2011	Sistemazione del costone roccioso Monte Rose a monte della via Marsala - Zona C.da Monte Rose	€ 1.500.000,00	€ 1.650.000,00	In Ottemperanza alle determinazioni del "Comitato di Indirizzo e Controllo per la gestione dell'Accordo" del 24 Febbraio 2011 il finanziamento relativo all'intervento viene aumentato, attraverso l'utilizzo delle risorse rese disponibili dalla mancata realizzazione dell'intervento ME79A_Librizzi pari a € 150.000€, passando da 1.500.000,00 a 1.650.000,00 euro. Nella stessa seduta del Comitato si stabilisce di far transitare l'intervento dalla lettera A alla Lettera B. I lavori sono stati aggiudicati dalla LeC srl che ha offerto un ribasso del 26,9699%. In data 21/03/2013 hanno avuto inizio i lavori	Avviati Lavori							12-18-gen-12	€ 1.650.000,00								
TP	172	San Vito Lo Capo	A	A	Ministero	-	Collocazione rete paramassi - Zona Makari	€ 450.000,00	€ 450.000,00	La progettazione è stata affidata al DRPC di TP che ha trasmesso il progetto esecutivo con nota acquisita agli atti al prot. n. 1540 del 23/08/2011. Il progetto è stato finanziato con Decreto n. 62 del 14/02/2012. A seguito dell'espletamento delle procedure di gara, con Decreto Commissariale n. 102 del 13/03/2012 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei lavori. Con Decreto Commissariale n. 114 del 19 marzo 2012 si è autorizzata l'occupazione anticipata d'urgenza. Il Contratto è stato sottoscritto in data 10/05/2012. In data 20/08/2012 sono stati avviati i lavori. Il RUP, con nota n. 4571 del 07/11/2012, ha trasmesso la determina n. 111 del 29/10/2012 di approvazione della 1° perizia di variante e suppletiva, ai sensi del comma 9 art. 161 del D.P.R. 207/2010, e la relazione generale dell'intervento. Con Decreto Commissariale n. 693 del 12/12/2012 il Commissario ha preso atto della PVS redatta dalla D.L. e approvata dal RUP ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. B del D. Lgs 163/2006, rimodulando di conseguenza l'impegno. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 687 del 31/01/2013 il RUP trasmette i documenti contabili relativi al SAL n. 1 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 16/01/2013 e il certificato di ultimazione dei lavori. Con nota acquisita al prot. n. 2290 del 17/04/2013, il DL trasmette alla Struttura Commissariale n. 2 copie della Relazione a struttura ultimata, ai sensi dell'art. 6 della L. 1085/71. Il RUP Ing. Giovanni Indelicato con nota prot. n. 3264 del 04/06/2013 trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva, completa di validazione e verifica del progetto con il rapporto conclusivo di verifica.	LAVORI ULTIMATI	DRPC	DRPC TP	Torsten Costruzioni srl	-	Decreto n. 62 del 14 febbraio 2012	€ 450.000,00	€ -	Decreto n. 401 del 02/08/2012	€ 366.819,04	Ing. Giovanni Indelicato (DRPC TP)	Decreto Commissariale n. 70 del 15 febbraio 2012	Ass. Amm.vo Giuseppe Giacalone	Arch. Maria Di Girolamo (DRPC TP)			
TP	173	Trapani	A	B	Regione	COMITATO 24 FEB 2011	Opere di regimazione idraulica - Zona Salinagrande	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	L'intervento transita, in ottemperanza alle determinazioni del Comitato del 24 Feb 2011 dalla lettera A alla lettera B. Pertanto con nota prot. 510 del 15 apr 2011 si comunica all'ARTA l'avvenuta variazione e si trasmette tutta la documentazione. In data 28/9/2010 affidata la progettazione al Genio Civile di Trapani. L'intervento è stato finanziato con DDG n. 959 del 23/12/2011.	Intervento finanziato	GC	Genio Civile					959-23-dic-11	€ 4.000.000,00								
TP	189	Mazara del Vallo	A	A	Ministero	AdP Integrativo	Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	Il Commissario, con nota prot. n. 2728 del 05/12/2011, ha comunicato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria - Ufficio IV - l'avvenuto inserimento dell'intervento nell'AdP integrativo del maggio 2011, invitandolo a trasmettere il progetto esecutivo entro 60 giorni. Il Provveditorato - ufficio IV OO.MM per la Sicilia, con nota assunta al prot. n.2926 del 20.12.2011, ha confermato la propria disponibilità a redigere la progettazione dell'intervento. Il Commissario, con nota prot. n. 3299 del 03/09/2012, stante la mancata ricezione del progetto esecutivo, ne sollecita la trasmissione al Provveditorato che vi ottempera con nota 3683 del 25/09/2012, proponendone l'affidamento allo IAMC CNR di Capo Granitola. Conseguentemente il Provveditorato, con nota prt. 4919/UC del 23/11/12, ha trasmesso lo schema di convenzione aggiornato con IAMC CNR di Capo Granitola per le indagini preliminari, attendendo la necessaria autorizzazione alla sottoscrizione. Con nota acquisita agli atti al prot. n. 580 del 29/01/2013 il Dott. Giorgio Tranchida dell'IAMC ha trasmesso all'Ufficio del Commissario il piano di caratterizzazione porto Mazara. A seguito della CdS del 31/01/2013 sono stati acquisiti i pareri relativi al piano di Caratterizzazione ambientale propedeutico ai lavori da effettuare nell'ambito dell'intervento TP 189 "Lavori di ripristino dei fondali del bacino portuale e del retrostante porto canale", ad eccezione del parere dell'ISPR. In data 07/10/2013 avranno inizio i lavori per il campionamento di sedimenti all'interno dell'area portuale di Mazara del Vallo.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO	Prov.to Int.le OO.PP.	Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia											Ing. Pietro Viviano Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria Uff. 4 OO.MM.Sicilia	D. C. n. 244 del 03/04/2013	0	0
TP	190	San Vito Lo Capo	B	B*	Regione	AdP Integrativo	Consolidamento del tratto di costa	€ 1.350.000,00	€ 1.350.000,00	Con nota acquisita agli atti al prot. n. 2372 l'ARTA ha comunicato al Comune di San Vito Lo Capo che l'Ufficio del Commissario Straordinario Delegato è stato individuato quale Ente Beneficiario dell'intervento, invitandolo a trasmettere tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa al progetto. Data l'impossibilità dell'UTC a redigere il progetto esecutivo, il Commissario, con nota prot.n. 3015 del 02.08.2012, lo ha informato che affiderà la redazione del progetto. Con nota prot. n. 3339 del 06/09/2012 il Commissario ha trasmesso alla CGIAM l'integrazione del piano esecutivo stipulato in data 30.11.2011, inserendo l'intervento - TP 190 B.S. Vito Lo Capo. Con nota prot. n. 3260 del 04/06/2013 si incarica la Società Invitalia per la redazione della progettazione esecutiva.	PROGETTAZIONE IN CORSO	CGIAM INVITALIA	INVITALIA							€ 0,00	€ 0,00	0	0				
