



# I numeri del Piano carceri

*L'attività in numeri*

[www.pianocarceri.it](http://www.pianocarceri.it)

Visualizzato con 1.400.000 click negli ultimi 6 mesi

## I numeri del Piano carceri

Fondi a disposizione 468 milioni
Fondi impegnati 310 milioni
Fondi liquidati 31 milioni

<b>Posti detenuti totali 12.324</b>
-------------------------------------

<i>aggiudicati/ appaltati 8.874 - da bandire 3.450</i>
--

## I numeri del Piano carceri

Il Commissario straordinario Prefetto Angelo Sinesio

<b>Struttura amministrativa</b> 1 dottore commercialista 2 funzionari contabili - 1 assistente amministrativo 2 vice sovrintendenti - 3 agenti di Pol Pen
--

<b>Struttura tecnica</b> 2 RUP ingegneri – 1 architetto - 3 ingegneri – 2 assistenti tecnici
---

## I numeri del Piano carceri

	ATTIVITA'	NUMERO
Struttura amministrativa AFFARI GENERALI	PROTOCOLLI IN E OUT	11.590
	INTESE DI LOCALIZZAZIONE	12
	PROTOCOLLI DI LEGALITA'	5
	VERBALI DI GARA	350
	PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1.000
	MAIL IN E OUT	25.000
	TELEFONATE	8.000
	CREAZIONE / AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	3.500
	COMUNICAZIONE ANTIMAFIA	240
	RIUNIONI	50
	UDIENZE	30
	GESTIONE E REPORT DEL PERSONALE	2.500
	INTERROGAZIONI PARLAMENTARI	35
	RELAZIONI	50
	CORRISPONDENZA IN E OUT	4.000
	<b>TOTALE</b>	<b>44.772</b>

## I numeri del Piano carceri

	ATTIVITA'	NUMERO	FONDI IMPEGNATI IN MILIONI
Struttura amministrativa GARE CONTRATTI	GARE PROCEDURA APERTA	20	236,7
	PROCEDURE AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO E DI RECUPERO	19	73,3
	BANDI DI GARA	20	
	DISCIPLINARI DI GARA	20	
	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO -PARTE AMMINISTRATIVA	20	
	LETTERE INVITO	200	
	DECRETI DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI	39	
	DECRETI DI AGGIUDICAZIONE	39	
	ACCESSO AGLI ATTI	50	
	AVVISI AI CONCORRENTI	1.000	
	PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	15.000	
	MAIL IN E OUT	25.000	
	TELEFONATE	35.000	
	RICHIESTA CUP e CIG	350	
	RICHIESTA DURC	1.700	
	COMMISSIONI GARE EX ART. 84	350	
	AUTORITA' DI GARA	50	
	REPERTORIO ATTI UFFICIALE ROGANTE	400	
	RICHIESTE CARICHI PENDENTI/CASELLARIO/ANTIMAFIA/AGENZIA ENTRATE/CGIAA/AVCP/FALLIMENTARE	15.000	
	<b>TOTALE</b>	<b>94.277</b>	<b>310</b>

## I numeri del Piano carceri

CONTABILITA'	ATTIVITA'	NUMERO	FONDI LIQUIDATI IN MILIONI
	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA E ESITI	101	0,303
	CONTRATTI PER VERIFICA PROGETTI	10	0,108
	CONTRATTI PER ARREDI CELLE	28	4,100
	CONTRATTI PER INDAGINI GEOLOGICHE E ARCHEOLOGICHE	25	0,496
	CONTRATTI PER ARREDO UFFICI NUOVI PADIGLIONI	21	0,182
	CONTRATTI PER COLLAUDI	2	0,059
	CONTRATTI PER ESPROPRI E ACCATAMENTI	10	0,282
	CONTRATTI PER FORNITURA ENERGIA / GAS	6	0,083
	CONTRATTI PER SOGGETTI ATTUATORI E LORO COLLABORATORI 2010-2011	30	1,761
	CONTRATTI DI CONSULENZA 2012 -2013	5	0,100
	CONTRATTI SITO INFORMATIZZAZIONE UFFICIO	28	0,082
	CONTRATTI PER GESTIONE UFFICIO	36	0,164
	MISSIONI DIRETTORI DEI LAVORI	50	0,048
	INCENTIVO EX ART. 92 C. 5 D.LGS 163/2006	95	0,827
	STRAORDINARIO PERSONALE	1312	0,073
	COMUNICAZIONI F24 EP (ONERI RIFLESSI E RITENUTE FISCALI)	48	1,395
	PAGAMENTI DIRETTI SALARI DIPENDENTI IMPRESE APPALTATRICI	196	0,513
	STATO AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.)	65	20,303
	MERCEDI DETENUTI	4	0,029
	COMMISSIONI GIUDICATRICI EX ART. 84 D.LGS. 163/2006	11	0,081
	COPIE PROGETTI	12	0,011
	DECRETI DI IMPEGNO DELLA SPESA	1400	
	DECRETI DI LIQUIDAZIONE	120	
	MAIL IN E OUT	5.000	
	RENDICONTO E RELAZIONE CORTE DEI CONTI	6	
	TELEFONATE	7.000	
	VERIFICA EQUITALIA ex 48bis	350	
	ORDINATIVI DI PAGAMENTO	1217	-31,000
	<b>TOTALE</b>	<b>17.188</b>	<b>-</b>

Struttura amministrativa  
CONTABILITA'

## I numeri del Piano carceri

	ATTIVITA'	NUMERO
Struttura tecnica	STUDI DI FATTIBILITA'	3
	PROGETTI PRELIMINARI	7
	PROGETTI ESECUTIVI	3
	DIREZIONE LAVORI (compresi tecnici di altre Amministrazioni pubbliche)	29
	COLLAUDI (compresi tecnici di altre Amministrazioni pubbliche)	10
	SUPPORTO TECNICO	3
	SOPRALLUOGHI	80
	RIUNIONI	120
	MAIL IN E OUT	1.200
	TELEFONATE	4.500
		<b>TOTALE</b>


## I numeri del Piano carceri

	ATTIVITA'	NUMERO	FONDI LIQUIDATI IN MILIONI
MANO D'OPERA DETENUTI	LENZUOLA LETTO	1.820	
	FEDERE GUANCIALI	9.616	
	COPERTE	9.616	
	GUSCI MATERASSI	5.520	
	GUSCI GUANCIALI	5.520	
	LENZUOLA DA BAGNO	9.388	
	LETTI	3.000	
	ARMADI	8.640	
	SGABELLI	2.760	
	TAVOLI	935	
	MONTAGGIO ARREDO CELLE	800	
	PULIZIA AREE VERDI	200	
	<b>TOTALE</b>	<b>57.815</b>	<b>4,100</b>




# I numeri del Piano carceri

## Posti detenuti

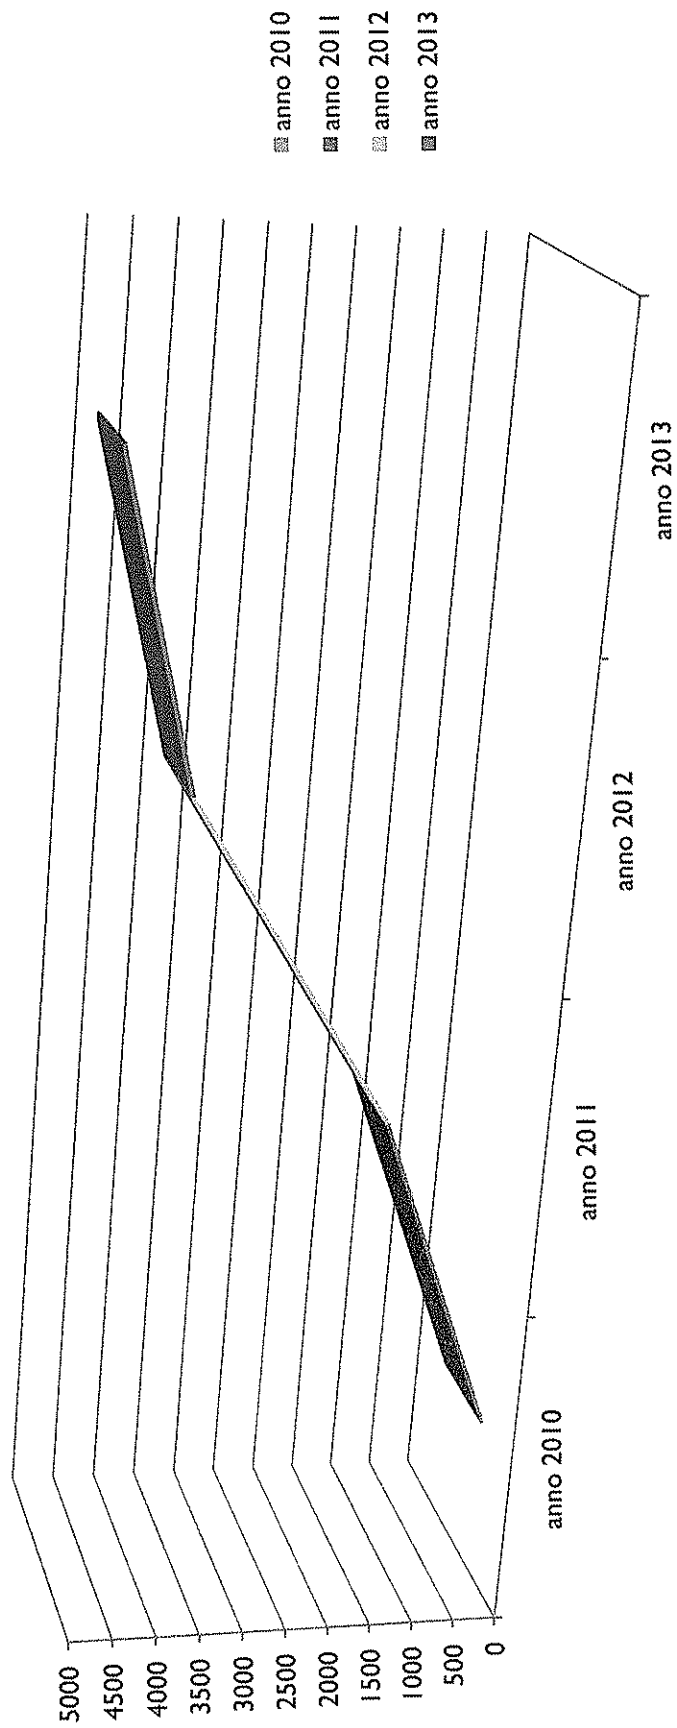


## I numeri del Piano carceri

### Protocolli per anno

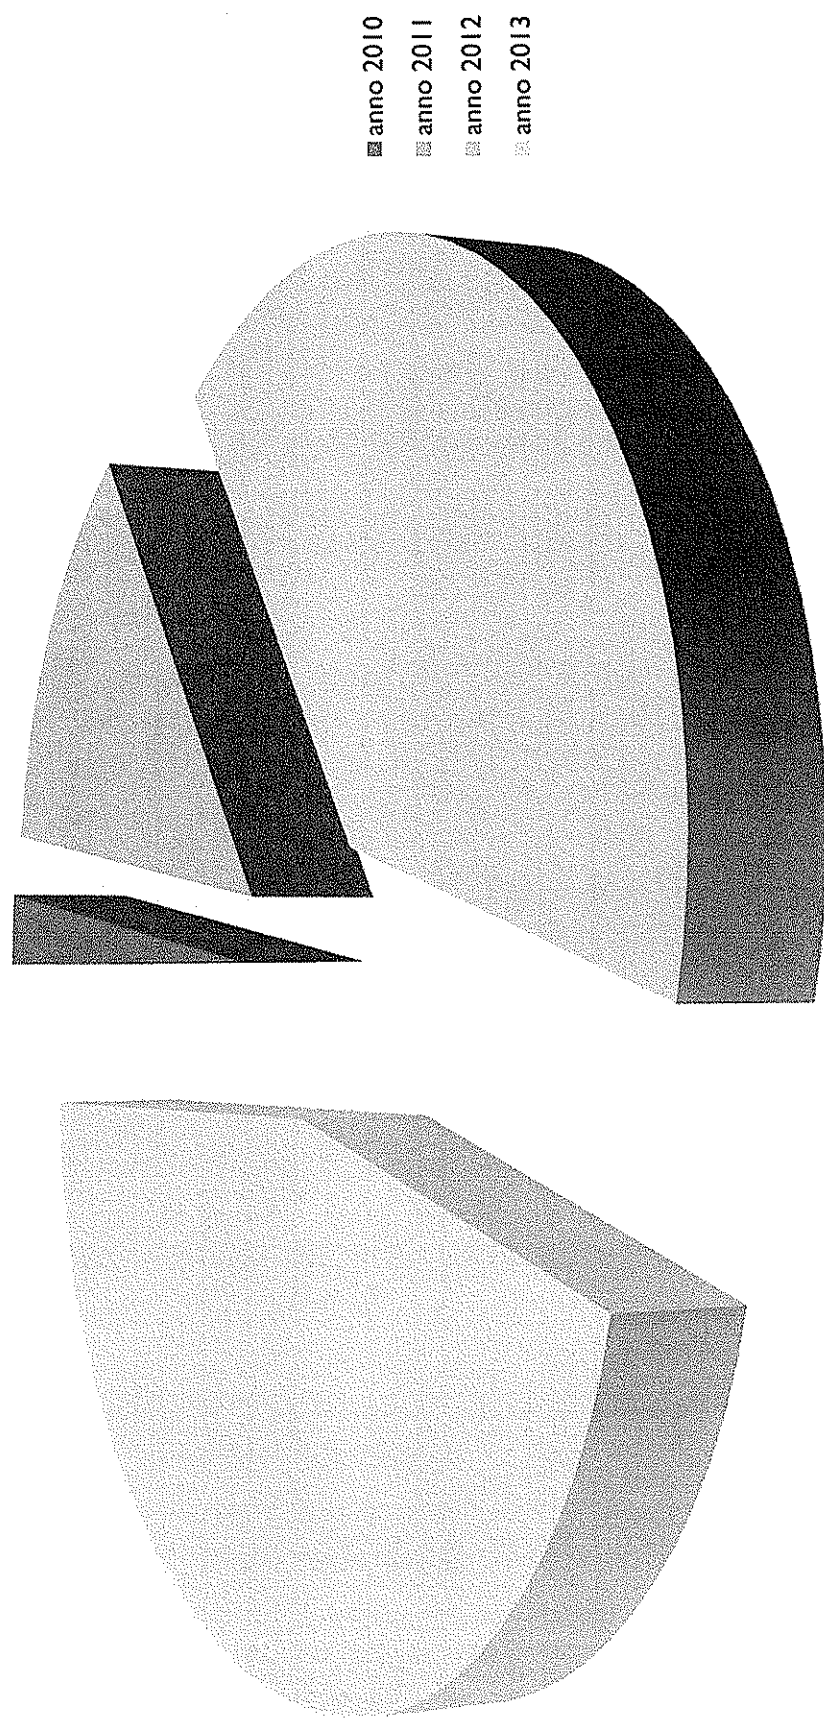


# I numeri del Piano carceri

## Protocolli in / out dal 2010 a settembre 2013

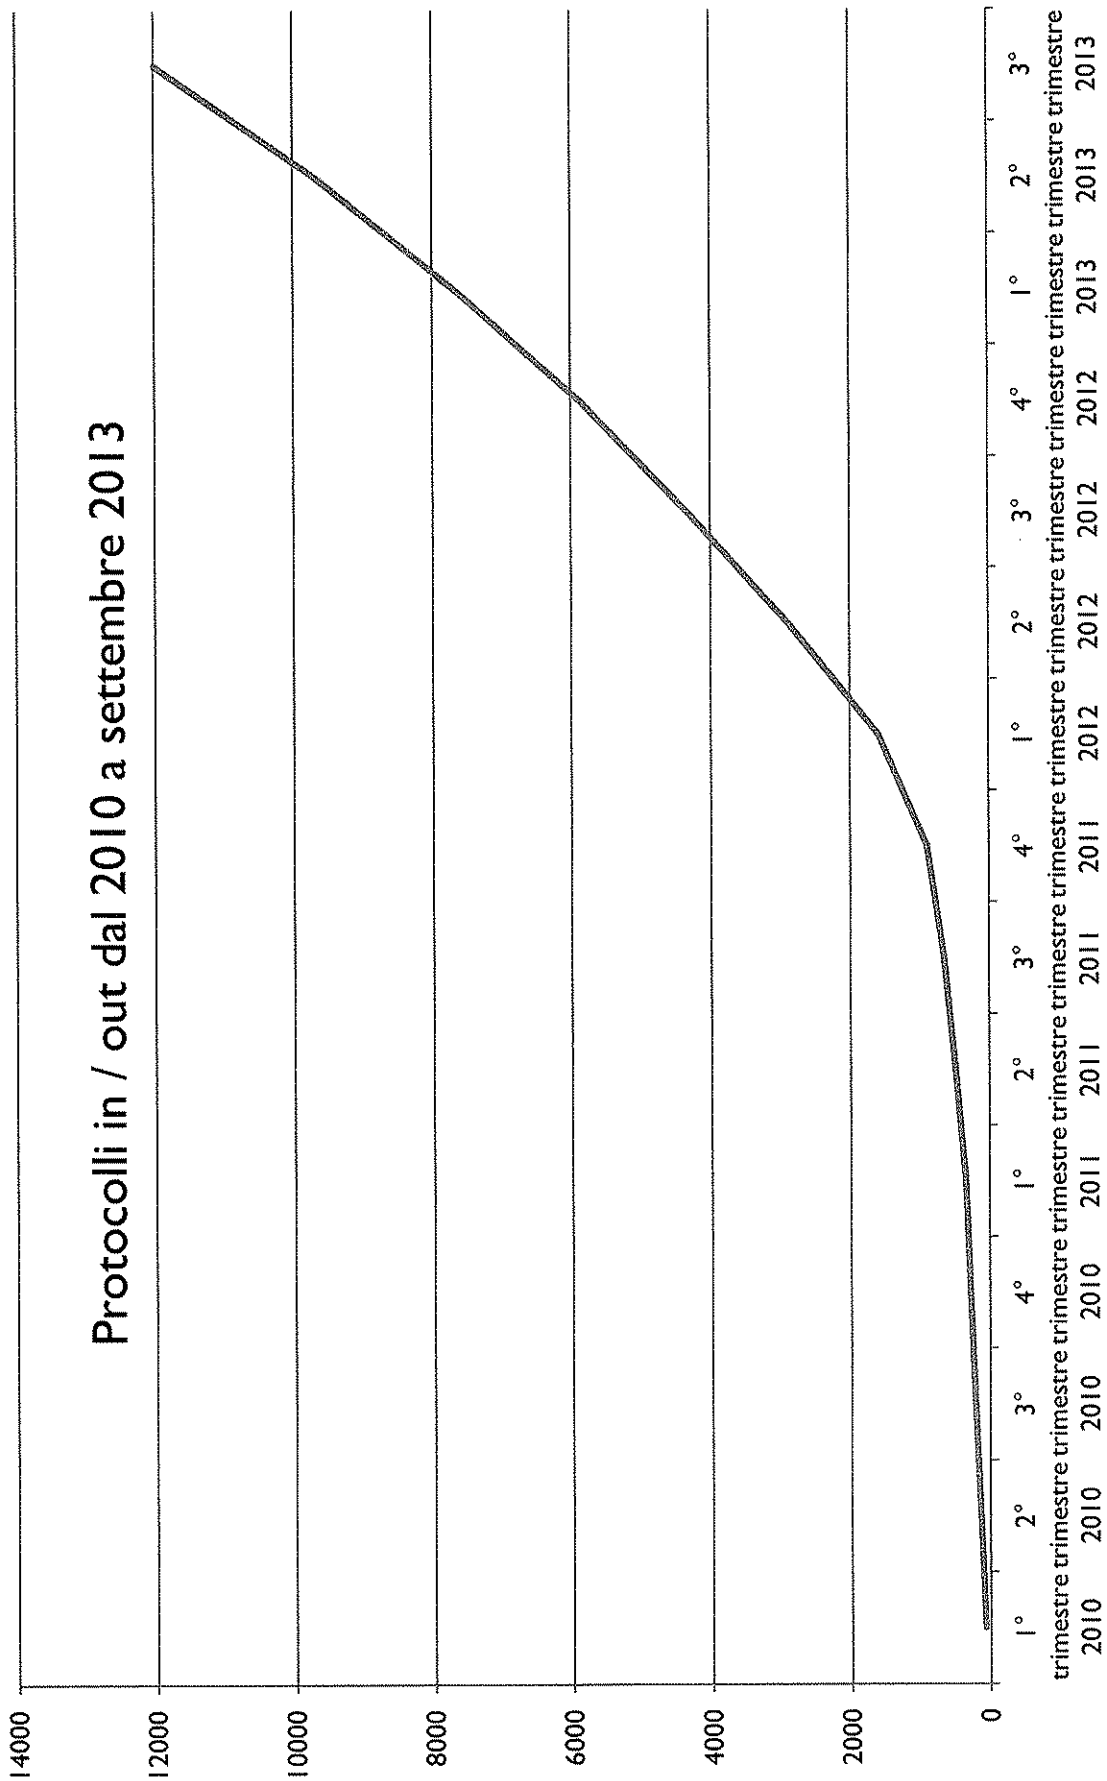


# I numeri del Piano carceri

## Telefonate

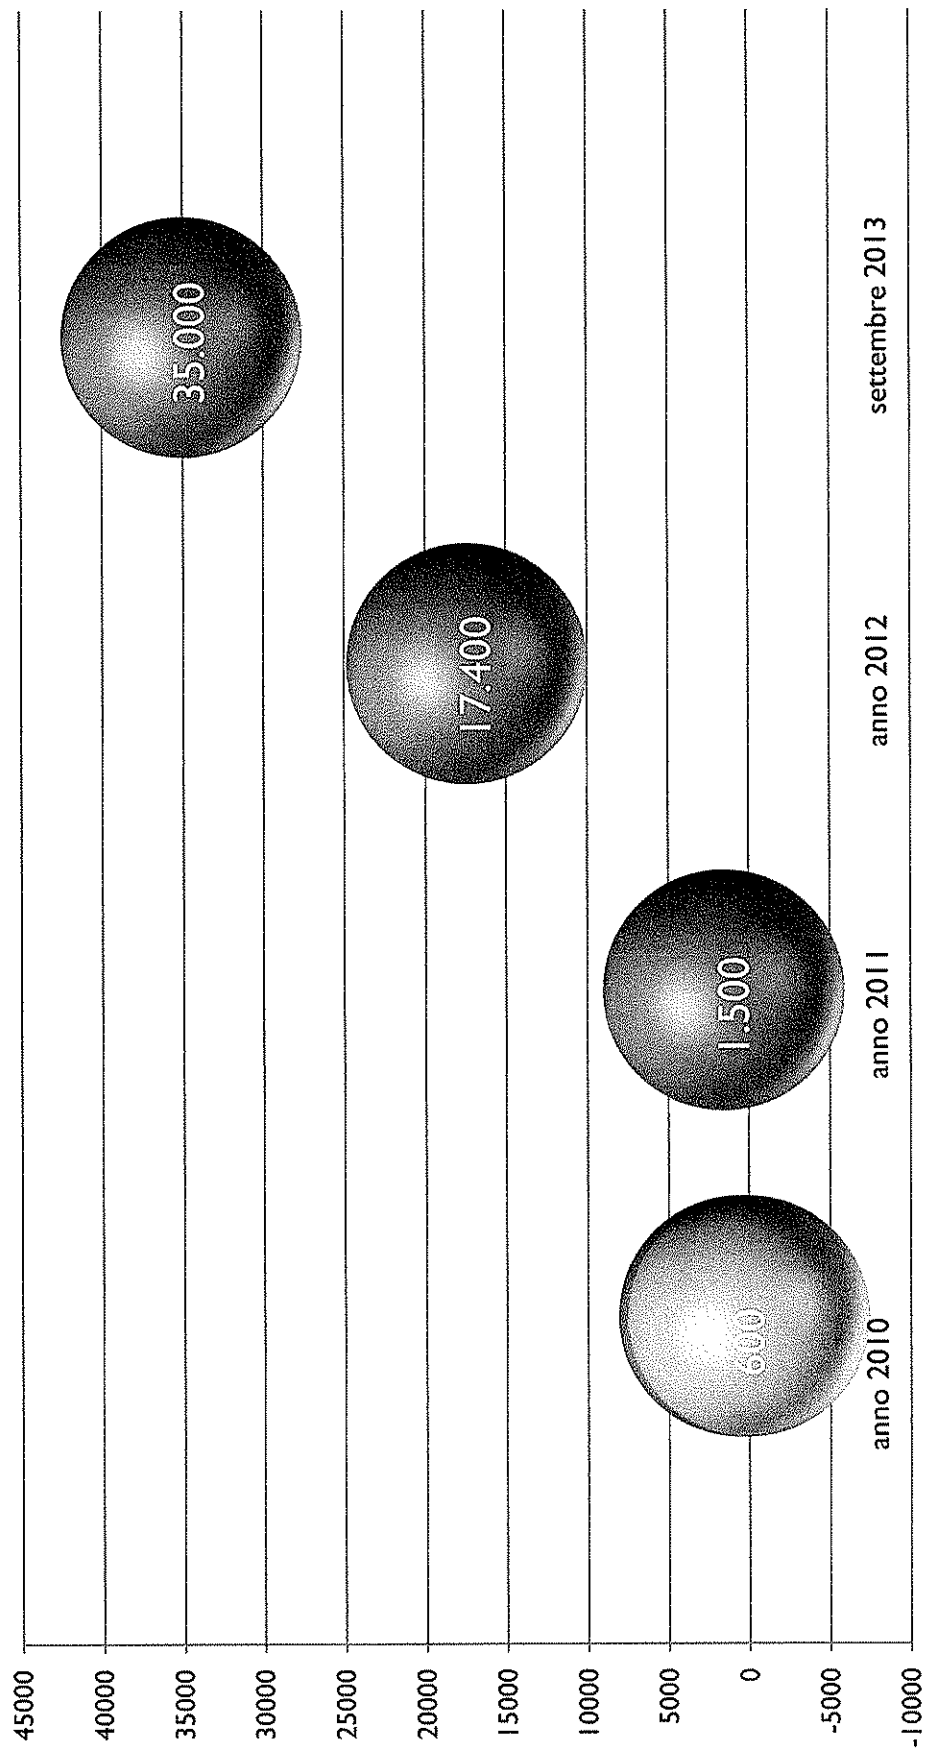


## I numeri del Piano carceri

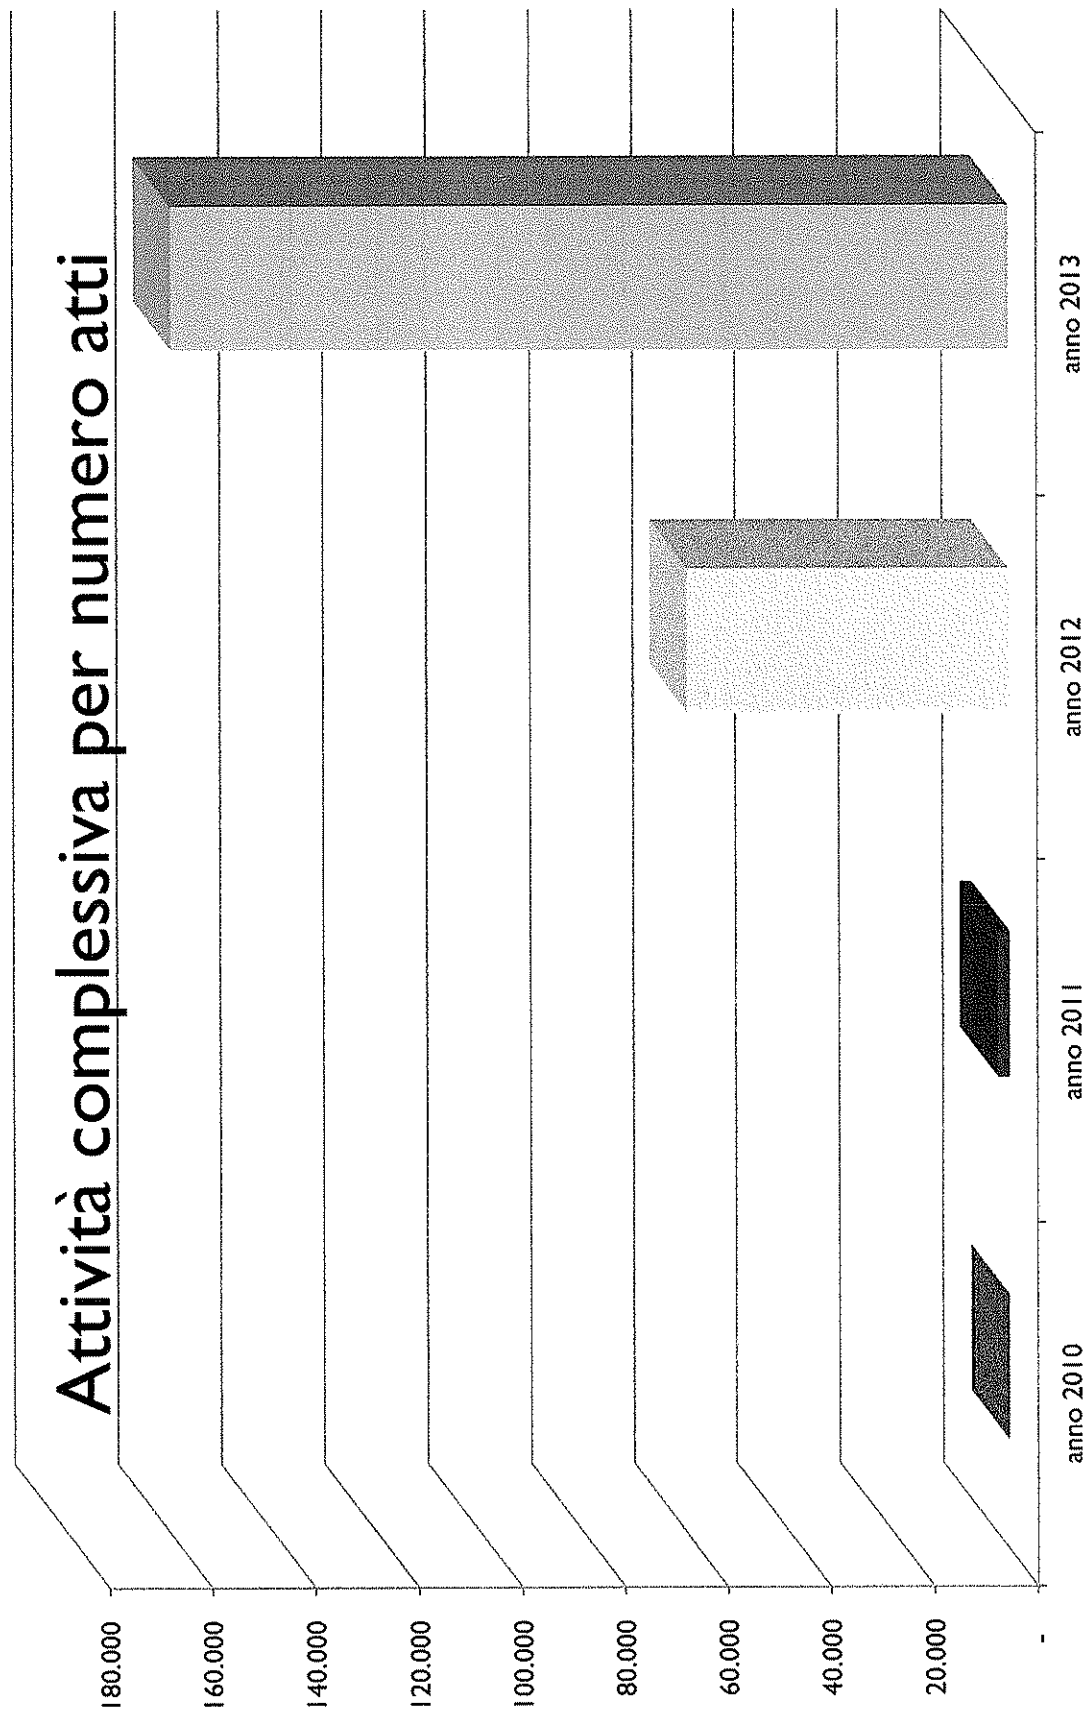


# I numeri del Piano carceri

## ordinativi di pagamento

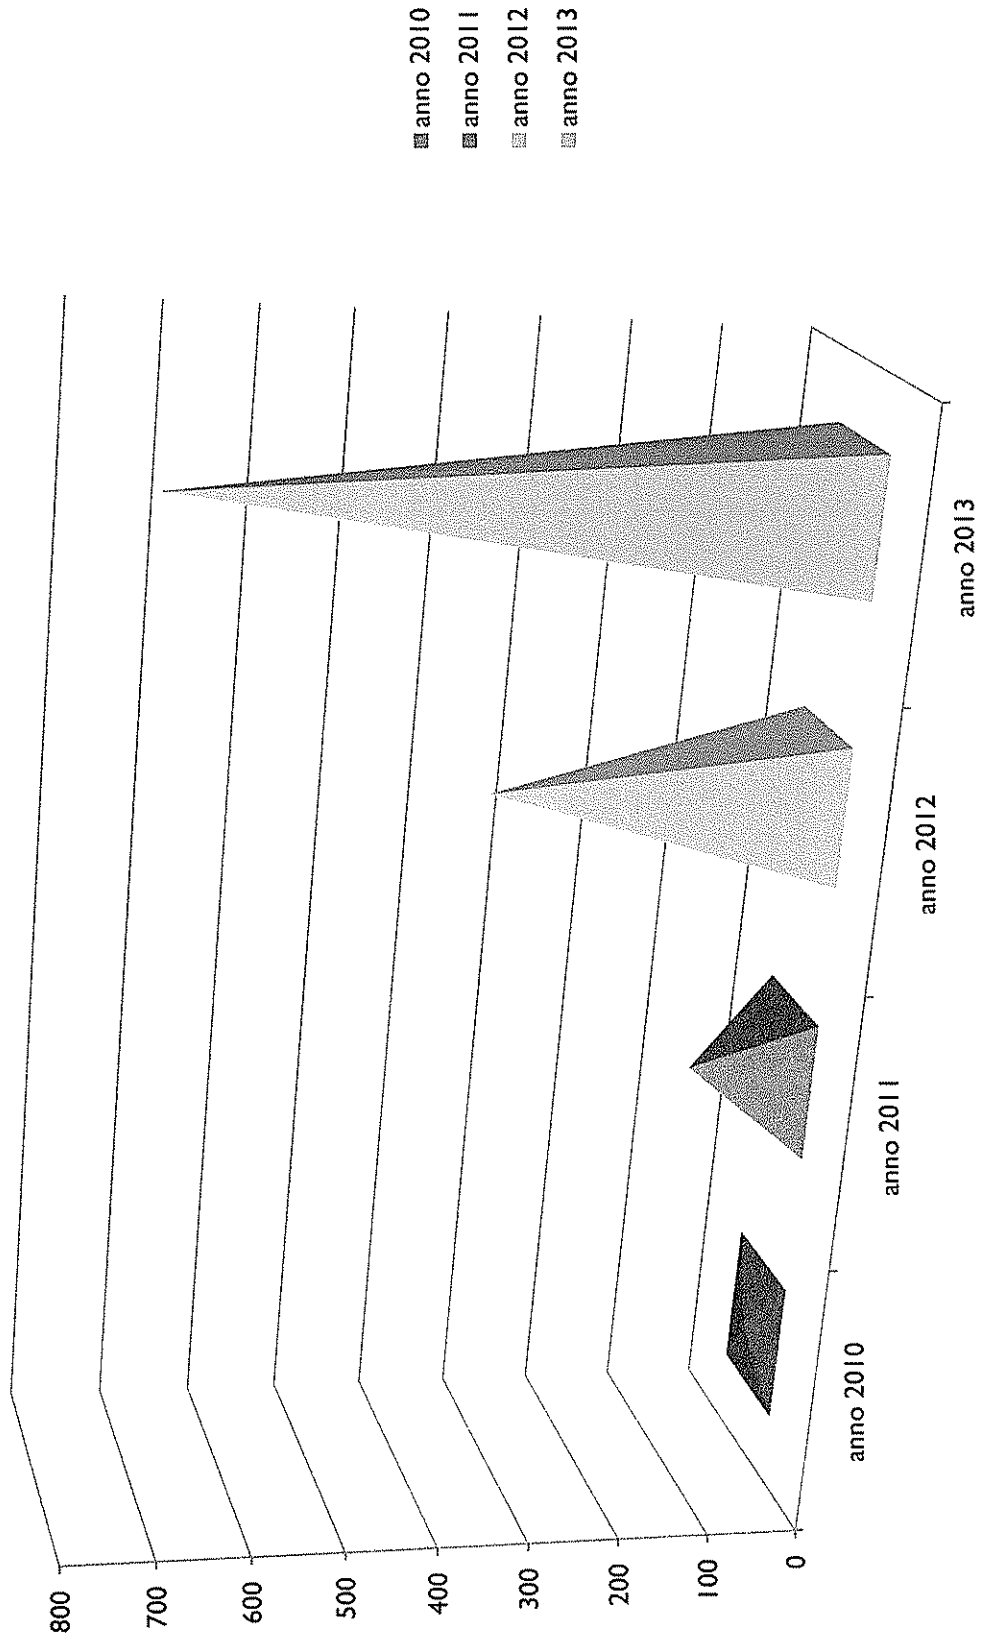

# I numeri del Piano carceri

## Attività per gare e contratti

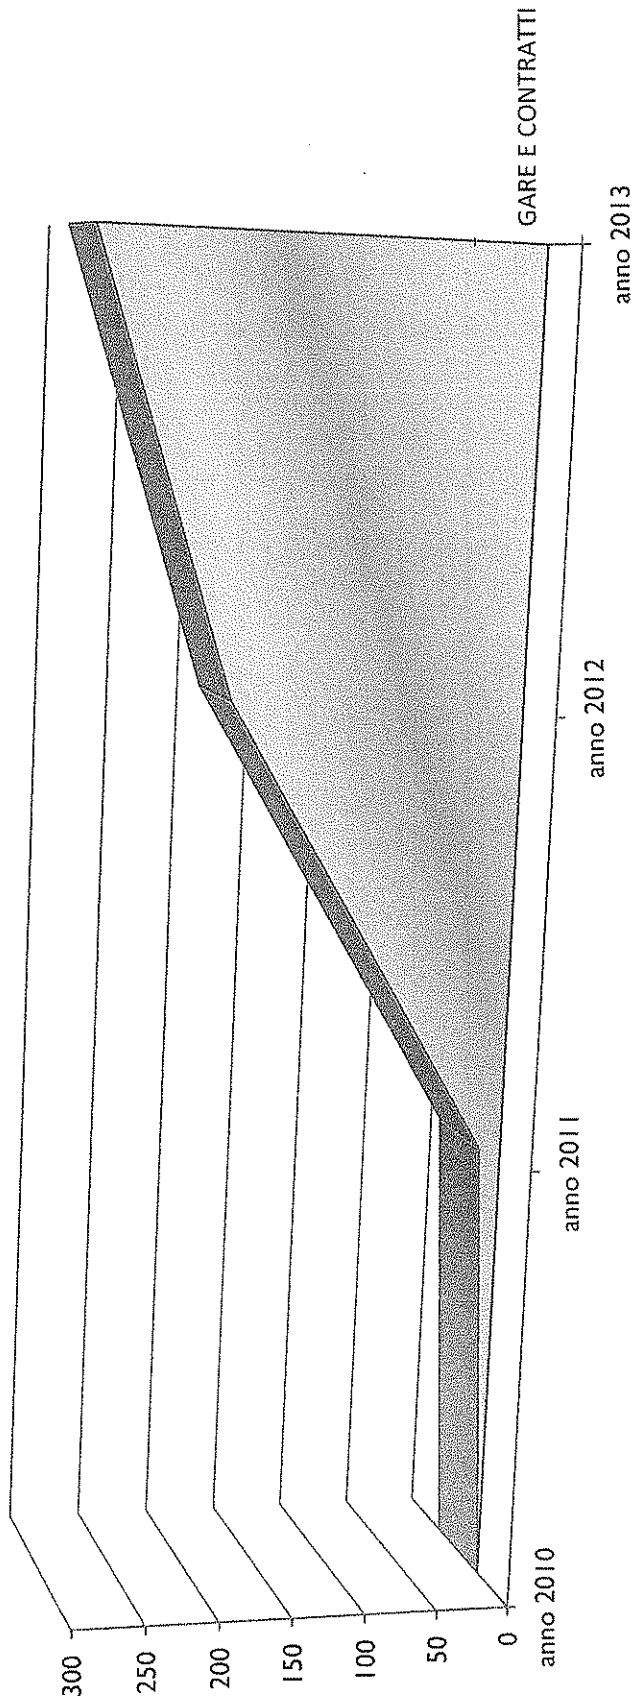

## LAVORI DI COMPLETAMENTO DI NUOVI ISTITUTI GIA' AVVIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

	N.	Città	Posti	Stato di attuazione
<b>LAVORI DI COMPLETAMENTO DI NUOVI ISTITUTI GIA' AVVIATI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE</b>	1	CAGLIARI - UTA	586	CONSEGNA al Ministero della Giustizia per fasi: padiglione detentivo ala est 29/7/2013, ala ovest e 4 piano ala nord 4/9/2013 Prevista consegna entro il 31.10.2013 dell'intero istituto eccetto il plesso del 41 bis
	2	SASSARI - BANCALI	465	CONSEGNATO al Ministero della Giustizia 31/5/2013 "Intitolazione alla memoria dell'agente di Polizia Penitenziaria Giovanni Bacchiddu" 9/7/2013
	3	ARGHILLA' - REGGIO CALABRIA	314	CONSEGNATO IL 12/2/2013 al Ministero della Giustizia ex art. 230 d.P.R. 207/2010 INTERVENTO REALIZZATO IN 90 GIORNI CON 10,7 MILIONI DI EURO ANZICHE' 730 GIORNI CON 21,5 MILIONI PREVISTI DAL PIANO  INAUGURATO IL 23/7/2013
		NUOVO PADIGLIONE, CASERMA AGENTI DA 50 POSTI  RIQUALIFICAZIONE STRADA DI ACCESSO-POZZO	300	IN FASE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA  AGGIUDICATO A IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. S.r.l. 10/9/2013 (fissato contratto il 22.10.2013) tempo esecuzione 140 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna)
			<b>1.665</b>	(*)

(\*) di cui 1.365 consegnati/prevista consegna nel 2013 e 300 nel 2015



## NUOVI PADIGLIONI IN AMPLIAMENTO DI ISTITUTI PENITENZIARI ESISTENTI

Regioni	Istituti	Padiglioni	Posti	Stato	Tempi di realizzazione in giorni
Lombardia	C.R. Milano-Opera	1	400	APPALTATO A C.G.F. COSTRUZIONI S.p.A. 19/4/2013	630
Veneto	C.C. Vicenza	1	200	APPALTATO A COSTRUZIONI ENRICO PASQUALUCCI S.r.l. 5/8/2013	430
Emilia Romagna	C.C. Ferrara	1	200	AGGIUDICATO AD IMPRESA COSTRUZIONI FRASA S.r.l. 22/01/2013	430
Emilia Romagna	C.C. Bologna	1	200	APPALTATO A T.I. BORCHI COSTRUZIONI S.r.l. - TEICE S.r.l. 19/9/2013	430
Emilia Romagna	C.C. Parma	1	200	APPALTATO A DEVI IMPIANTI S.r.l. 15/7/2013	430
Abruzzo	C.C. Sulmona	1	200	APPALTATO AD A.T.I. CIFOLELLI EDILIZIA S.r.l. - RIGEL IMPIANTI S.r.l. 30/7/2013	430
Lazio	C.C. Roma	1	400	AGGIUDICATO AD ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A 7/2/2013	630
Puglia	C.C. Trani	1	200	APPALTATO AD A.T.I. DE MARCO COSTRUZIONI S.r.l. - CAMPANILE GIOVANNI & C. S.n.c 1/8/2013	430
Puglia	C.C. Taranto	1	200	APPALTATO A DEVI IMPIANTI S.r.l. 15/7/2013	430
Puglia	C.C. Lecce	1	200	APPALTATO A DEVI IMPIANTI S.r.l. 15/7/2013	430
Sicilia	C.C. Trapani	1	200	APPALTATO A DEVI IMPIANTI S.r.l. 15/7/2013	430
Sicilia	C.C. Siracusa	1	200	APPALTATO AD APPALTITALIA S.r.l. 23/10/2012	400
Sicilia	C.C. Caltagirone	1	200	APPALTATO AD A.T.I. IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. FILIPPO COLOMBRITA & C. S.r.l. - COLNISA COSTRUZIONI S.r.l. 22/05/2013	430
<b>TOTALE</b>		<b>13</b>	<b>3.000</b>	<b>(*)</b>	

(\*) di cui 1.800 prevista ultimazione lavori nel 2014 e 1.200 nel 2015

## LAVORI DI COMPLETAMENTO DI NUOVI PADIGLIONI

	N.	Città	Nr.Posti	Stato
LAVORI DI COMPLETAMENTO DI PADIGLIONI GIÀ AVVIATI DAL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA	1	CREMONA	200	APPALTATO a A.T.I. SAPRO EDIL RESTAURI '85 S.r.l. (capogruppo) - NUOVA C.C.S. S.r.l.-SIMONESCHI S.r.l. 27/12/2012 LAVORI ULTIMATI IL 17/09/2013 -CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL 17/09/2013
	2	BIELLA	200	APPALTATO a FIGERA S.r.l. 14/9/2012 LAVORI ULTIMATI EMESSE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IL 26/04/2013 OPERE CONSEGNATE al Ministero della Giustizia
	3	MODENA	150	CONSEGNATO al Ministero della Giustizia
	4	TERNI	200	CONSEGNATO al Ministero della Giustizia
	5	VOGHERA	200	APPALTATO a IMPRESA DEVI IMPIANTI S.r.l. 26/11/2012 LAVORI ULTIMATI IL 31/07/2013 - IN FASE DI EMISSIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
	6	S.M. CAPUA VETERE	300	IN CONSEGNA DAL D.A.P.
	7	CATANZARO	300	CONSEGNATO al Ministero della Giustizia
	8	PALERMO PAGLIARELLI	300	APPALTATO a GESTECOS S.r.l. 25/9/2012 LAVORI ULTIMATI IL 10/07/2013 IN FASE DI COLLAUDO
	9	PAVIA	300	APPALTATO a I.C.G. UNIPERSONALE S.r.l. 9/10/2012 LAVORI COLLAUDATI IN DATA 10/07/2013 OPERE CONSEGNATE al Ministero della Giustizia il 30/7/2013
	10	SALUZZO	200	APPALTATO a GESTECOS S.r.l. 25/9/2012
	11	ARIANO IRPINO	200	APPALTATO a A.T.I. COSTRUZIONI ANGELICO EDILI STRADALI (capogruppo) - NUOVA C.C.S. S.r.l. 28/12/2012 LAVORI ULTIMATI IL 28/06/2013 IN FASE DI CONSEGNA al Ministero della Giustizia
	12	CARINOLA	200	APPALTATO A CIFOLELLI EDILIZIA S.r.l. 20/12/2012 LAVORI ULTIMATI IL 10/07/2013 IN FASE DI COLLAUDO
	13	FROSINONE	200	APPALTATO a EDILIMPIANTI S.r.l. 19/12/2012
	14	PIACENZA	200	APPALTATO a I.BE.CO. COSTRUZIONI S.p.A. 26/11/2012 LAVORI ULTIMATI IL 03/05/2013 IN FASE DI COLLAUDO
	15	NUORO	97	PROCEDURA IN CORSO PER ACQUISTO CUCINA
	16	LIVORNO	100	CONSEGNATO al Ministero della Giustizia
			<b>3.347</b>	(*)

(\*) di cui 750 consegnati nel 2012 e 2.597 consegnati /prevista consegna nel 2013

# LAVORI DI RECUPERO DI ISTITUTI PENITENZIARI ESISTENTI

	N.	Città	Posti	Stato	Tempi di realizzazione in giorni
LAVORI DI RECUPERO DI ISTITUTI ESISTENTI	1	ANCONA MONTACUTO	0	APPALTATO a GESTECOS S.r.l. 21/5/2013	180
	2	LIVORNO PADIGLIONE C	176	In corso valutazione offerte da parte della Commissione giudicatrice ex art. 84 d. lgs 163/2006	570
		LIVORNO PADIGLIONE D	176	In corso valutazione offerte da parte della Commissione giudicatrice ex art. 84 d. lgs 163/2006	480
	3	GORGONA	0	AGGIUDICATO a GENERALAPPALTI S.r.l. 17/9/2013	140
	4	AUGUSTA	0	APPALTATO a URANIA COSTRUZIONI S.r.l 04/10/2013	365
	5	ENNA	0	AGGIUDICATO a IMA EDILE S.r.l. 11/6/2013	300
	6	MILANO SAN VITTORE II SEZIONE	250	GARA DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE	
		MILANO SAN VITTORE IV SEZIONE	250	GARA DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE	
	7	NAPOLI POGGIOREALE	100	AGGIUDICATO a A.T.I. EDILERICA S.r.l. - IGIT S.p.A 4/6/2013	365
	8	PALERMO UCCIARDONE V SEZIONE	100	APPALTATO a APPALTITALIA S.r.l. 27/5/2013	730
		PALERMO UCCIARDONE VI SEZIONE	100	APPALTATO a SICEF S.r.l. 12/09/2013	300
	9	AREZZO	60	APPALTATO a CONSORZIO KRESTOTES 13/6/2013	180
			1.212 (*)		

(\*) di cui 260 prevista ultimazione lavori nel 2014 e 952 nel 2015

# NUOVI ISTITUTI PENITENZIARI

Regioni	Città	Stato di attuazione	Nr. Istituti	Nr. Posti	Tempi di realizzazione (in giorni)
Sicilia	Catania	In fase di valutazione offerte anomale Commissione ex art.84 d.lgs.163/2006	1	450	840
Friuli Venezia Giulia	San Vito al Tagliamento	Inserito in PIANO CARCERI il 18/7/2013 conferenza di servizi 22/07/2013 effettuati sondaggi geologici, geognostici, strutturali e sismici nella dismessa Caserma Dall'Armi - sottoscritta 16.10.2013 Intesa ex art. 17 ter legge 26/2010	1	300	
Campania	Nola	Inserito in PIANO CARCERI il 18/7/2013 In corso individuazione area e predisposizione intesa ex 17 ter legge 26/2010	1	900	
Toscana	Pianosa	Inserito in PIANO CARCERI il 18/7/2013	1	450	
Varie	Recupero da Beni Demaniali	Inserito in PIANO CARCERI il 18/7/2013	Vari	1000	
<b>TOTALE</b>				<b>3.100</b>	<b>(*)</b>

(\*) prevista ultimazione lavori entro maggio 2016
